


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	T3	T4	2021
1			MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE PTO CARREÑO Y CUMARIBO VICHADA – ORINOQUIA	\$ 28.461.800.985,00	787,15 días	mié 7/10/20			
2			Direccion del Proyecto	\$ 230.000.000,00	95,34 días	mié 7/10/20			
3			Acta de Constitucion	\$ 100.000.000,00	30 días	mié 7/10/20			
4			Elaboracion y ajuste acta de constitucion del proyec	\$ 45.000.000,00	30 días	mié 7/10/20			
5			Aprobacion Acta de constitucion del proyecto	\$ 55.000.000,00	30 días	mié 7/10/20			
6			Plan de Direccion	\$ 130.000.000,00	65,34 días	mié 18/11/2			
7			Definiri el equipo profesional tecnico y administrati	\$ 30.000.000,00	15,17 días	mié 18/11/20			
8			Aprobacion Plan de Direccion Realizado	\$ 65.000.000,00	24,67 días	mié 9/12/20			
9			Realizacion y aprobacion Presupuesto y Cronogram	\$ 35.000.000,00	25,5 días	mar 12/01/2			
10			Estudios y Diseños	\$ 280.000.000,00	183,32 días	mié 17/02/2			
11			Estudios Preliminares aprobados	\$ 130.000.000,00	91,66 días	mié 17/02/2			
12			Realizacion y aprobacion Planos Topograficos	\$ 70.000.000,00	45,83 días	mié 17/02/2			
13			Realizacion y aprobacion Estudios geotecnics	\$ 60.000.000,00	45,83 días	jue 22/04/21			
14			Diseños aprobados	\$ 150.000.000,00	91,66 días	vie 25/06/21			
15			Aprobacion de Memorias de calculo	\$ 75.000.000,00	45,83 días	vie 25/06/21			
16			Aprobacion de planos estructural pavimento	\$ 75.000.000,00	45,83 días	vie 27/08/21			
17			Construccion de Obras	\$ 27.861.800.98...	446,83 días	lun 1/11/21			
18			Obras civiles construidas	\$ 27.356.800.98...	385,83 días	lun 1/11/21			
19			Cosntruccion Km de Base Estabilizada Suelo - Cemento	\$ 26.774.180.375,00	170,83 días	lun 1/11/21			
20			Cosntruccion de Alcantarilla en Concreto Ref	\$ 316.959.787,00	95 días	mar 28/06/2			
21			Construccion de Muro de Contencion "Gaviones"	\$ 265.660.823,00	120 días	mar 8/11/22			




Proyecto: Mejoramiento Vial Fecha: dom 19/12/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	T3	T4	2021
22			Trabajo socio Ambiental	\$ 120.000.000,00	149,17 días	mar 8/11/22			T
23			Realizar Socializacion del proyecto	\$ 60.000.000,00	60,83 días	mar 8/11/22			
24			Realizar encuesta de Satisfaccion	\$ 60.000.000,00	29,17 días	mar 25/04/20			
25			Inventario y Caracterizacion	\$ 385.000.000,00	61 días	mar 25/04/20			
26			Lavamiento de Obras civiles construidas	\$ 285.000.000,00	30,5 días	mar 25/04/20			
27			Realizacion y aprobacion planos Record de obra	\$ 100.000.000,00	30,5 días	mar 6/06/23			
28			Entrega y Liquidacion	\$ 90.000.000,00	92,16 días	mar 6/06/23			
29			Numero de obras entregadas	\$ 70.000.000,00	58,66 días	mar 6/06/23			
30			Realizacion y entrega de Inventario Vial	\$ 35.000.000,00	29,33 días	mar 6/06/23			
31			Realizacion y aprobacion de informe Final	\$ 35.000.000,00	29,33 días	mar 18/07/20			
32			Liquidacion de Contrato	\$ 20.000.000,00	61,66 días	mié 19/07/20			
33			Suscripcion de acta de Recibo Final de obra	\$ 10.000.000,00	29,33 días	mié 19/07/23			
34			Firma Acta de Liquidacion	\$ 10.000.000,00	32,33 días	mar 29/08/20			
35			Fin del Proyecto	\$ 0,00	0 días	vie 13/10/23			

Proyecto: Mejoramiento Vial
Fecha: dom 19/12/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

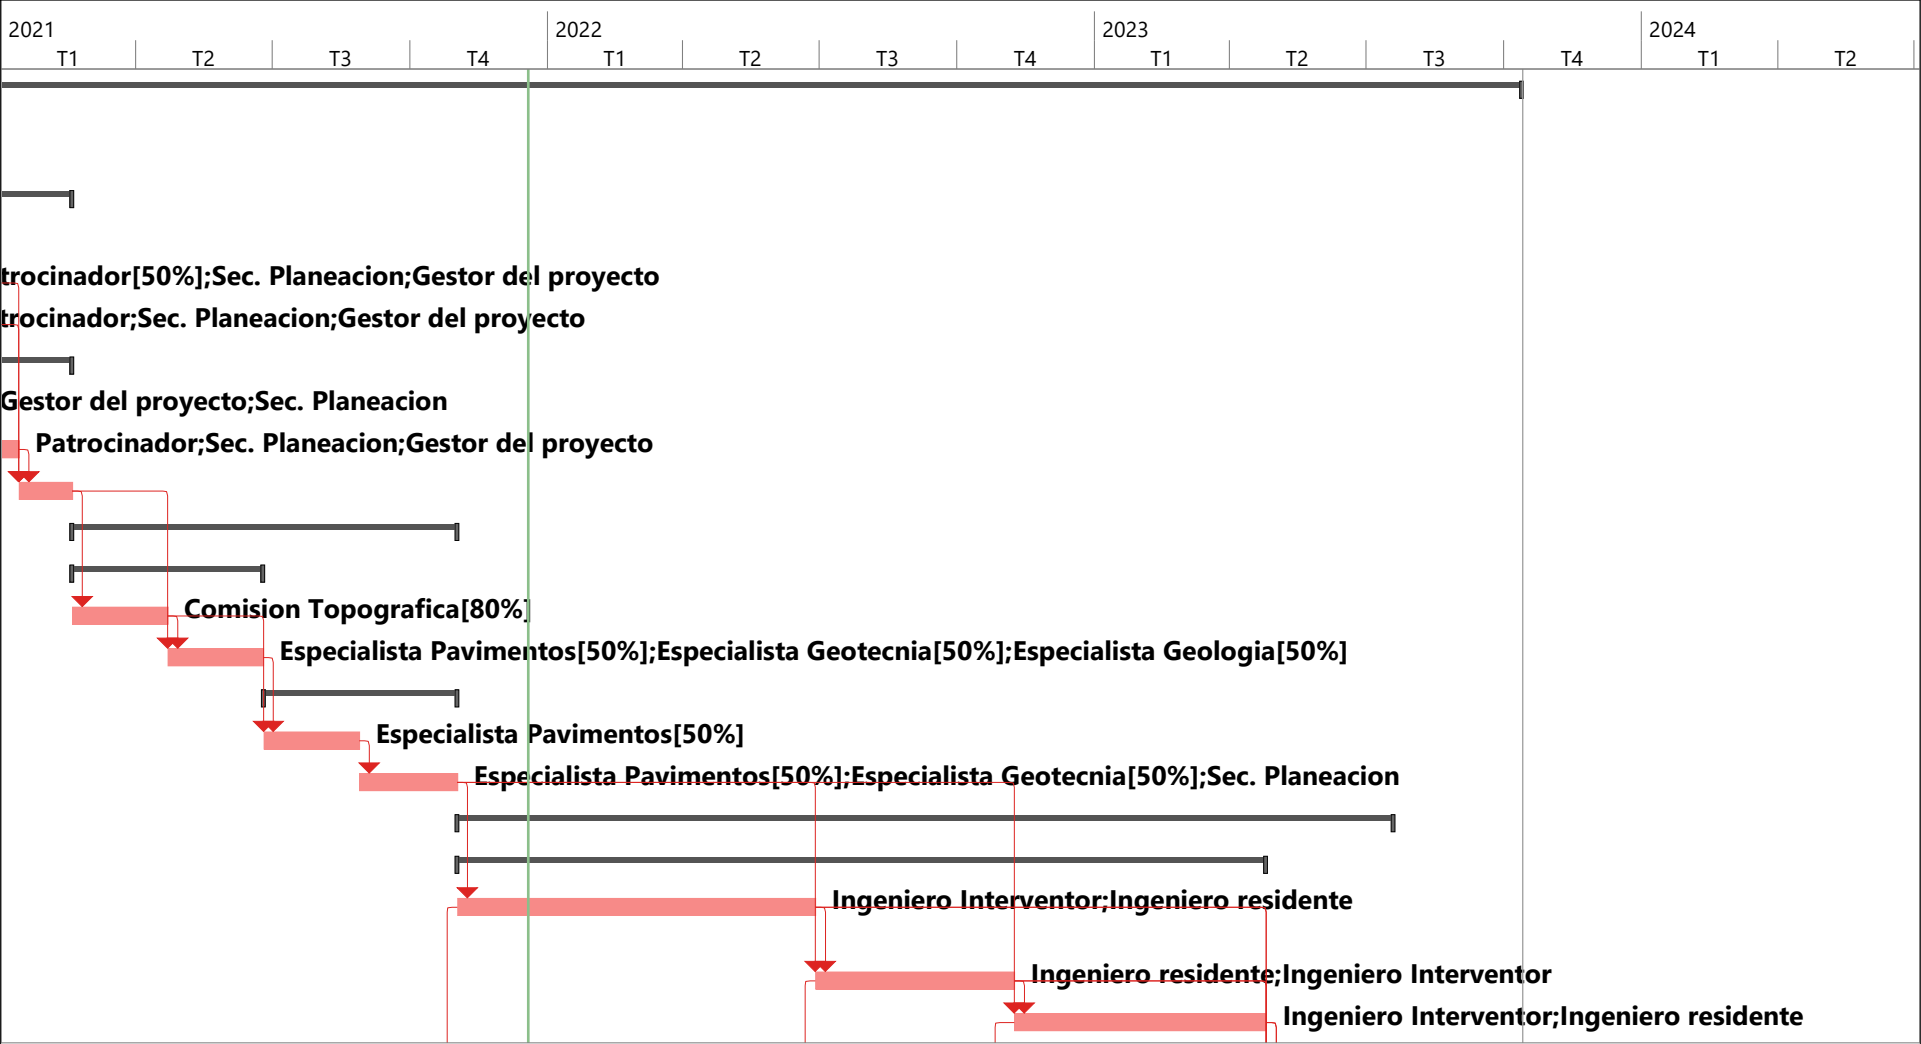

Proyecto: Mejoramiento Vial Fecha: dom 19/12/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

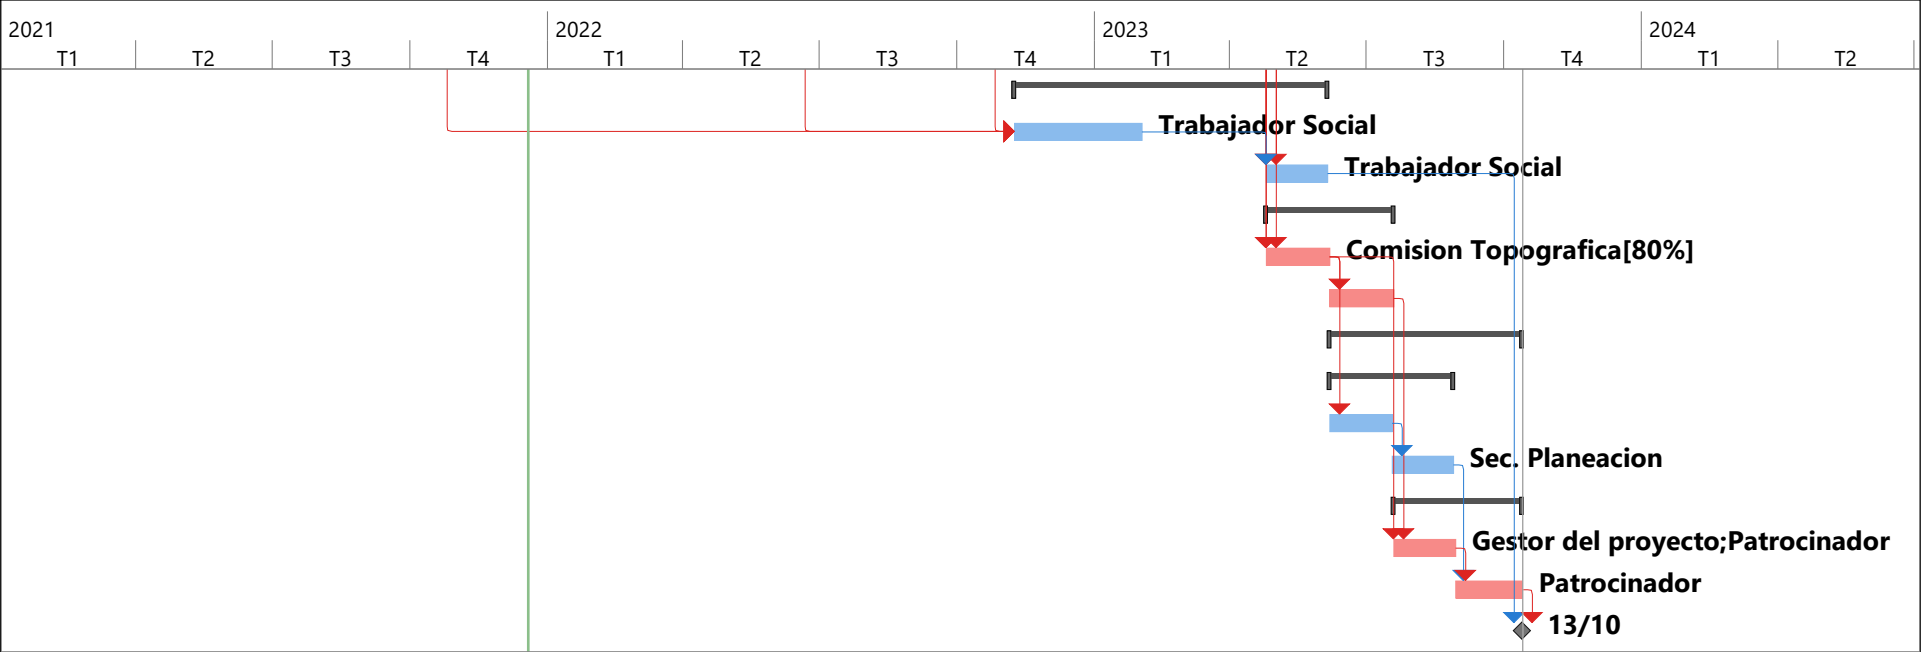

Proyecto: Mejoramiento Vial Fecha: dom 19/12/21	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
