




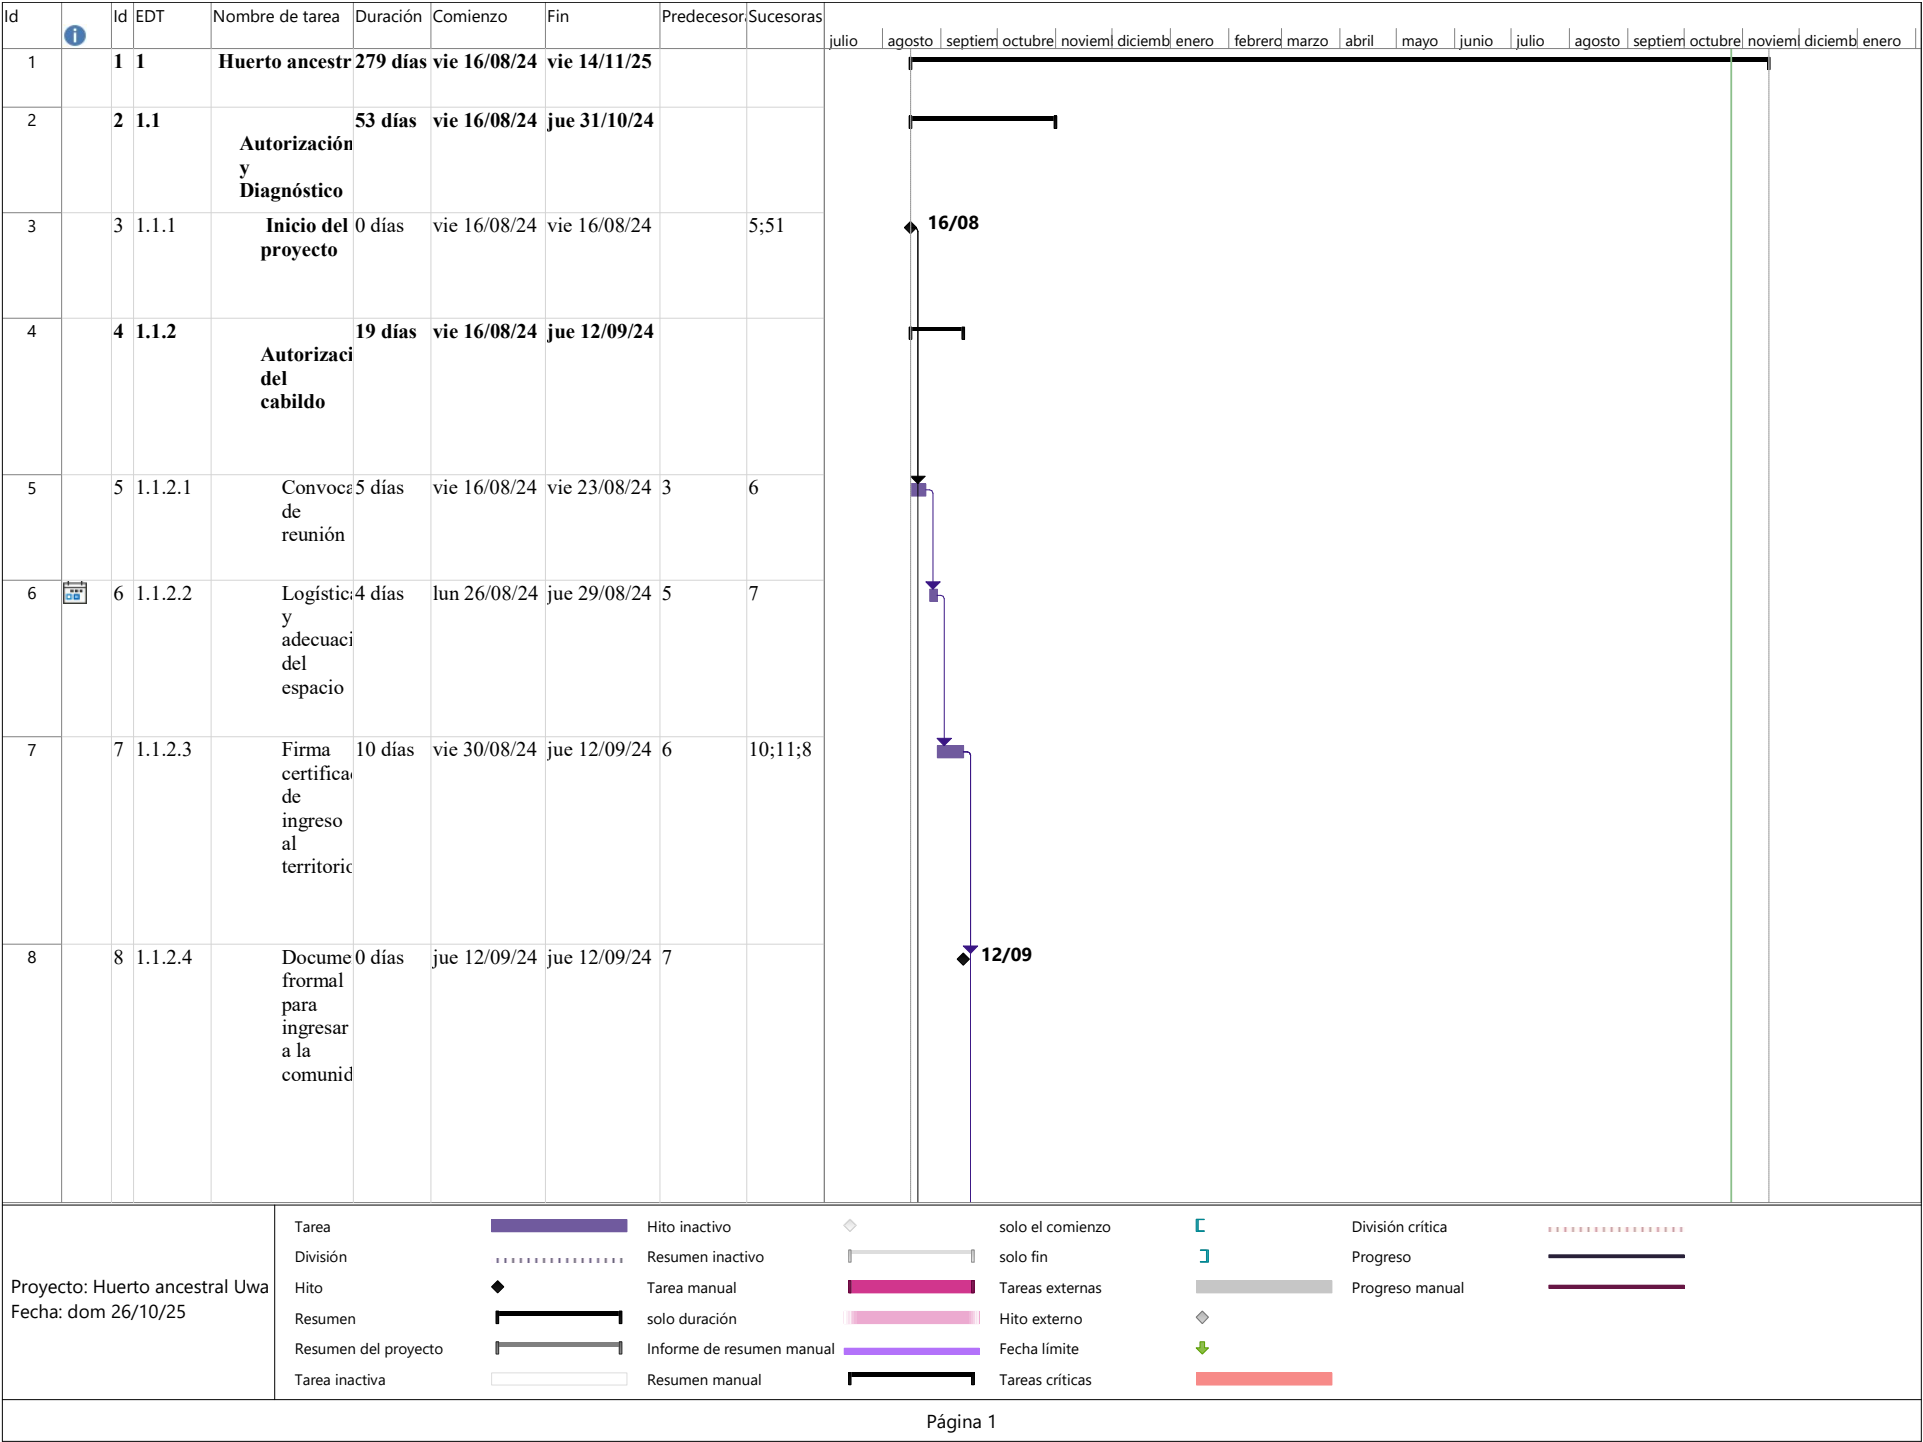

Página 1

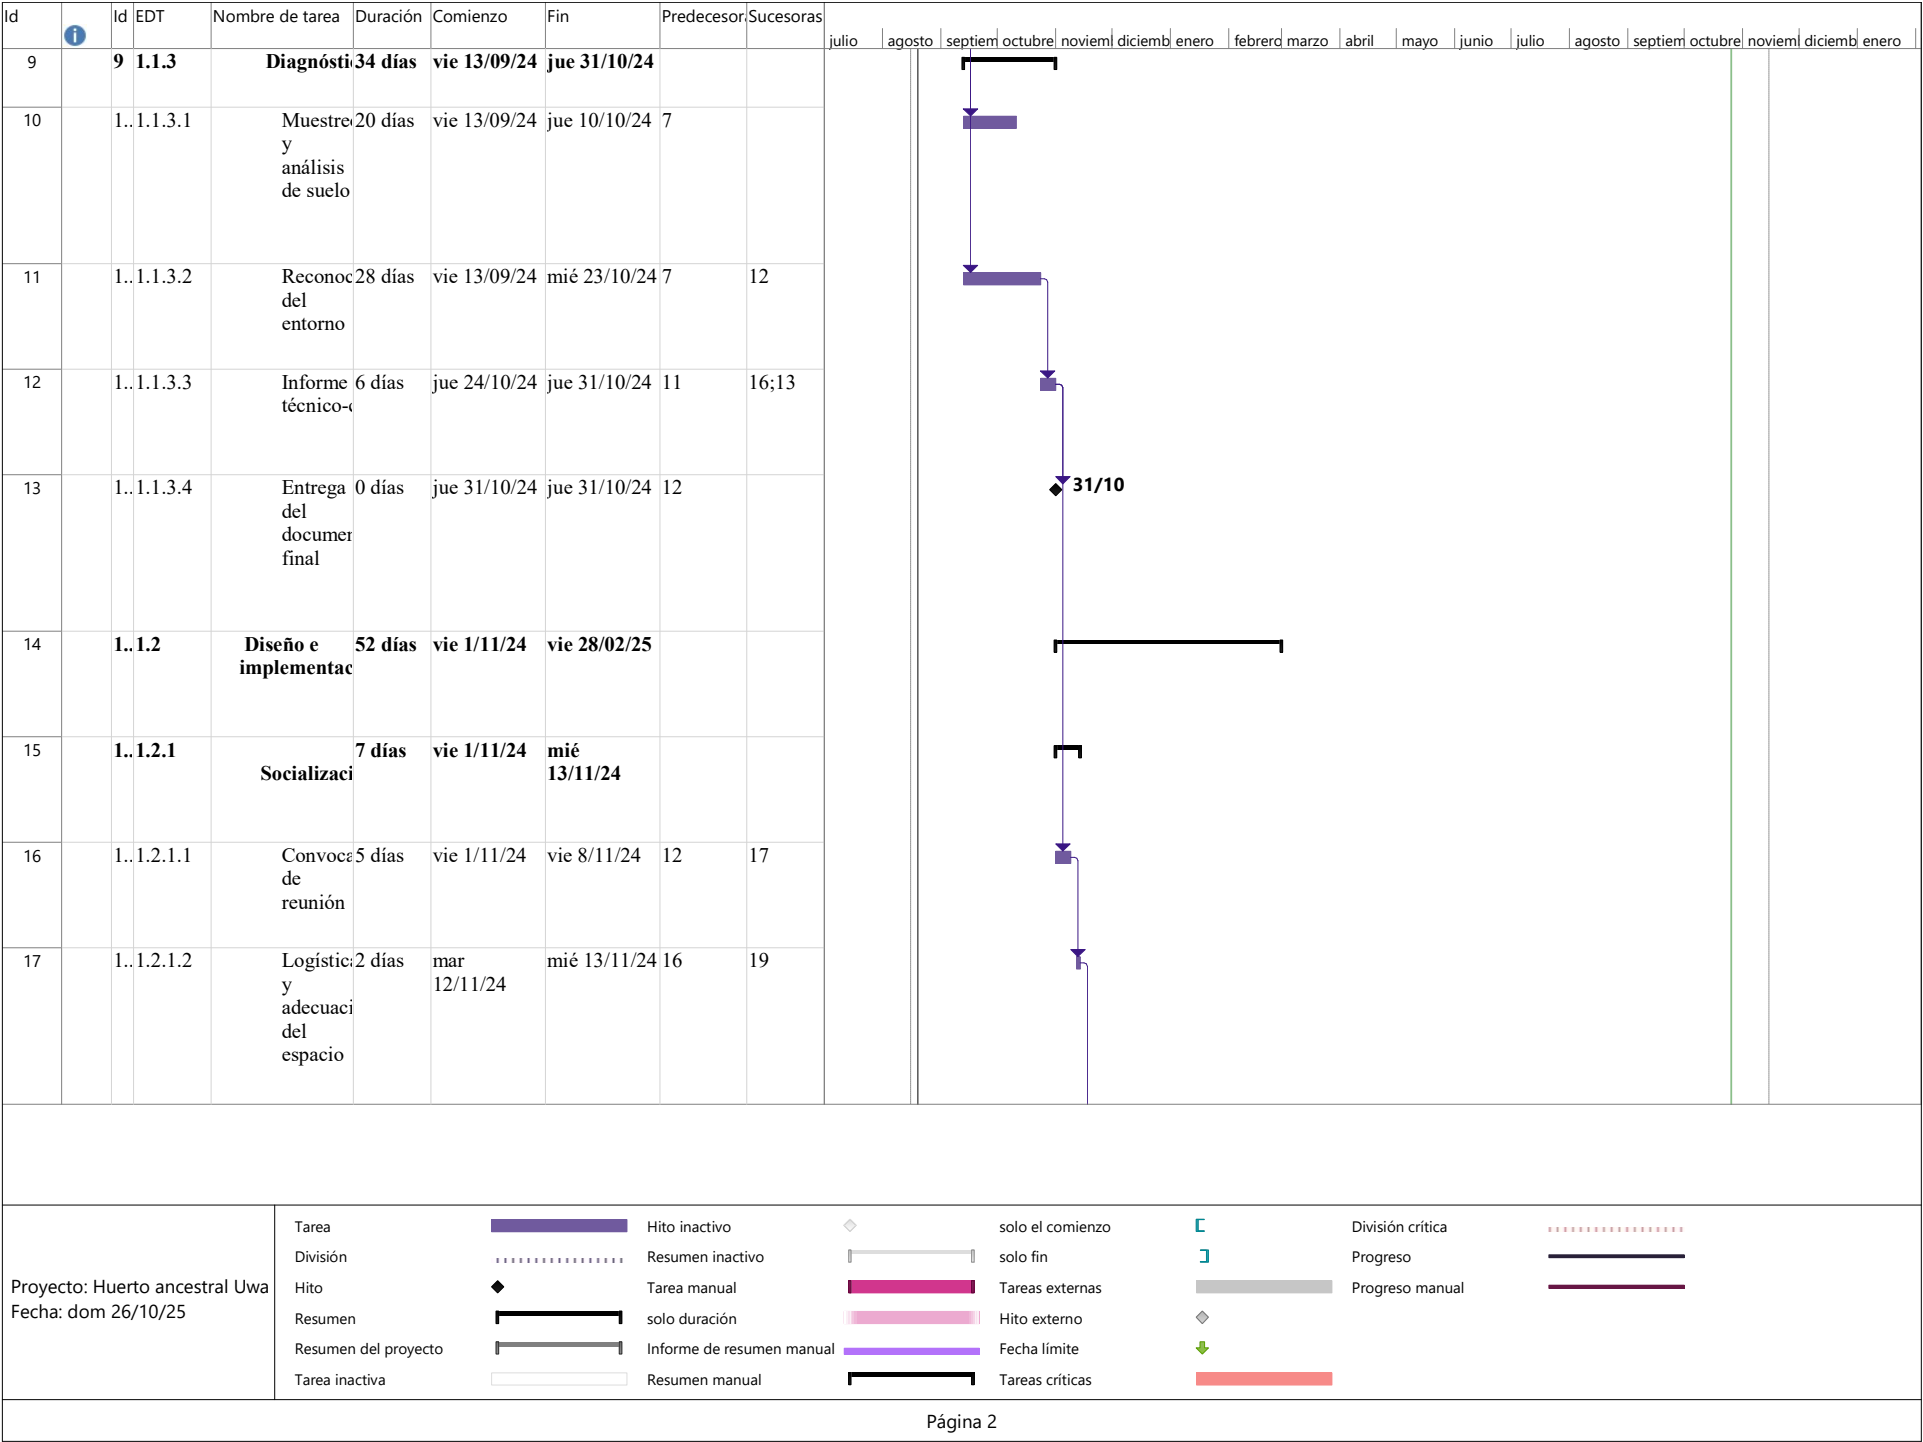

Página 2

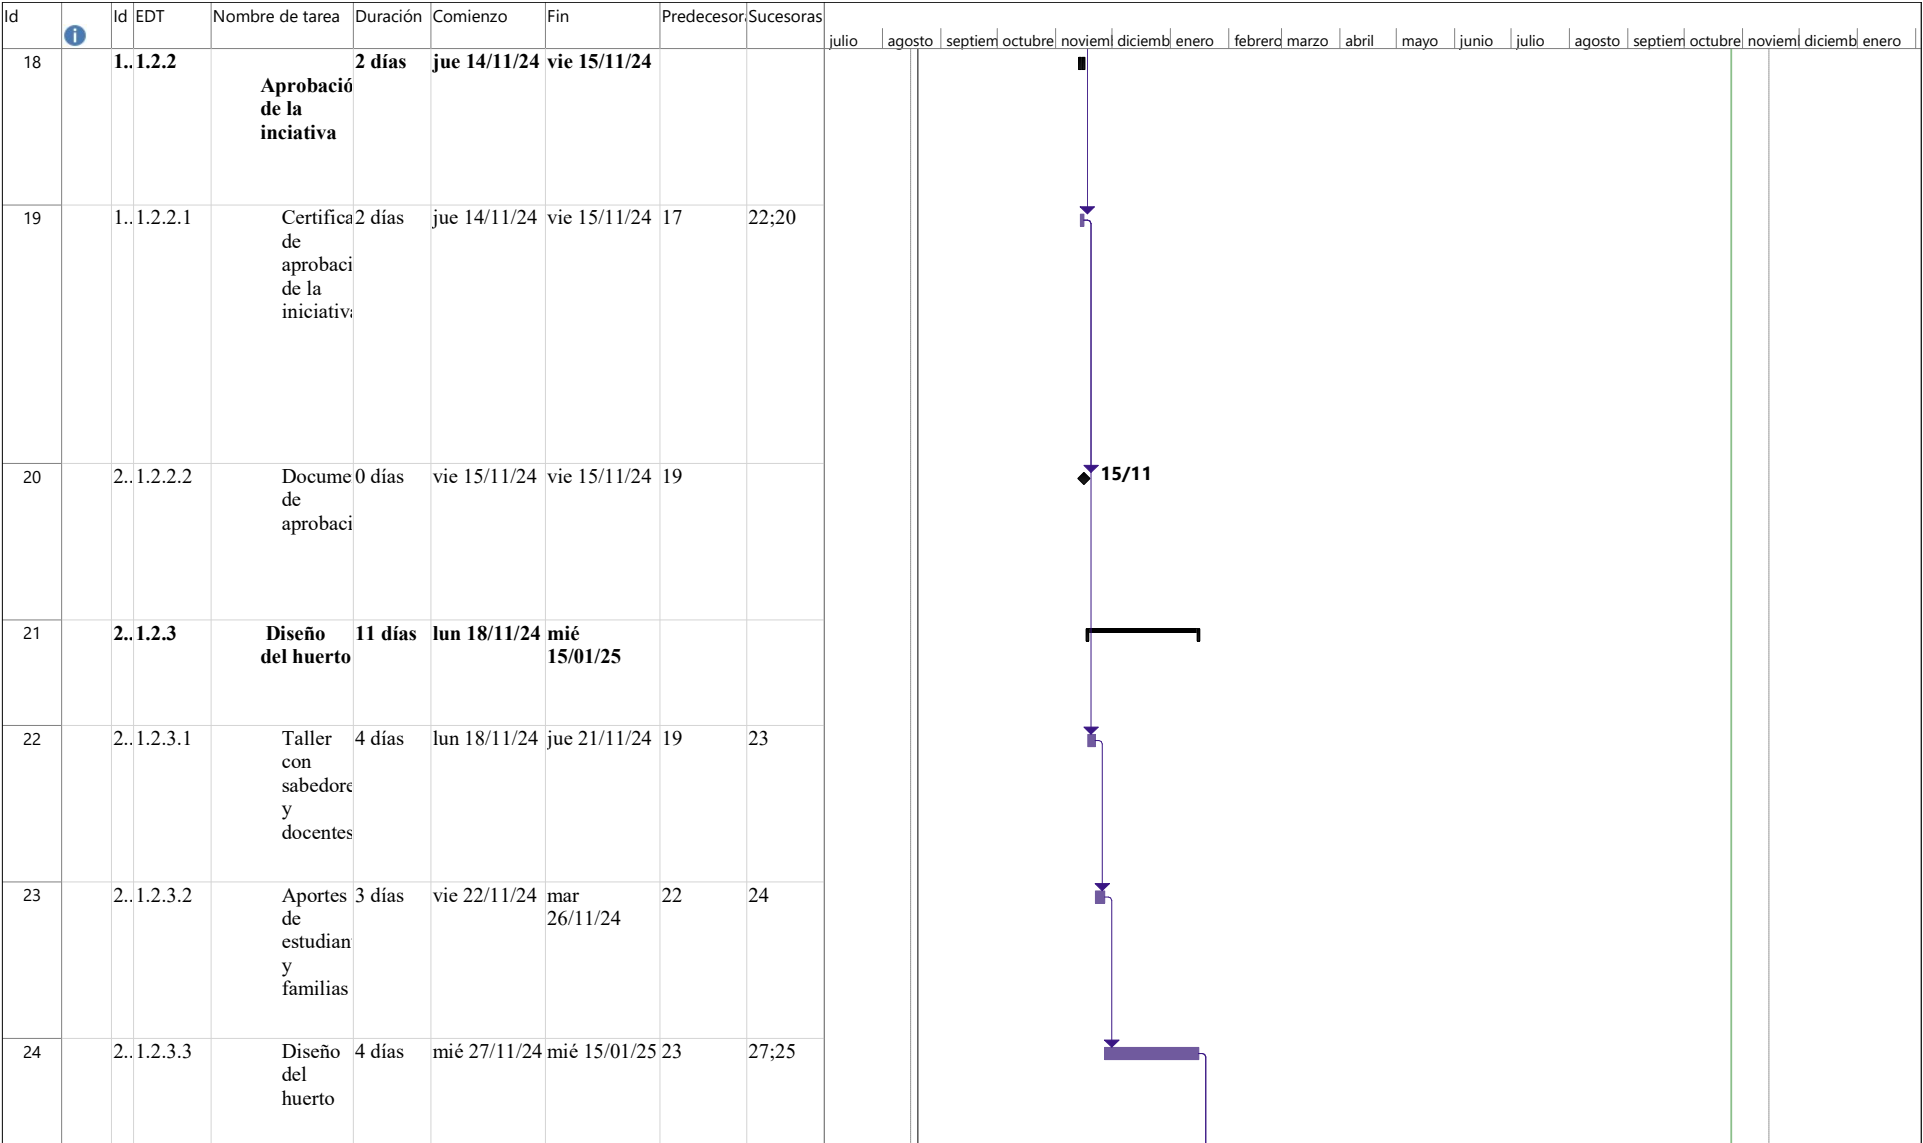

Proyecto: Huerto ancestral Uwa
Fecha: dom 26/10/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

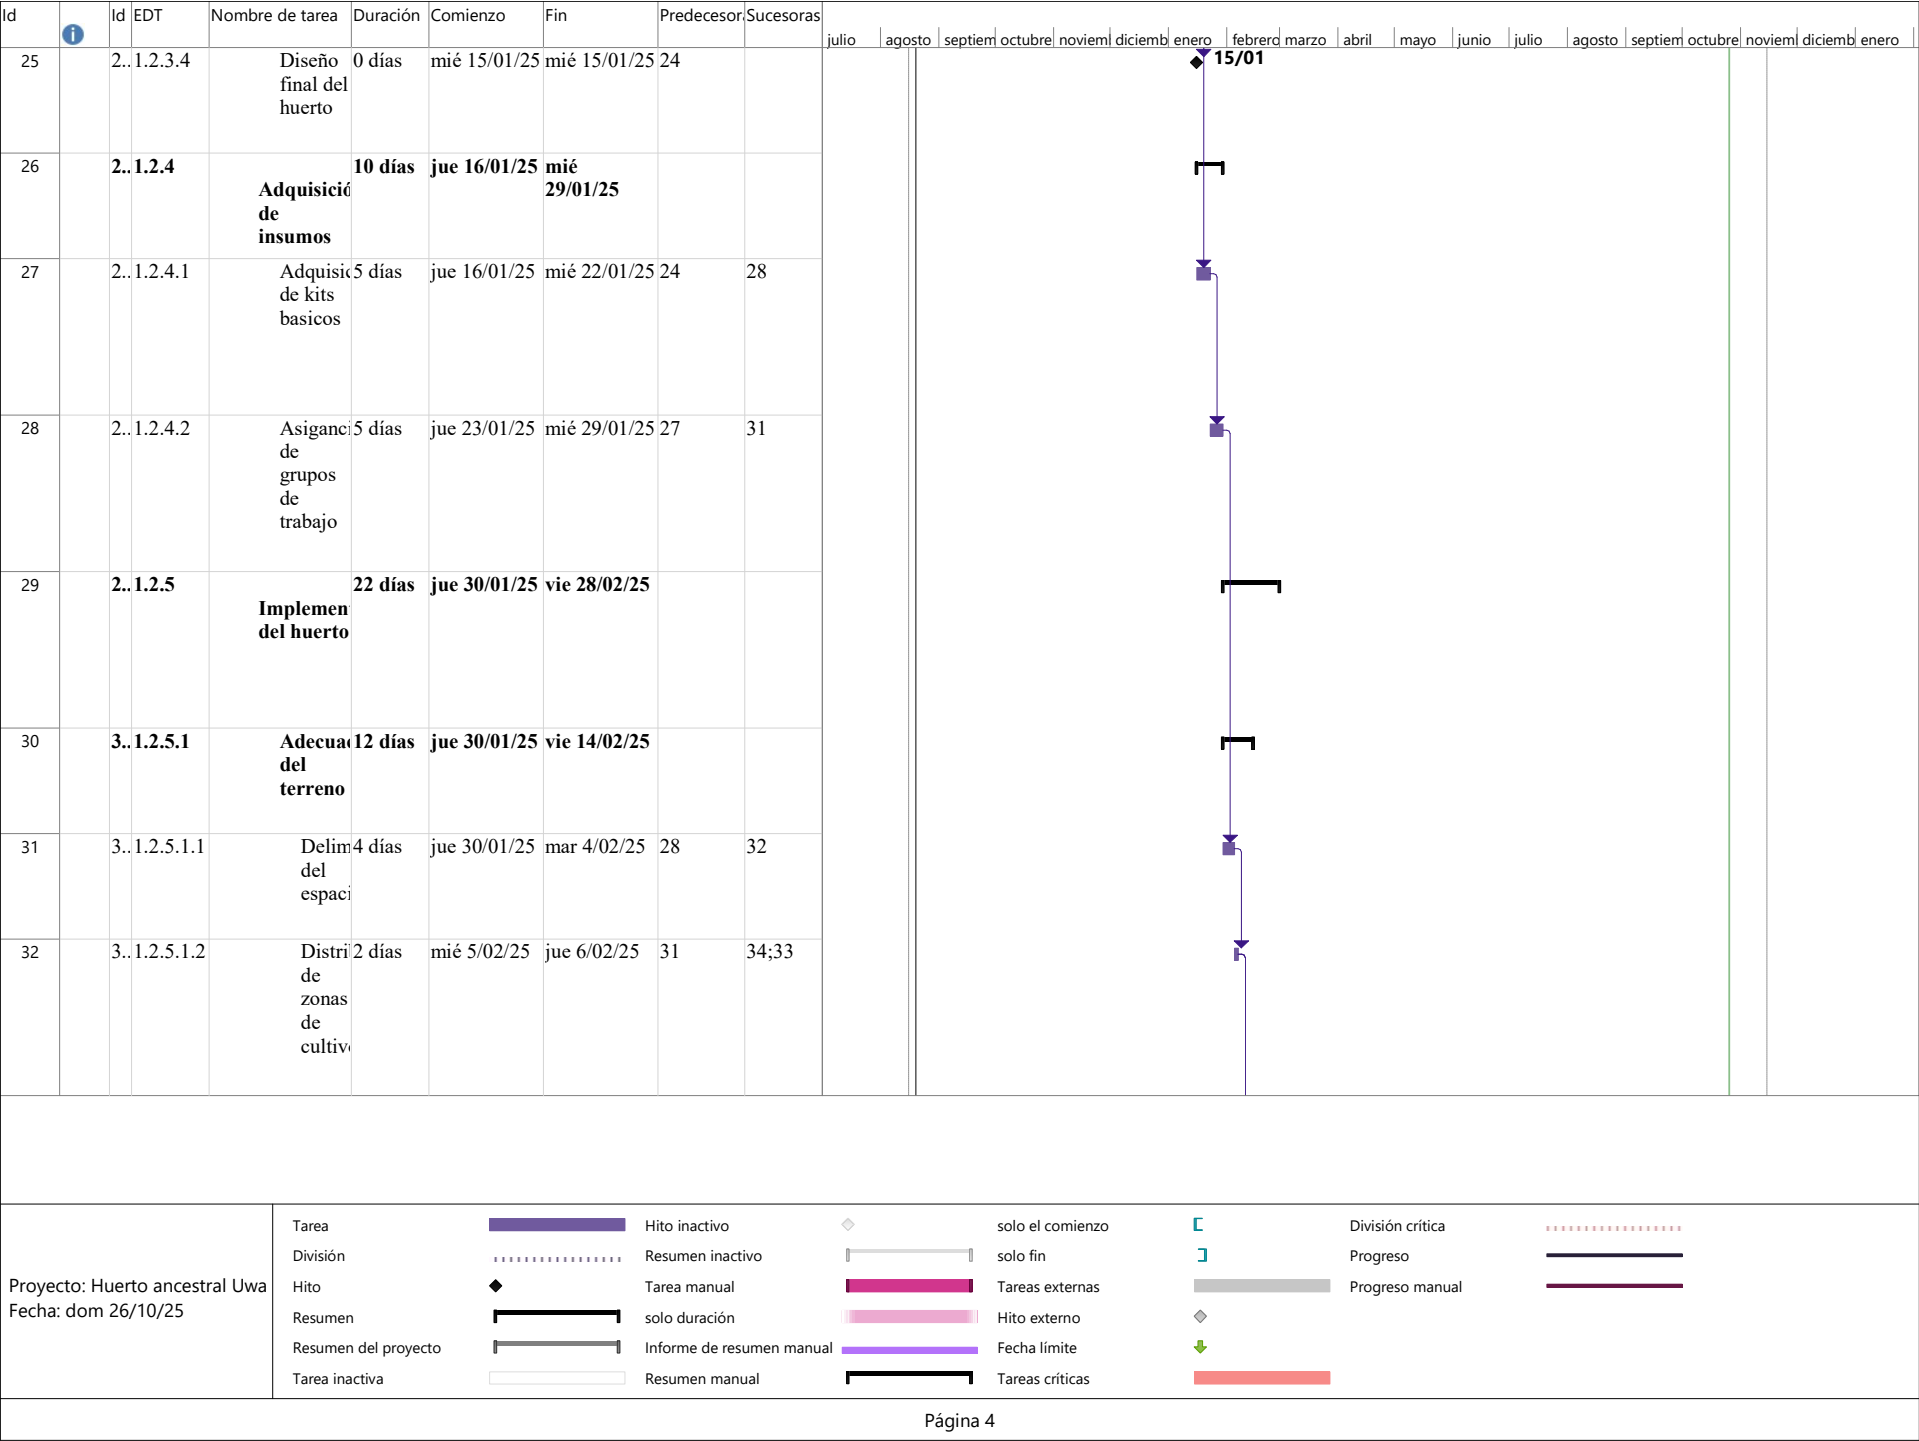

Id		Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Sucesoras	julio	agosto	septiem	octubre	noviem	diciemb	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiem	octubre	noviem	diciemb	enero
33		3..1.2.5.1.3		Inicio de labore en terren	0 días	jue 6/02/25	jue 6/02/25	32									 6/02											
34		3..1.2.5.1.4		Deshi y limpie	6 días	vie 7/02/25	vie 14/02/25	32	36																			
35		3..1.2.5.2		Siembra Colectiv	10 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25																					
36		3..1.2.5.2.1		Siemb de semill nativa	7 días	lun 17/02/25	mar 25/02/25	34	37;55																			
37		3..1.2.5.2.2		Aplic de abono organ	3 días	mié 26/02/25	vie 28/02/25	36	41																			
38		3..1.3		Articulación educativa	60 días	lun 3/03/25	jue 29/05/25																					
39		3..1.3.1		Actividad pegagogica	60 días	lun 3/03/25	jue 29/05/25																					

Proyecto: Huerto ancestral Uwa

Fecha: dom 26/10/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

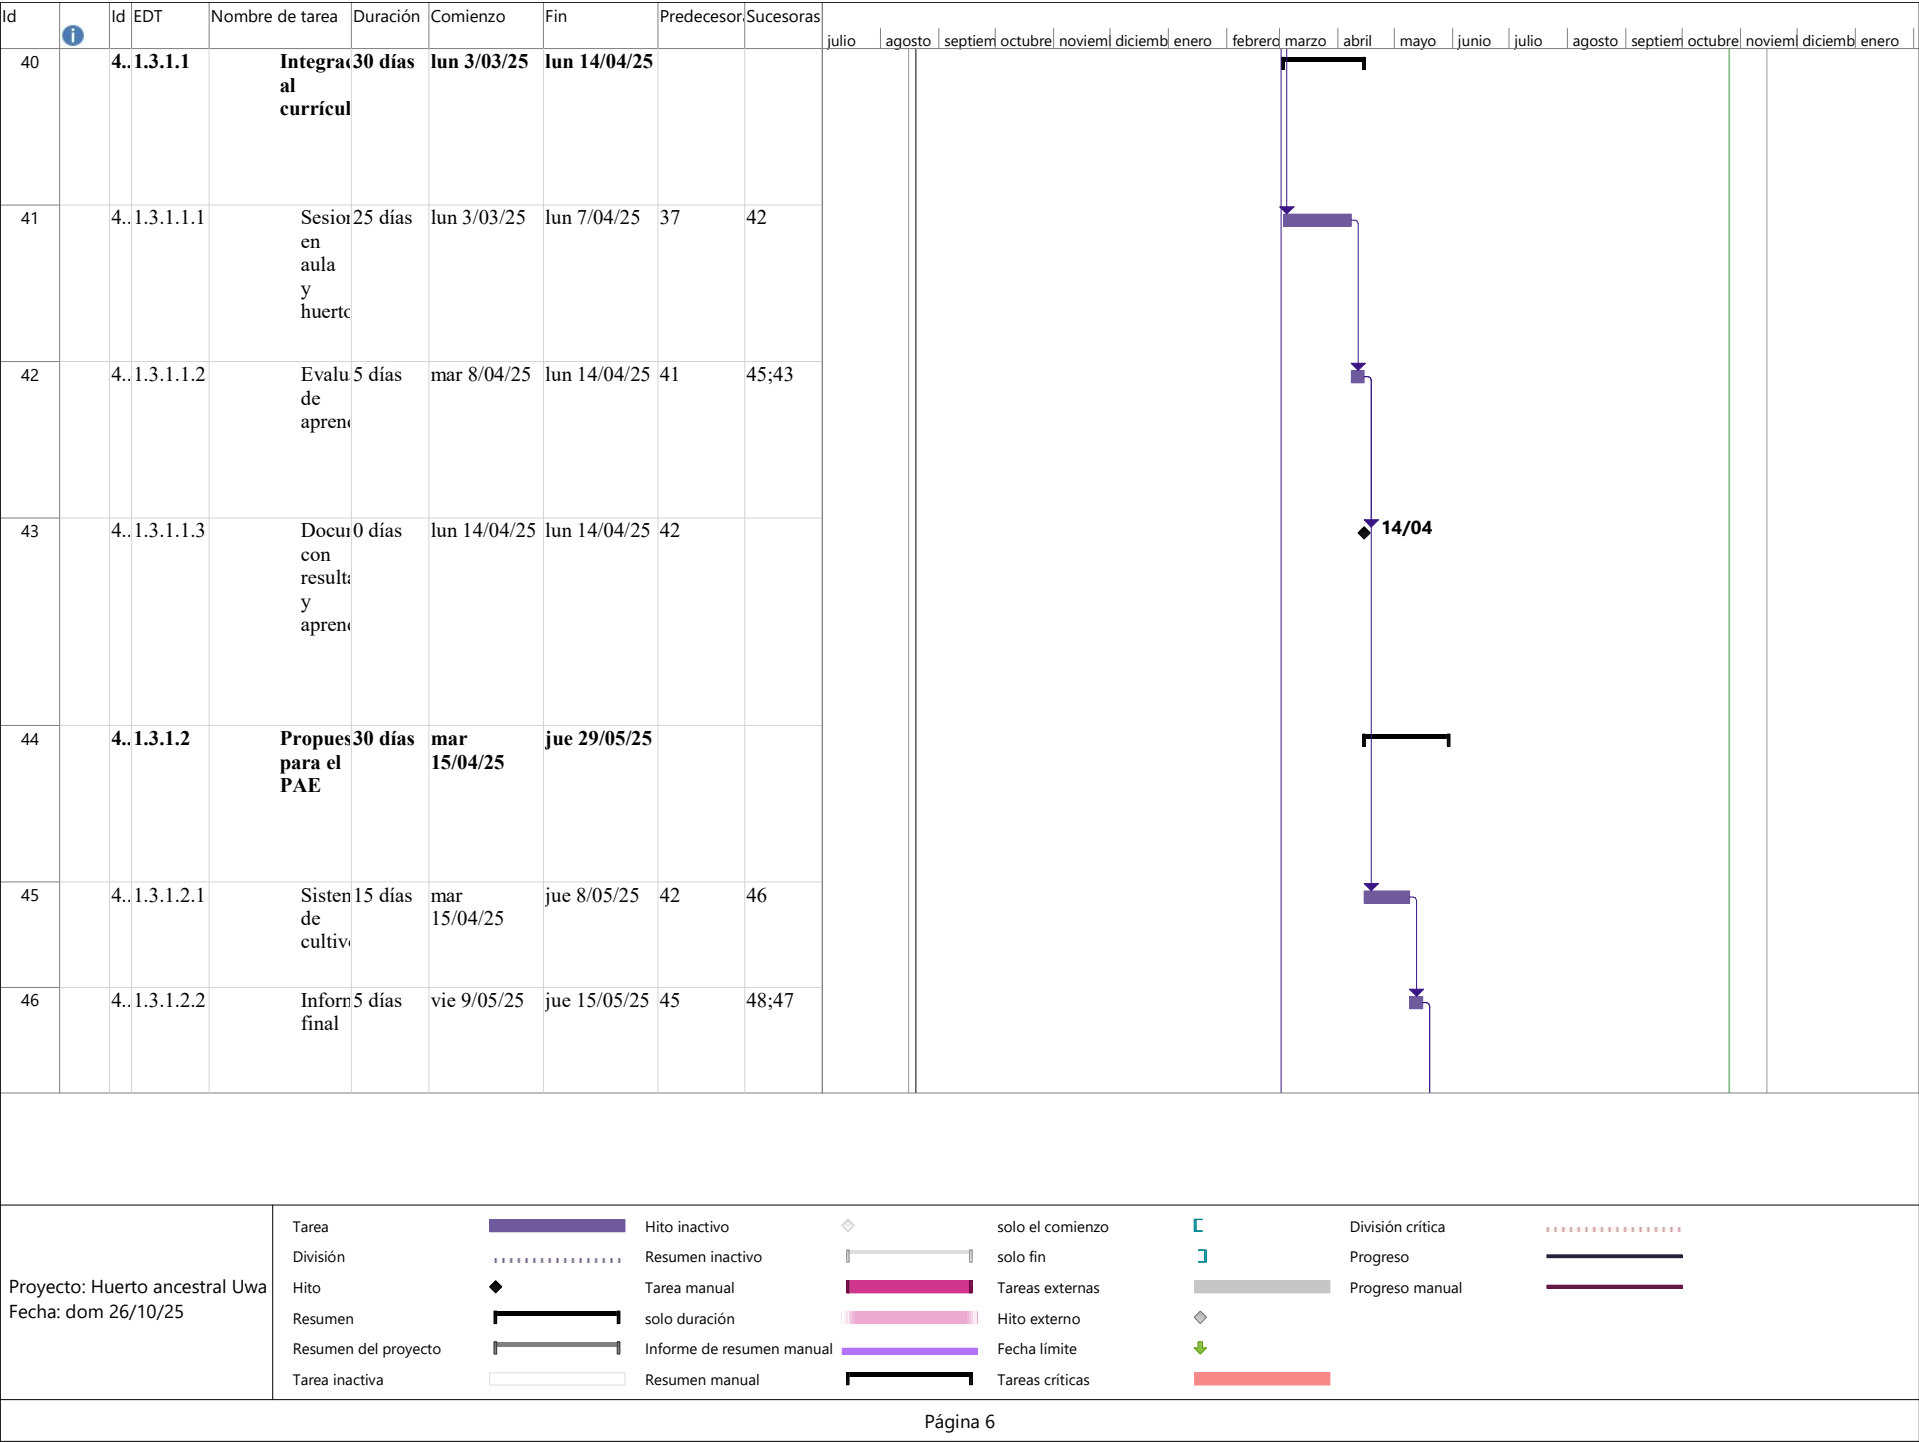



Página 7

Id		Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Sucesoras	julio	agosto	septiem	octubre	noviem	diciemb	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiem	octubre	noviem	diciemb	enero
55		5..1.4.1.5		Visitas del tecnico	10 días	mié 26/02/25	mar 11/03/25	36																				
56		5..1.4.2		Informe de resultado	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25																					
57		5..1.4.2.1		Recolección de evidencias	4 días	mié 5/11/25	lun 10/11/25	52	58																			
58		5..1.4.2.2		Elaboración del documento	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	57	59;61																			
59		5..1.4.2.3		Presentación del informe final	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	58	62																			
60		6..1.4.3		Cierre	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25																					
61		6..1.4.3.1		Convocatoria de reunión	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	58																				
62		6..1.4.3.2		Evaluación colectiva del proceso	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	59	63																			
63		6..1.4.3.3		Cierre del proyecto	0 días	vie 14/11/25	vie 14/11/25	62																				

Proyecto: Huerto ancestral Uwa
Fecha: dom 26/10/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

.....

◆

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

◆

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

.....
