

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021												febrero 2021			
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
1	Proyecto Pronto Pago	258 días	lun 04/01/21																
2	Inicio	0 días	lun 04/01/21																
3	Constitución de la empresa	70 días	lun 04/01/21																
4	Tramites legales	16 días	lun 04/01/21																
5	Verificar la disponibilidad del nombre	1 día	lun 04/01/21																
6	Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una	1 día	mar 05/01/21																
7	Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y obtener	1 día	mié 06/01/21																
8	Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el	1 día	jue 07/01/21																
9	Obtener copia del Certificado de existencia y Representación Legal, en	1 día	vie 08/01/21																
10	Obtener número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del	2 días	mar 12/01/21																
11	Abrir una cuenta bancaria y depositar	1 día	jue 14/01/21																
12	Inscribir libros de comercio ante la Cámara de Comercio	2 días	mar 12/01/21																
13	Inscribirse ante la Administración de Impuestos	2 días	jue 14/01/21																
14	Inscribir compañía ante Caja de Compensación	1 día	sáb 16/01/21																


The Gantt chart visualizes the project schedule. It starts on January 4, 2021. Tasks 1 through 4 are marked as completed. Task 5 is completed on Jan 5. Task 6 is completed on Jan 6. Task 7 is completed on Jan 7. Task 8 is completed on Jan 8. Task 9 is completed on Jan 9. Task 10 is completed on Jan 12. Task 11 is completed on Jan 13. Task 12 is completed on Jan 14. Task 13 is completed on Jan 15. Task 14 is in progress, starting on Jan 16 and ending on Jan 17.

Tarea	Comienzo	Fin	Estado
1	04/01/21	04/01/21	Completada
2	04/01/21	04/01/21	Completada
3	04/01/21	04/01/21	Completada
4	04/01/21	04/01/21	Completada
5	04/01/21	05/01/21	Completada
6	05/01/21	06/01/21	Completada
7	06/01/21	07/01/21	Completada
8	07/01/21	08/01/21	Completada
9	08/01/21	09/01/21	Completada
10	12/01/21	14/01/21	Completada
11	14/01/21	15/01/21	Completada
12	15/01/21	17/01/21	Completada
13	17/01/21	19/01/21	Completada
14	19/01/21	20/01/21	En progreso

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
34	Seleccionar Proveedores	2 días	jue 04/03/21																
35	Adquirir equipos	1 día	sáb 06/03/21																
36	Cierre fase equipos	0 días	lun 08/03/21																
37	Recursos Humanos	20 días	mar 09/03/21																
38	Reconocer necesidad	1 día	mar 09/03/21																
39	Buscar información de opciones	1 día	mar 09/03/21																
40	Evaluar opciones	2 días	mar 09/03/21																
41	Evaluar candidatos	8 días	jue 11/03/21																
42	Seleccionar personal	3 días	mié 24/03/21																
43	Adquirir personal	2 días	sáb 27/03/21																
44	Capacitar al personal	5 días	mié 31/03/21																
45	Cierre fase recursos humanos	0 días	mar 30/03/21																
46	Materiales Oficina	10 días	mié 31/03/21																
47	Reconocer necesidad	1 día	mié 31/03/21																
48	Buscar información de opciones	1 día	mié 31/03/21																
49	Evaluar opciones	2 días	mié 31/03/21																
50	Evaluar proveedores	5 días	lun 05/04/21																
51	Seleccionar Proveedores	2 días	lun 12/04/21																
52	Adquirir equipos	1 día	mié 14/04/21																
53	Cierre fase Materiales Oficina	0 días	jue 15/04/21																
54	Cierre fase de adquisiciones	0 días	jue 15/04/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

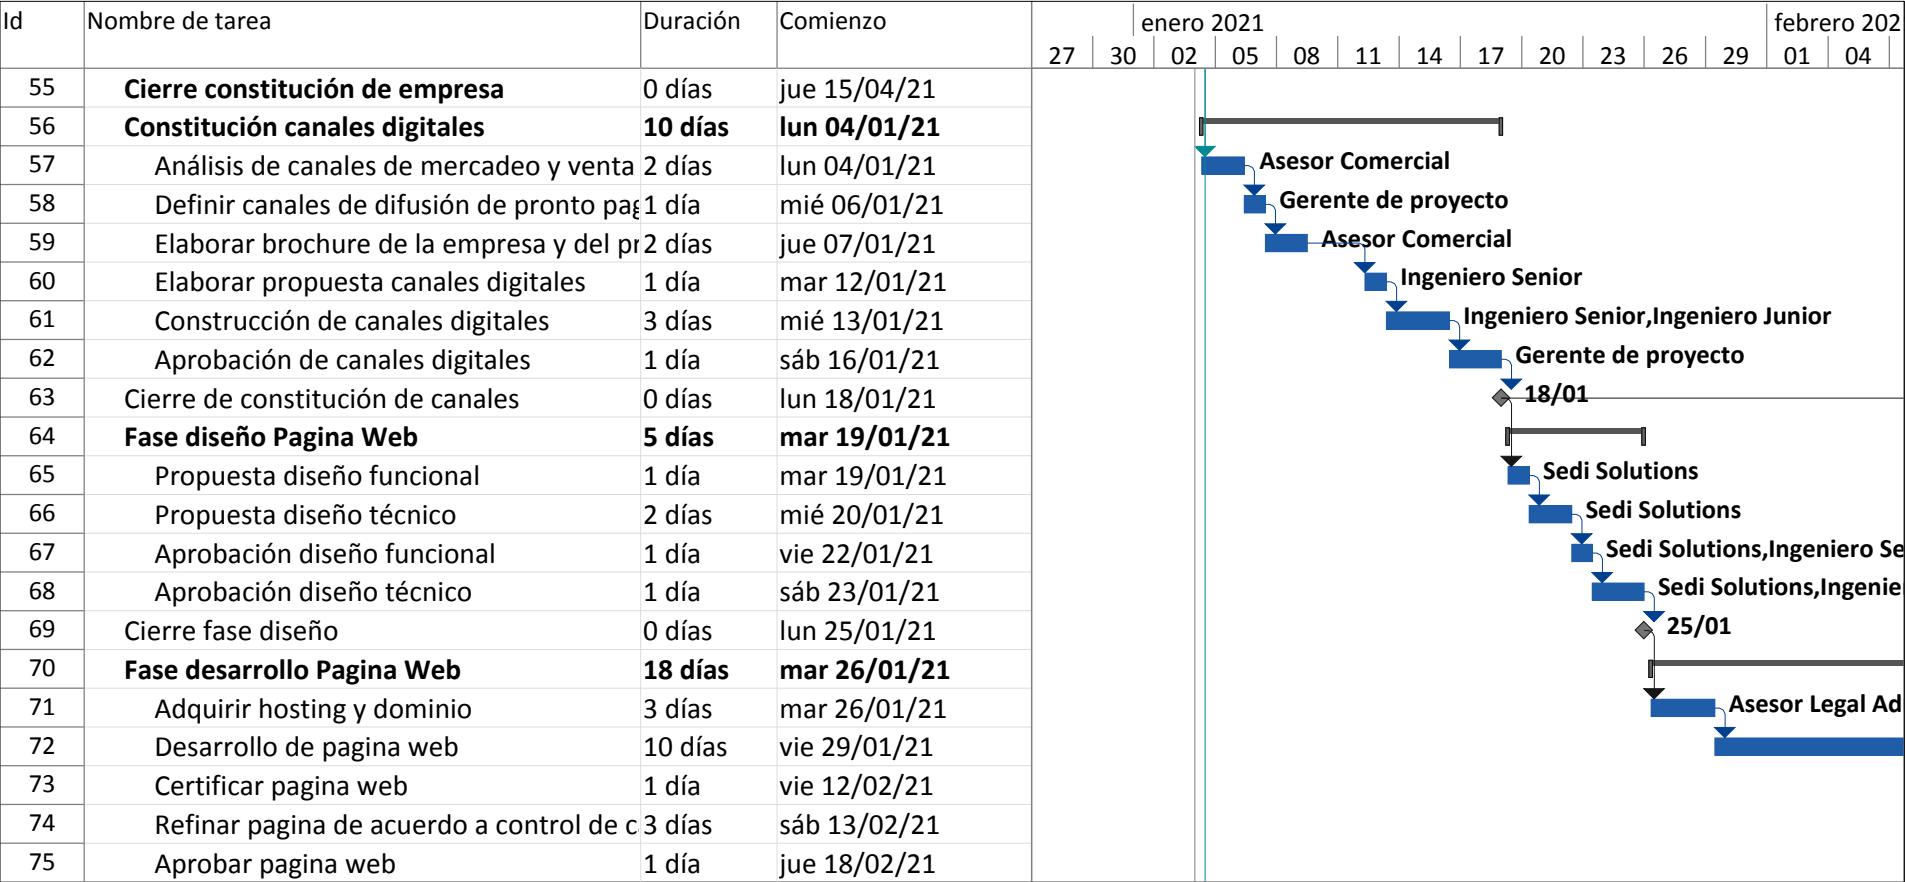

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
76	Cierre fase desarrollo	0 días	vie 19/02/21																
77	Fase de pruebas Web	10 días	vie 19/02/21																
78	Elaborar deck de pruebas	2 días	vie 19/02/21																
79	Realizar Pruebas Unitarias	3 días	mar 23/02/21																
80	Realizar Pruebas de aceptación	2 días	vie 26/02/21																
81	Realizar pruebas de hacking ético	1 día	mar 02/03/21																
82	Realizar Certificación	1 día	mié 03/03/21																
83	Presentar aprobación final	1 día	jue 04/03/21																
84	Cierre fase de pruebas	0 días	vie 05/03/21																
85	Puesta en producción	2 días	vie 05/03/21																
86	Desplegar pagina producción	1 día	vie 05/03/21																
87	Puesta en marcha	1 día	sáb 06/03/21																
88	Cierre puesta en producción	0 días	lun 08/03/21																
89	Investigación Fase preliminar Pronto Pago	15 días	lun 04/01/21																
90	Presentar solicitud de proyecto	1 día	lun 04/01/21																
91	Realizar reunión de contextualización	1 día	mar 05/01/21																
92	Realizar estudio de factibilidad	3 días	mié 06/01/21																
93	Realizar reunión de cierre	1 día	mar 12/01/21																
94	Generar aprobación de solicitud	1 día	mié 13/01/21																
95	Levantar acta de constitución del proyecto	1 día	jue 14/01/21																
96	Aprobación de acta de constitución del proyecto	1 día	vie 15/01/21																

Proyecto: cronograma del proyecto Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
97	Elaborar plan del proyecto	2 días	sáb 16/01/21																
98	Aprobación plan del proyecto	1 día	mié 20/01/21																
99	Elaboración plan de trabajo	1 día	jue 21/01/21																
100	Contextualización del plan de trabajo	1 día	vie 22/01/21																
101	Aprobación del plan de trabajo	1 día	sáb 23/01/21																
102	Cierre fase investigación preliminar	0 días	lun 25/01/21																
103	Fase análisis de Información	70 días	mar 26/01/21																
104	Elaborar documento de requisitos	20 días	mar 26/01/21																
105	Aprobar documento de requisitos	8 días	mar 23/02/21																
106	Elaborar documento diagramas de casos de uso	15 días	vie 05/03/21																
107	Aprobar documento de diagramas de caso de uso	8 días	sáb 27/03/21																
108	Planificar módulos primer entregable	5 días	sáb 10/04/21																
109	Aprobar módulos primer entregable	2 días	sáb 17/04/21																
110	Planificar módulos segundo entregable	8 días	mar 20/04/21																
111	Aprobar módulos segundo entregable	2 días	lun 03/05/21																
112	Aprobación documento final interno	1 día	mié 05/05/21																
113	Cierre fase análisis de información	0 días	jue 06/05/21																
114	Fase de aprobación	1 día	jue 06/05/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 202	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
115	Aprobar documento final	1 día	jue 06/05/21																
116	Cierre fase de aprobación	0 días	vie 07/05/21																
117	Cierre fase de análisis de información	0 días	vie 07/05/21																
118	Fase diseño aplicativo Pronto Pago	6 días	vie 07/05/21																
119	Aprobar diseño funcional	1 día	vie 07/05/21																
120	Aprobar diagrama de arquitectura	1 día	vie 07/05/21																
121	Verificar documento de casos de uso	5 días	lun 10/05/21																
122	Aprobar documento de casos de uso	2 días	lun 10/05/21																
123	Cierre fase diseño	0 días	mié 12/05/21																
124	Fase desarrollo aplicativo Pronto Pago	91 días	mié 12/05/21																
125	Alistar ambiente desarrollo	3 días	mié 12/05/21																
126	Alistar servidor de base de datos	2 días	mié 12/05/21																
127	Desarrollar el modulo de clientes	60 días	mar 18/05/21																
128	Desarrollar el modulo de proveedores	30 días	mar 18/05/21																
129	Desarrollar el modulo de terceros	30 días	mar 18/05/21																
130	Desarrollar el modulo de reportes	15 días	mar 17/08/21																
131	Entregar aplicativo por el equipo de des	1 día	mar 07/09/21																
132	Realizar feedback del aplicativo por el eq	1 día	mié 08/09/21																
133	Realizar Estabilización y ajustes finales	10 días	jue 09/09/21																
134	Aprobar desarrollo del aplicativo	1 día	jue 23/09/21																
135	Cierre fase desarrollo	0 días	vie 24/09/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
136	Fase de pruebas Pronto Pago	40 días	vie 24/09/21																
137	Elaborar deck de pruebas	10 días	vie 24/09/21																
138	Realizar Pruebas Unitarias	15 días	vie 08/10/21																
139	Realizar Pruebas de aceptación	5 días	sáb 30/10/21																
140	Realizar pruebas de carga	2 días	sáb 30/10/21																
141	Realizar pruebas de estrés del sistema	2 días	sáb 30/10/21																
142	Realizar pruebas de hacking ético	2 días	vie 19/11/21																
143	Realizar Certificación	10 días	jue 04/11/21																
144	Presentar aprobación final	3 días	vie 19/11/21																
145	Cierre fase de pruebas	0 días	mar 23/11/21																
146	Fase de documentación	9 días	mar 23/11/21																
147	Elaborar manual de usuario de la aplicaci	5 días	mar 23/11/21																
148	Elaborar manual técnico de la aplicación	5 días	mar 23/11/21																
149	Revisar y ajustar manuales	3 días	mar 30/11/21																
150	Aprobar manuales	1 día	sáb 04/12/21																
151	Cierre fase de documentación	0 días	lun 06/12/21																
152	Fase de almacenamiento en la nube	9 días	mar 23/11/21																
153	Alistar ambiente de pruebas	2 días	mar 23/11/21																
154	Instalar certificados	1 día	vie 26/11/21																
155	Pruebas de conectividad	1 día	sáb 27/11/21																
156	Validar ambiente	1 día	lun 29/11/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
157	Alistar ambiente de producción	2 días	mar 30/11/21																
158	Pruebas de conectividad	1 día	vie 03/12/21																
159	Validar ambiente	1 día	sáb 04/12/21																
160	Cerrar fase de almacenamiento en la nube	0 días	lun 06/12/21																
161	Fase de Comercialización	32 días	mar 09/03/21																
162	Buscar clientes (tele mercadeo, Redes Sc	15 días	mar 09/03/21																
163	Enviar Brochure con nuestros servicios	1 día	mié 31/03/21																
164	Realizar visitas comerciales	1 día	mié 31/03/21																
165	Elaborar propuesta comercial	1 día	mié 31/03/21																
166	Realizar visitas técnicas	1 día	mié 31/03/21																
167	Realizar demo del aplicativo	1 día	mié 31/03/21																
168	Aprobación propuesta	1 día	sáb 03/04/21																
169	Definir mecanismos de integración	2 días	lun 05/04/21																
170	Levantar interfaces	1 día	mié 07/04/21																
171	Intercambio de información legal	1 día	vie 09/04/21																
172	Elaborar acuerdos de confidencialidad	3 días	sáb 10/04/21																
173	Aprobación de acuerdos de confidenciali	3 días	mié 14/04/21																
174	Levantar información de cliente	1 día	lun 19/04/21																
175	Levantar información de proveedores	1 día	mar 20/04/21																
176	Definición de guiones entre cliente y equ	3 días	mié 21/04/21																
177	Cierre fase comercialialización	0 días	lun 26/04/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
178	Fase puesta en marcha	6 días	lun 06/12/21																
179	Entregar manual de usuario de la aplicac	1 día	lun 06/12/21																
180	Entregar manual técnico de la aplicación	1 día	lun 06/12/21																
181	Realizar capacitación técnica	5 días	mar 07/12/21																
182	Realizar capacitación funcional	5 días	mar 07/12/21																
183	Cierre fase de puesta en marcha	0 días	mié 15/12/21																
184	Fase Implementación	15 días	mié 15/12/21																
185	Reunión de inicialización	1 día	mié 15/12/21																
186	Definir SLAS de servicio	1 día	vie 17/12/21																
187	Definir los canales de comunicación	1 día	sáb 18/12/21																
188	Definir los datos de las personas de cont	1 día	lun 20/12/21																
189	Levantar información de cliente para la c	1 día	mar 21/12/21																
190	Registrar al cliente en el aplicativo	1 día	mié 22/12/21																
191	Levantar información de proveedores	3 días	vie 24/12/21																
192	Registrar a proveedores dentro del aplic	1 día	mar 28/12/21																
193	Levantar información de fondeos	1 día	mié 29/12/21																
194	Registrar a fondeos dentro del aplicativo	1 día	vie 31/12/21																
195	Definir guiones entre cliente y equipo co	3 días	sáb 01/01/22																
196	Ejecutar Integración	8 días	mié 15/12/21																
197	Poner en marcha la aplicación	1 día	lun 27/12/21																
198	Crear usuarios de los actores del sistema	1 día	mar 28/12/21																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	enero 2021														febrero 2021	
				27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04		
199	Definir reglas de negocio dentro del aplic	1 día	mié 29/12/21																
200	Crear proveedores masivamente del clie	1 día	vie 31/12/21																
201	Cierre fase de implementación	0 días	sáb 01/01/22																
202	Fase Operativa	1 día	sáb 01/01/22																
203	Cargar facturas del cliente en el aplicativ	1 día	sáb 01/01/22																
204	Contactar proveedores para el descuent	1 día	sáb 01/01/22																
205	Cierre fase operativa	0 días	lun 03/01/22																
206	Fase Monitoreo y Control	15 días	mar 28/12/21																
207	Ejecutar soporte y garantía	15 días	mar 28/12/21																
208	Realizar reunión de seguimiento del proy	1 día	lun 03/01/22																
209	Crear campañas para cliente y sus prove	3 días	mar 04/01/22																
210	Realizar acompañamiento comercial	1 día	mar 04/01/22																
211	Cierre fase monitoreo y control	0 días	mié 05/01/22																
212	Fin	0 días	mié 05/01/22																

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	



de proyecto
ente de proyecto

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Gerente de proyecto


Gerente de proyecto

Administrativo, Gerente de proyecto


Proyecto

Proyecto


Proyecto

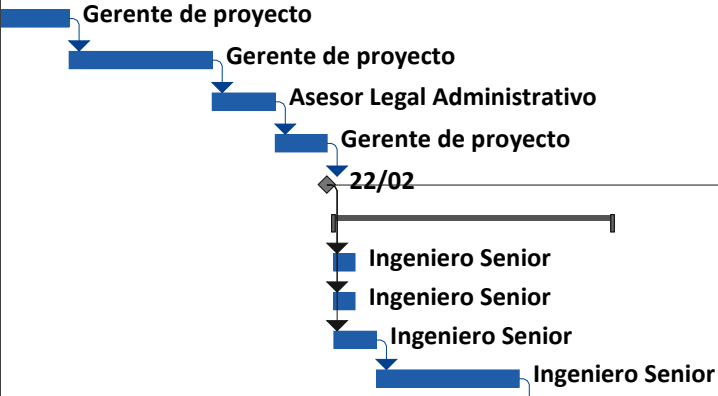


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

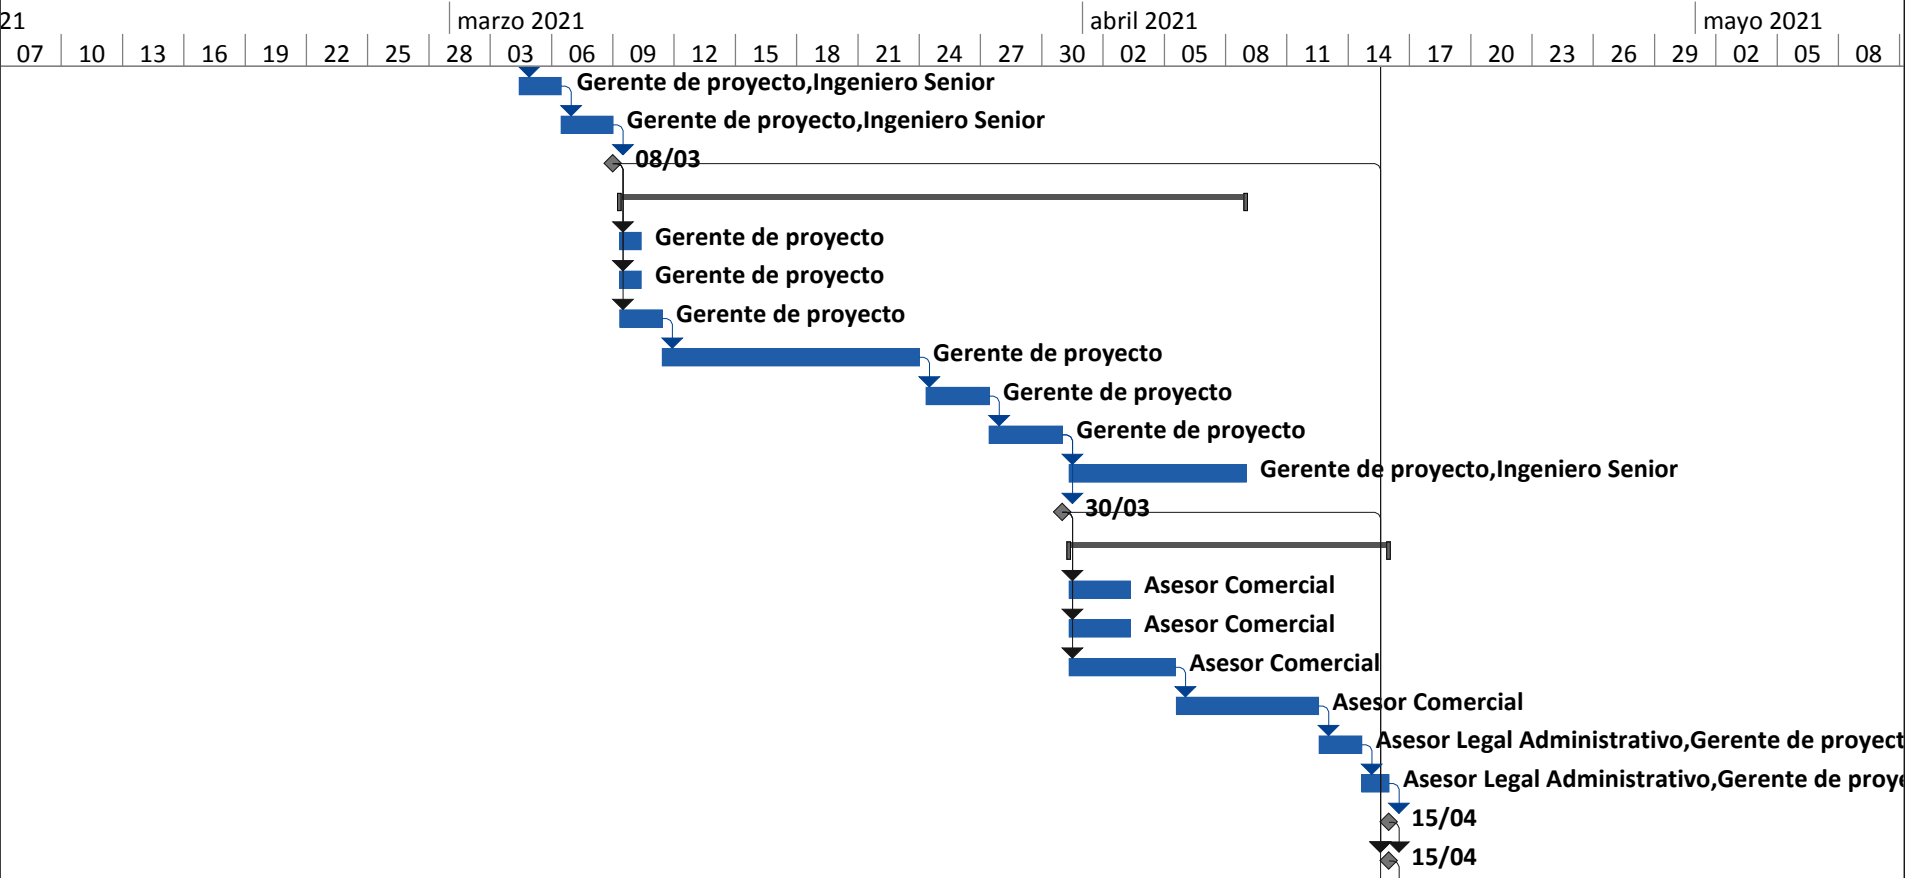


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

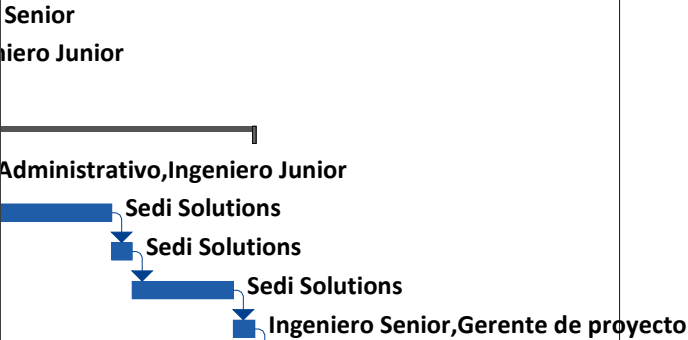


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

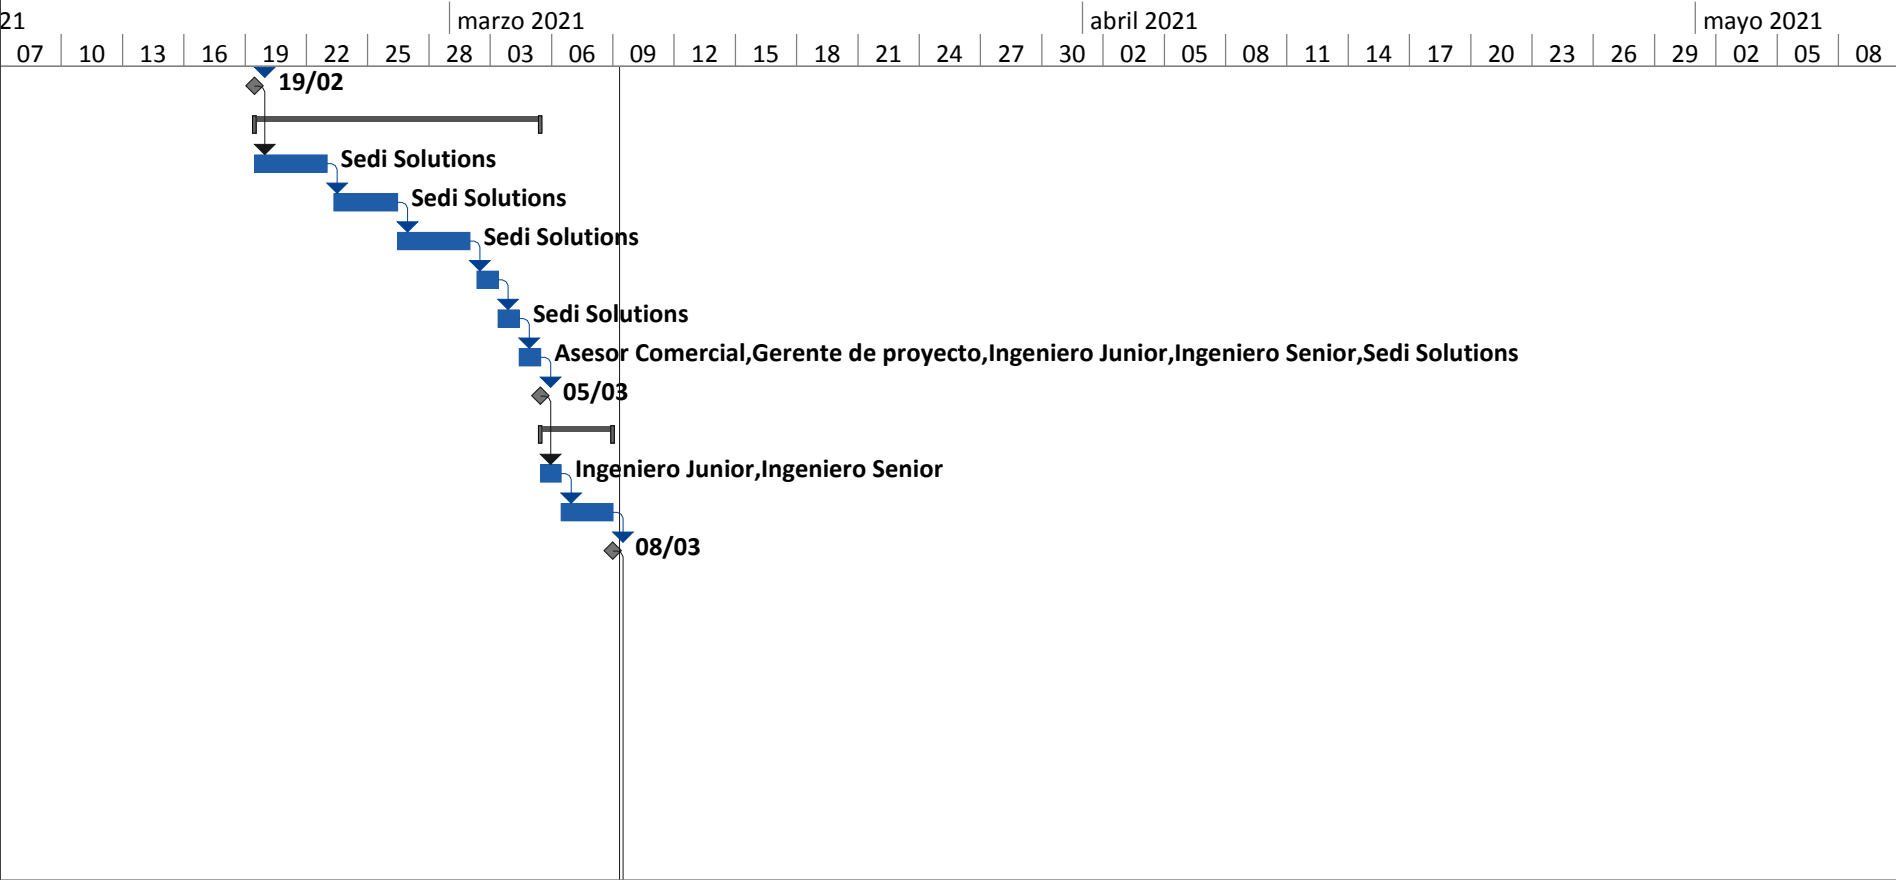


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

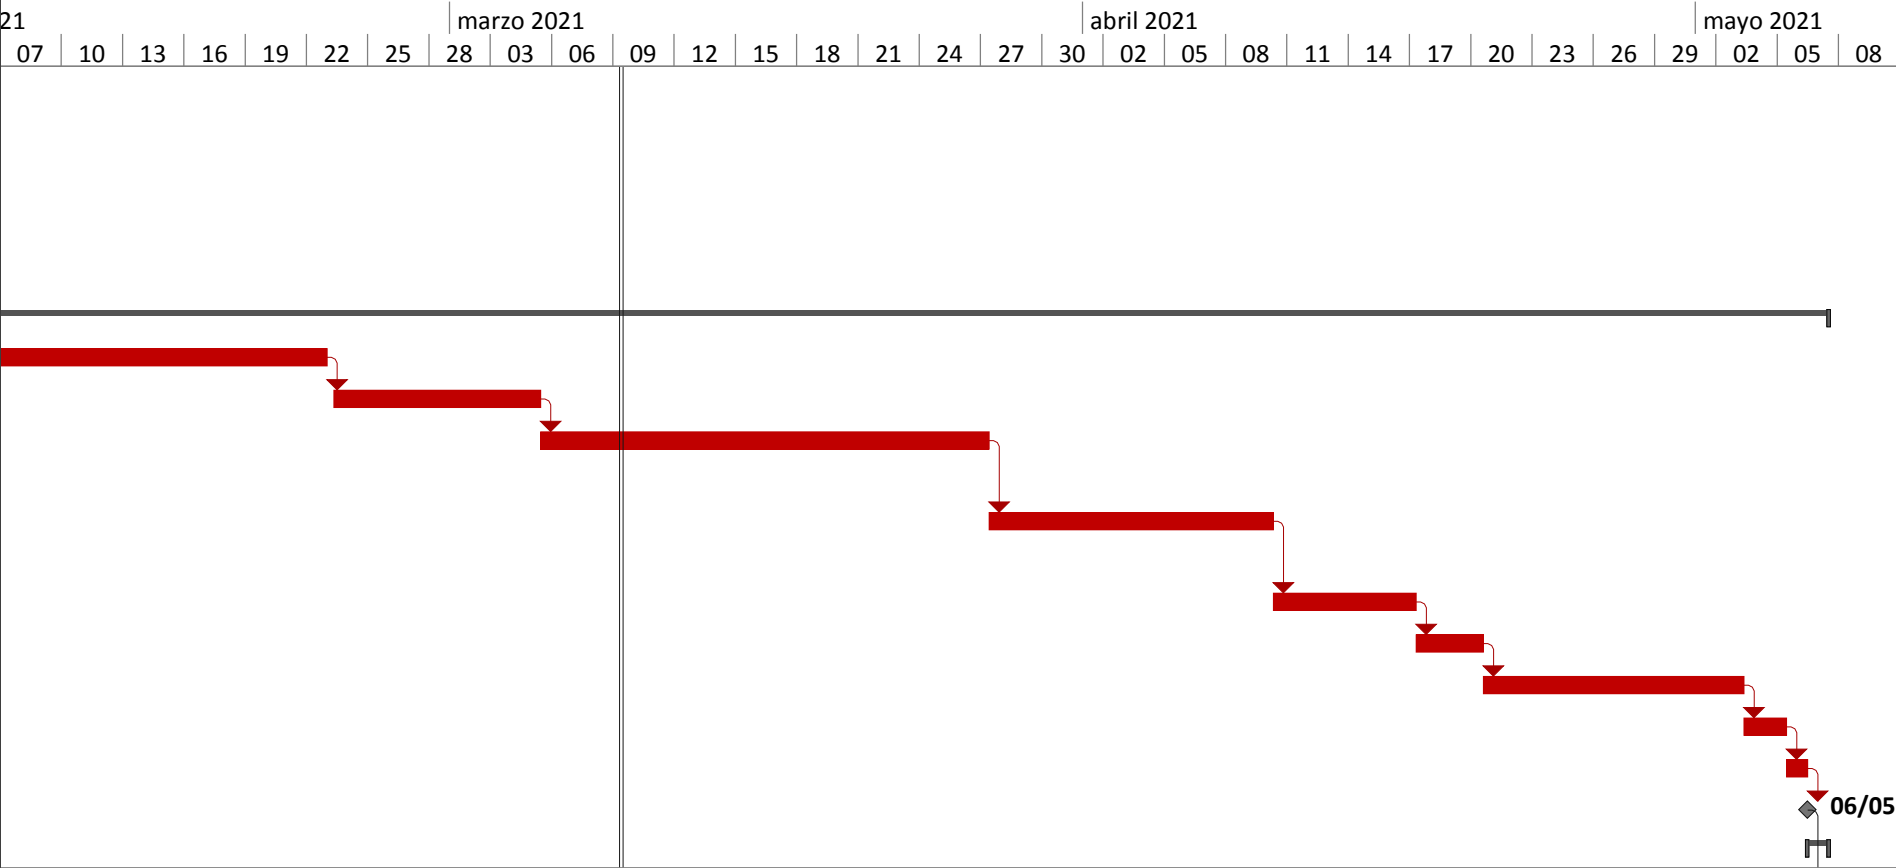


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

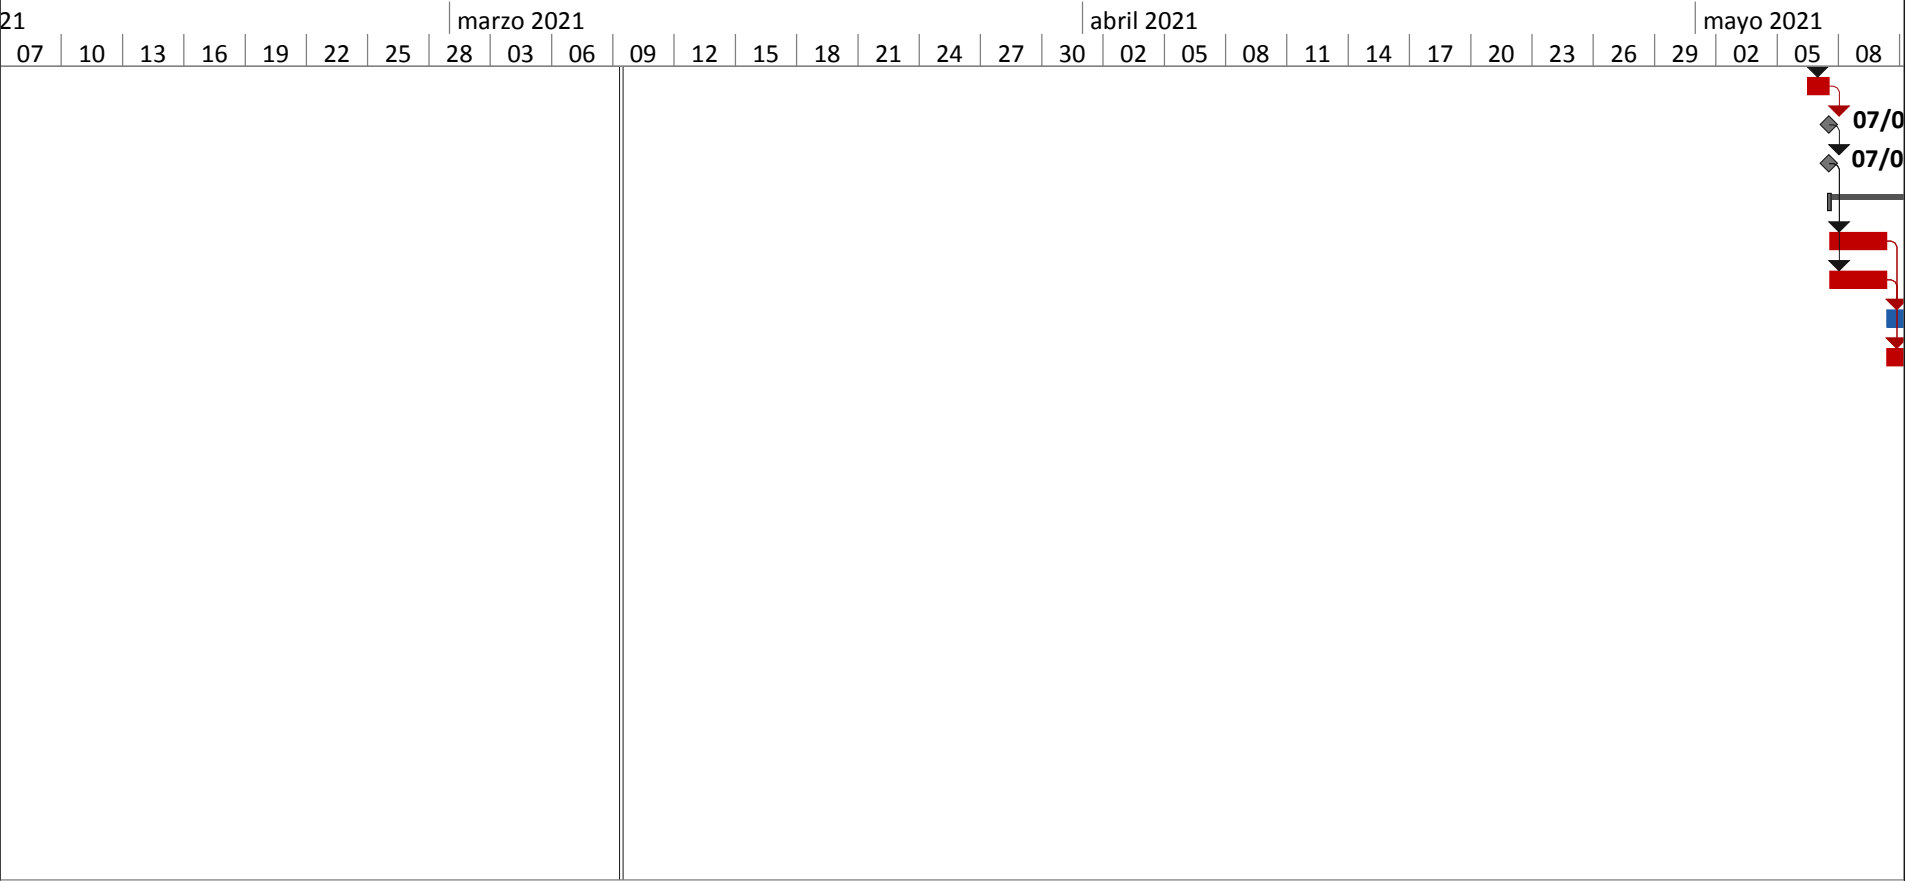


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

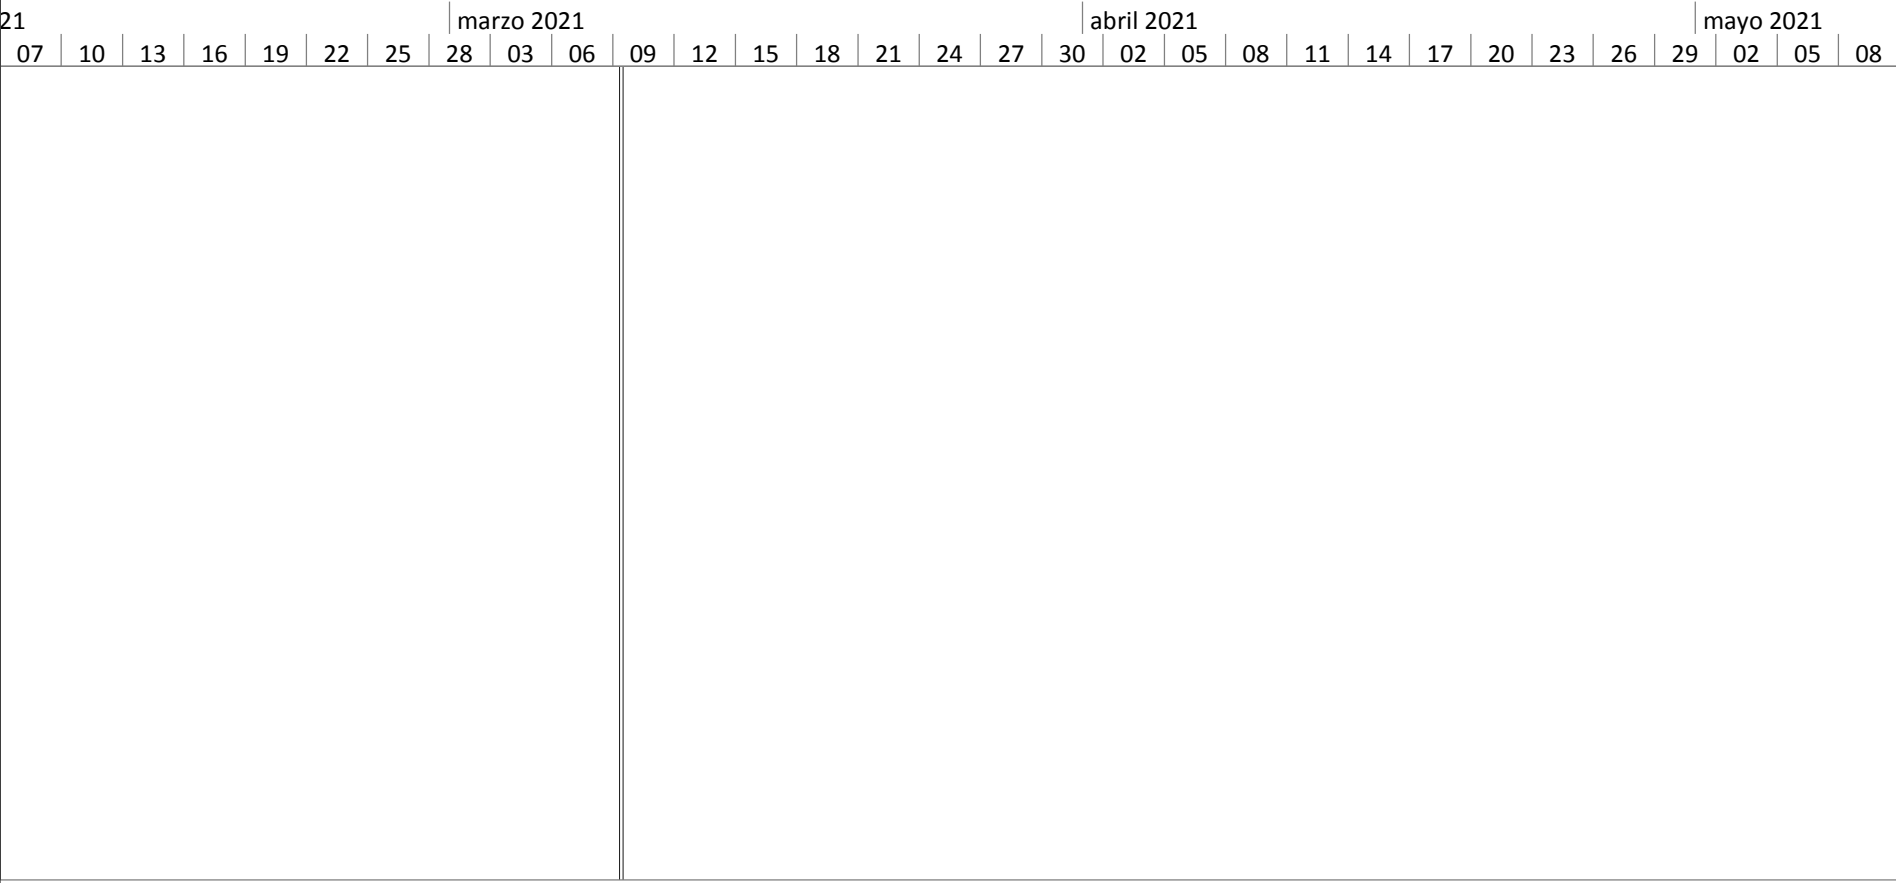

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

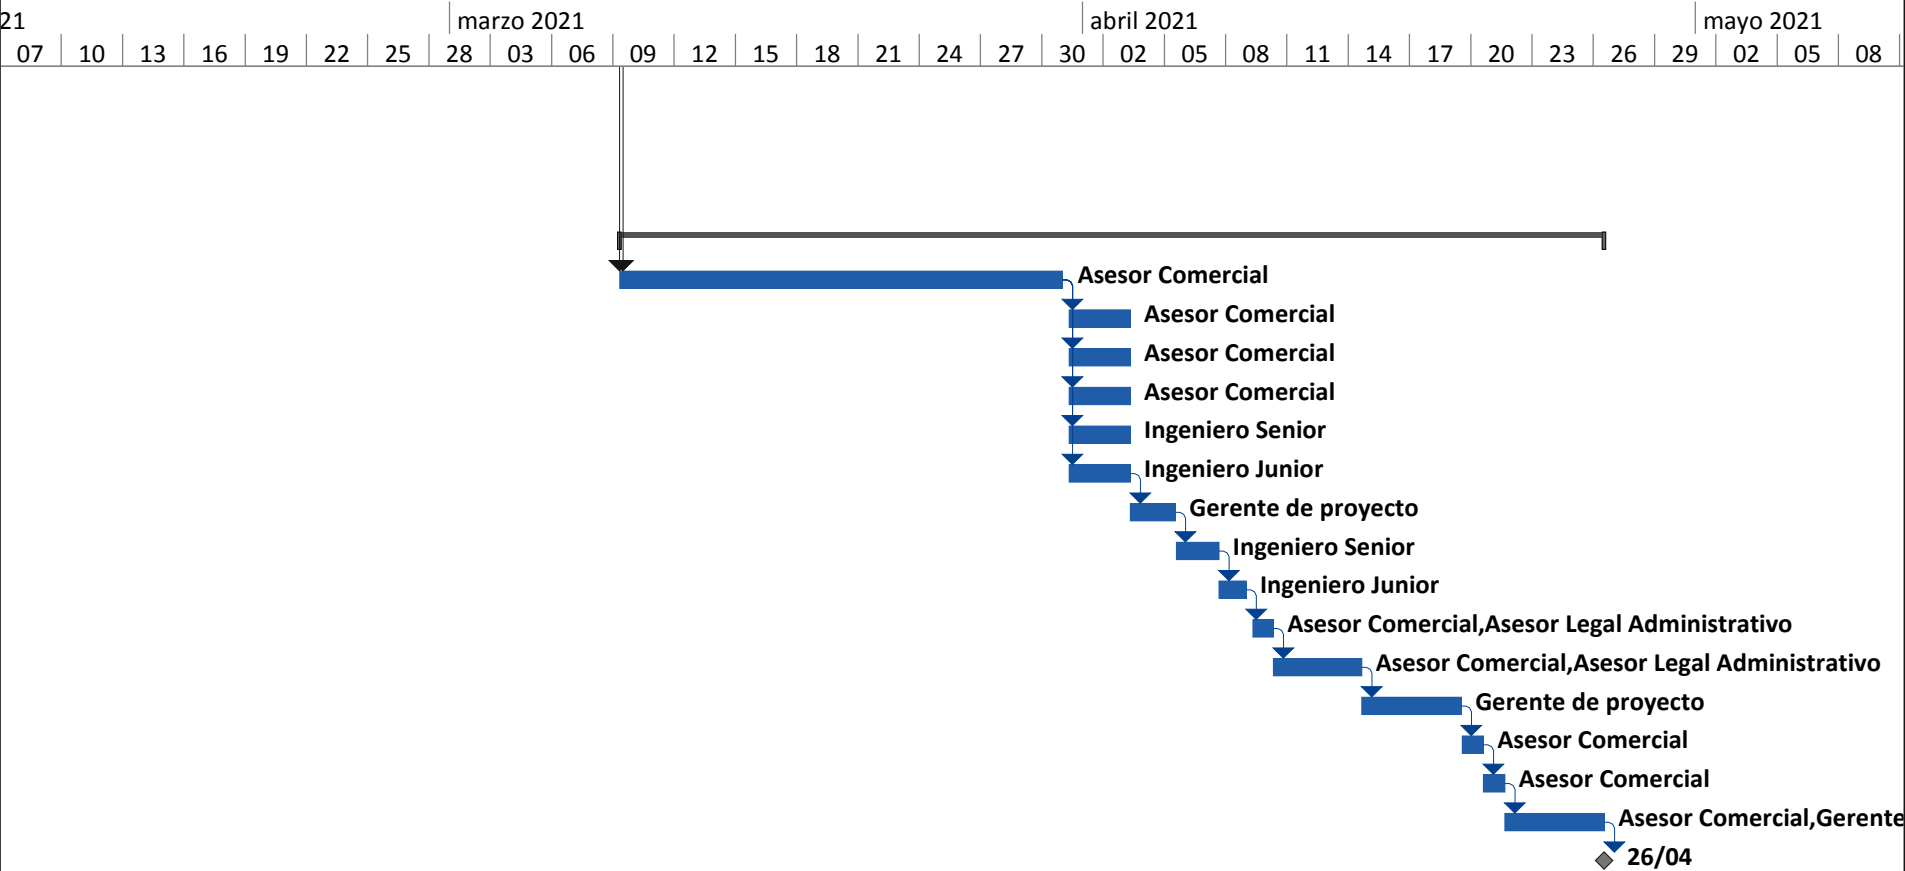

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

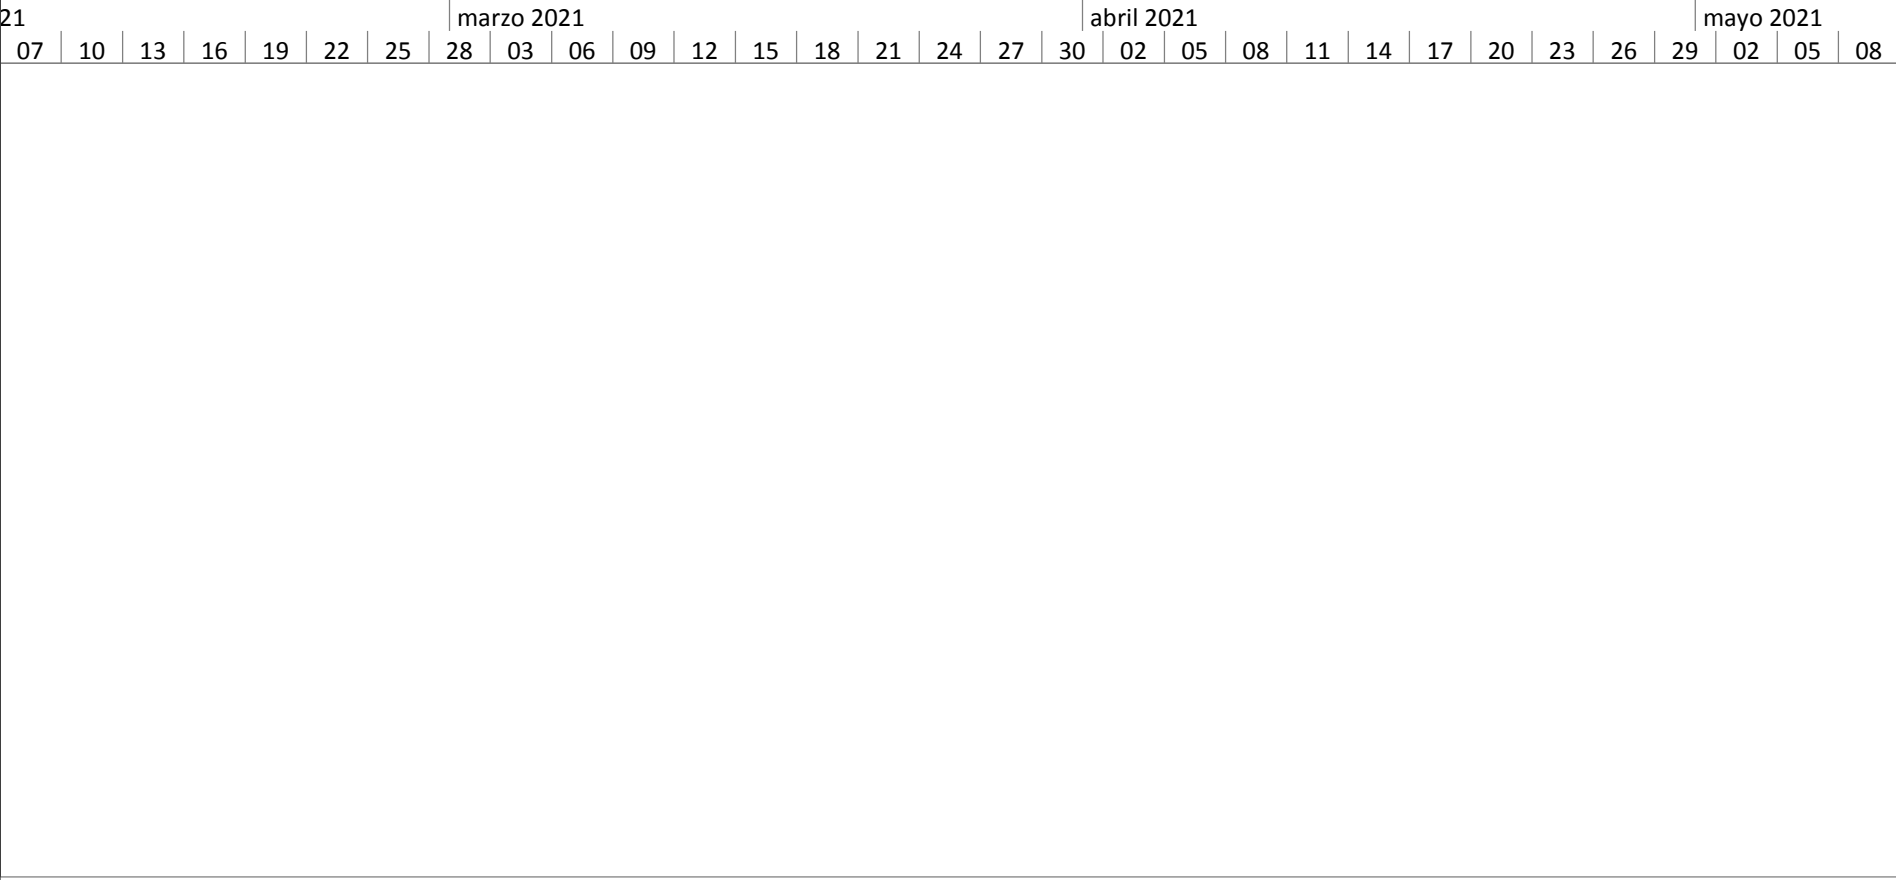

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	



Proyecto: cronograma del proyec


Fecha: mié 02/09/20

Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

cto
yecto

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

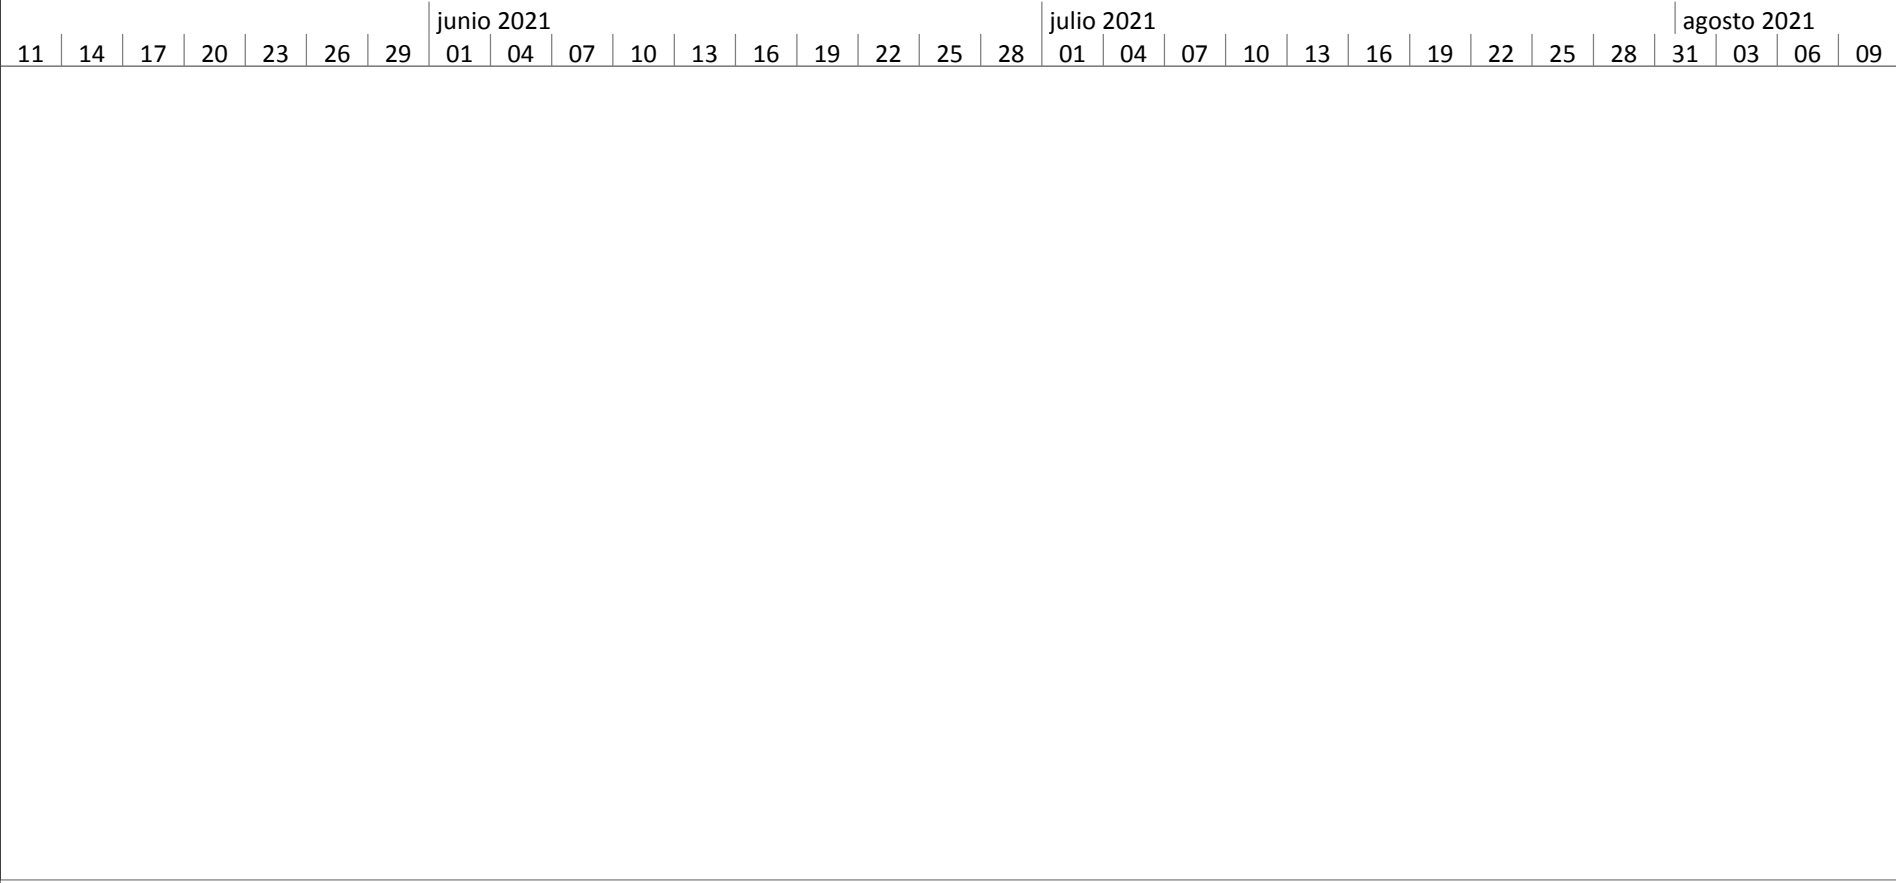


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	




5

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

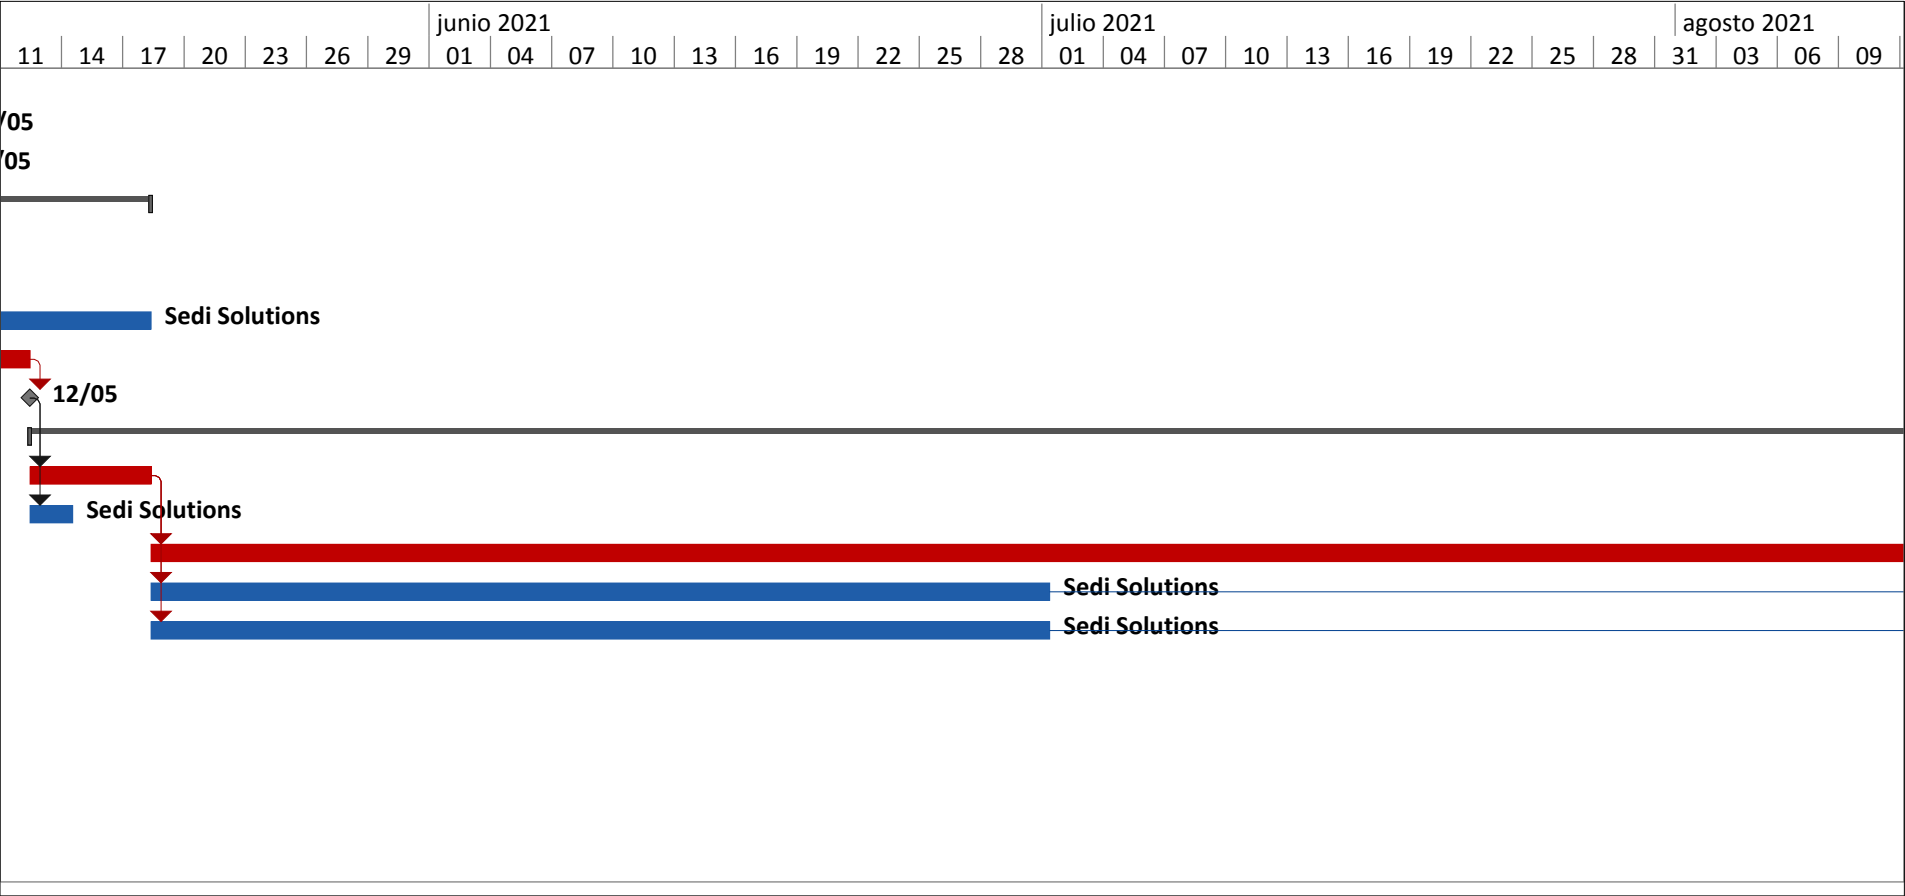

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	


Página 29

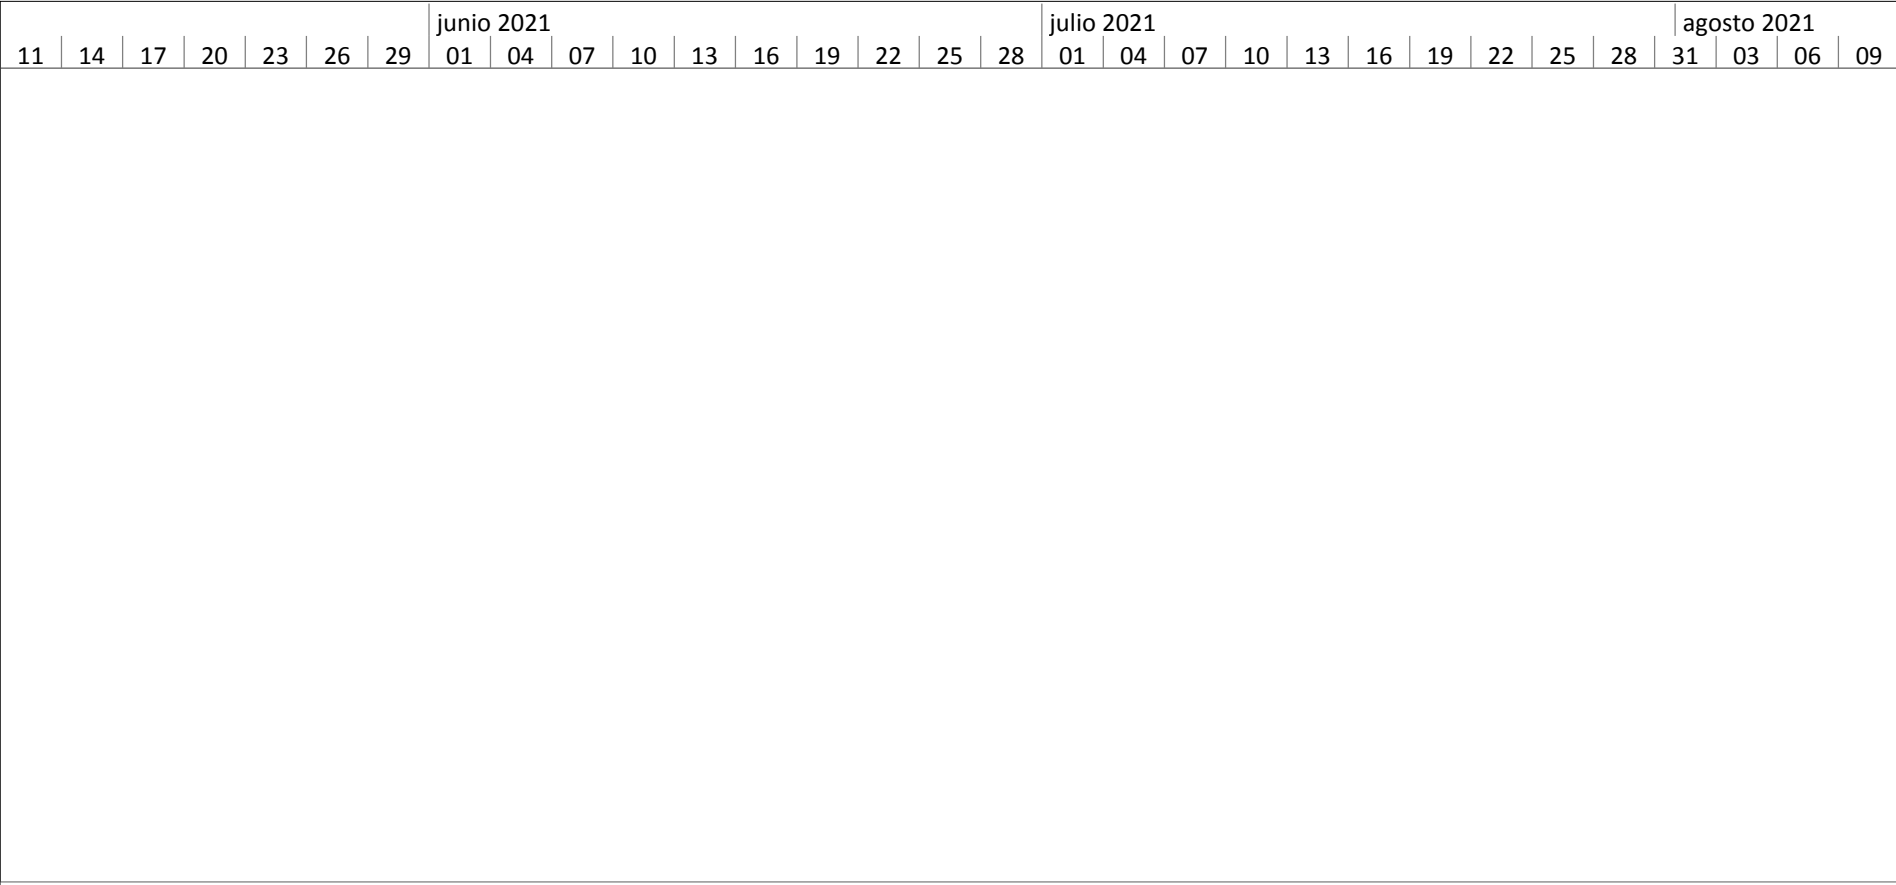

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	


te de proyecto


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

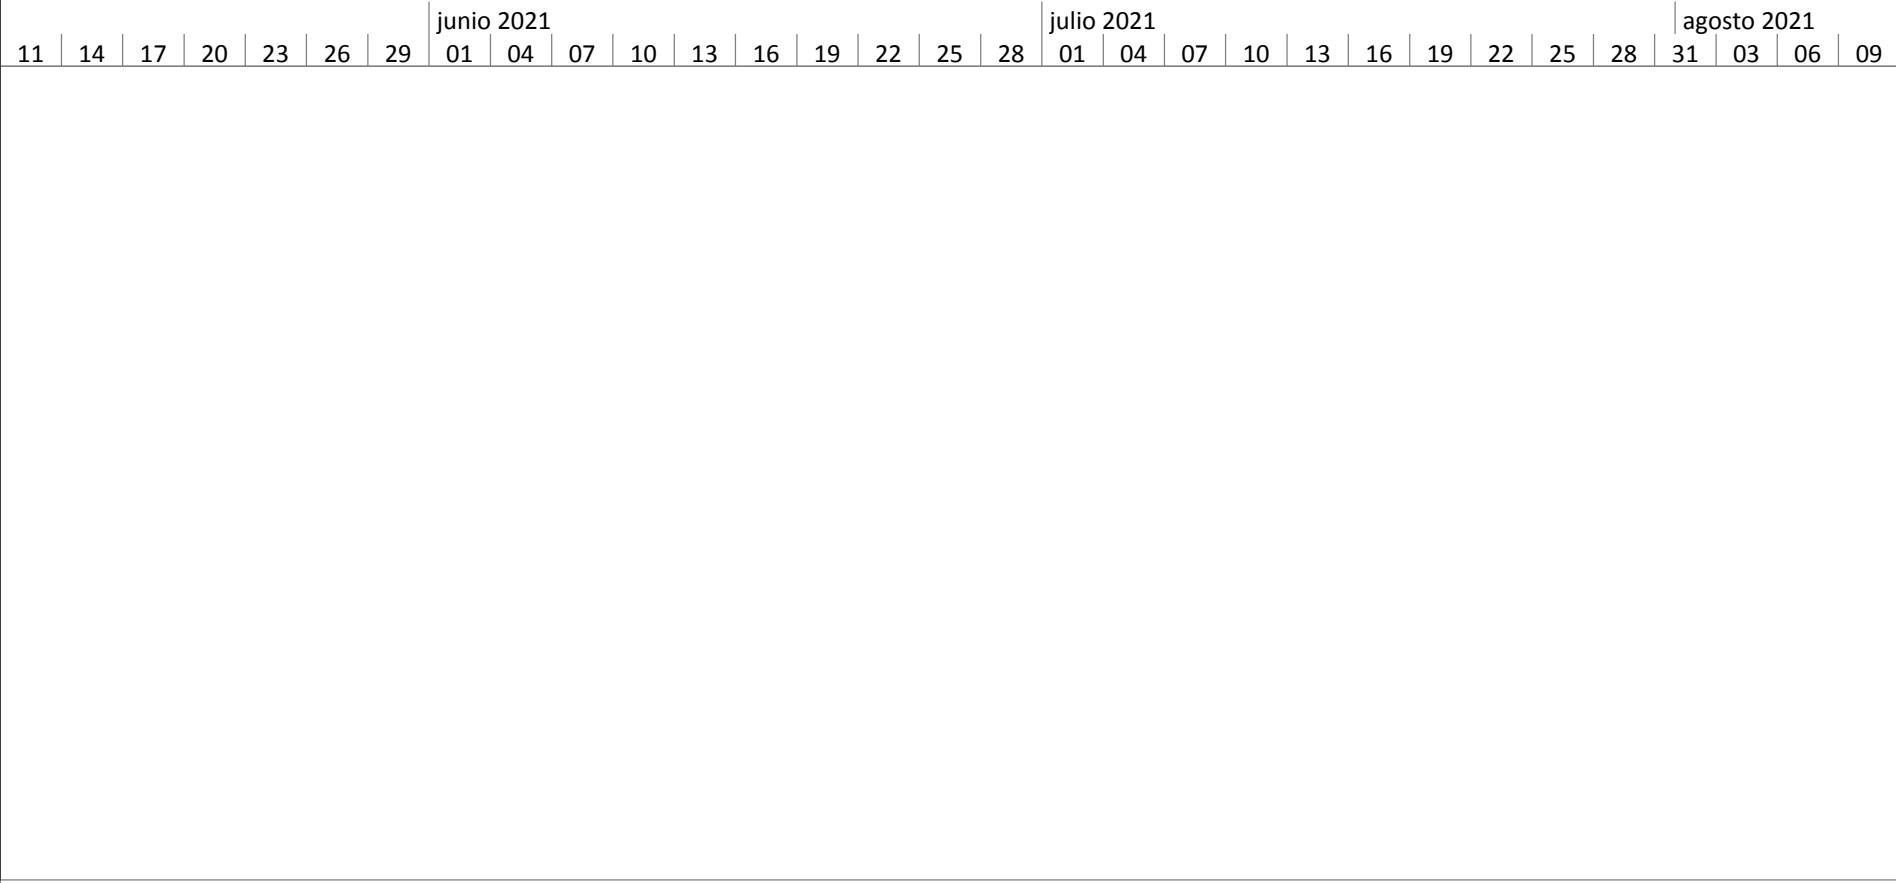


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

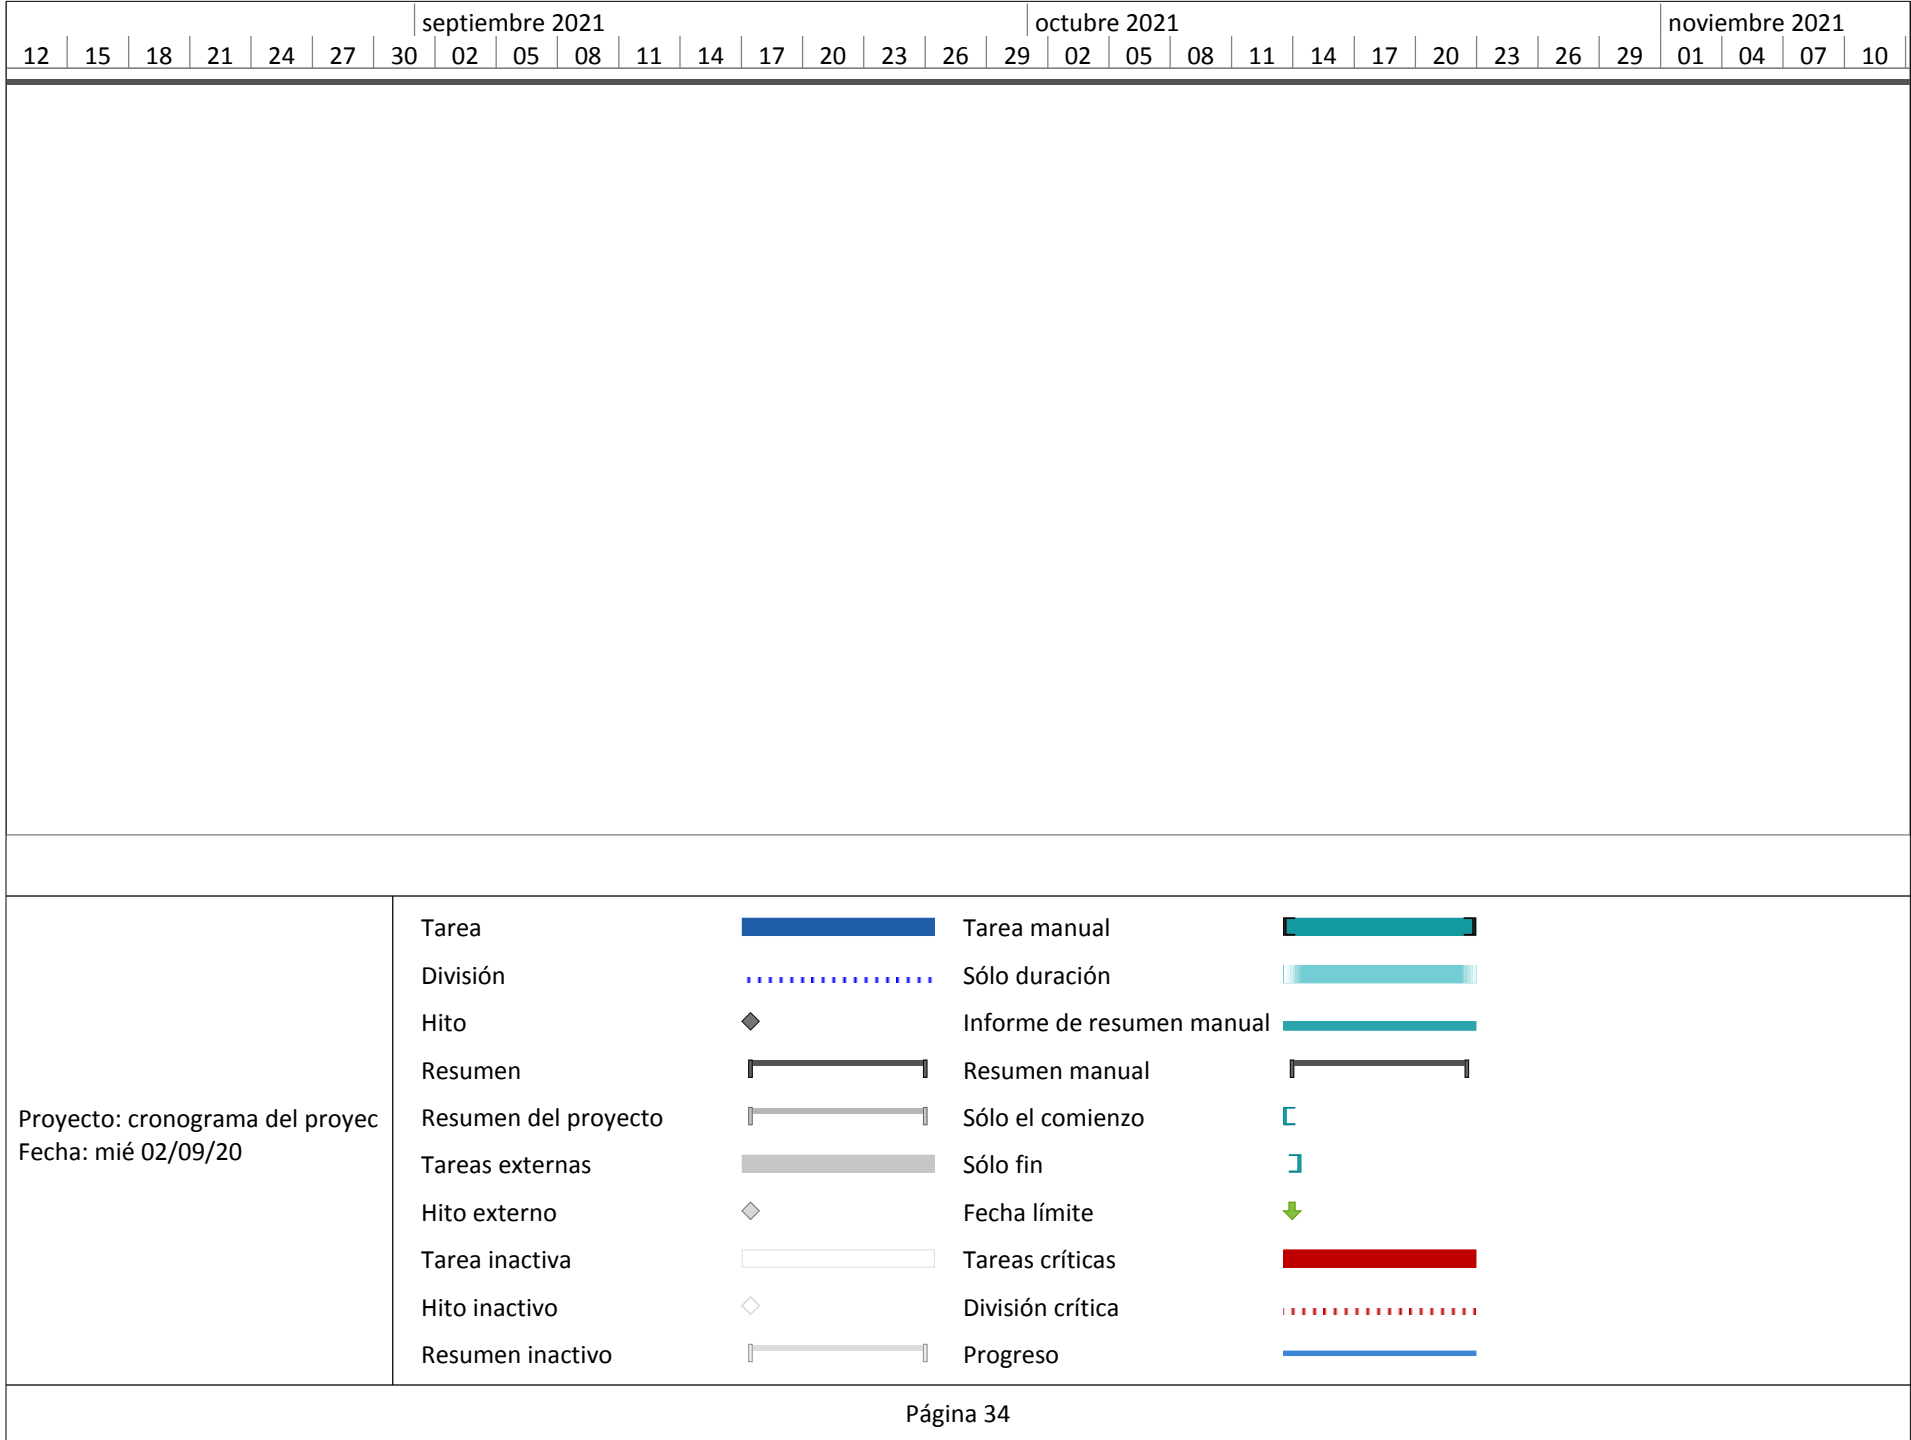


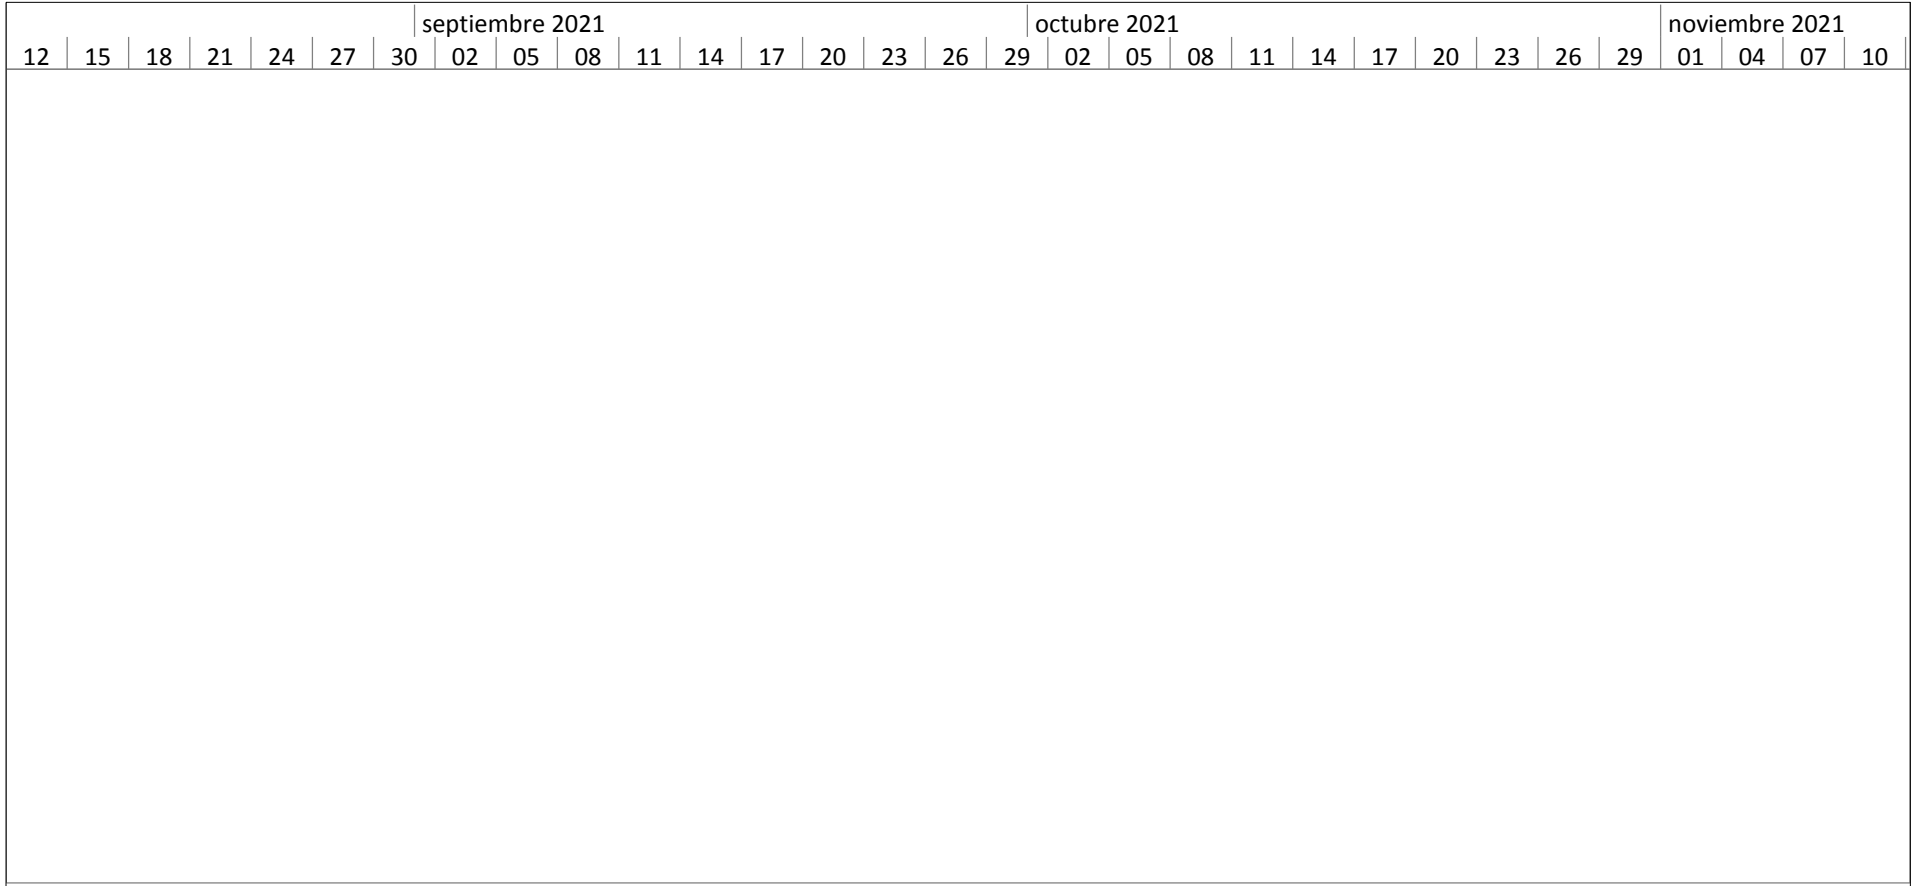


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

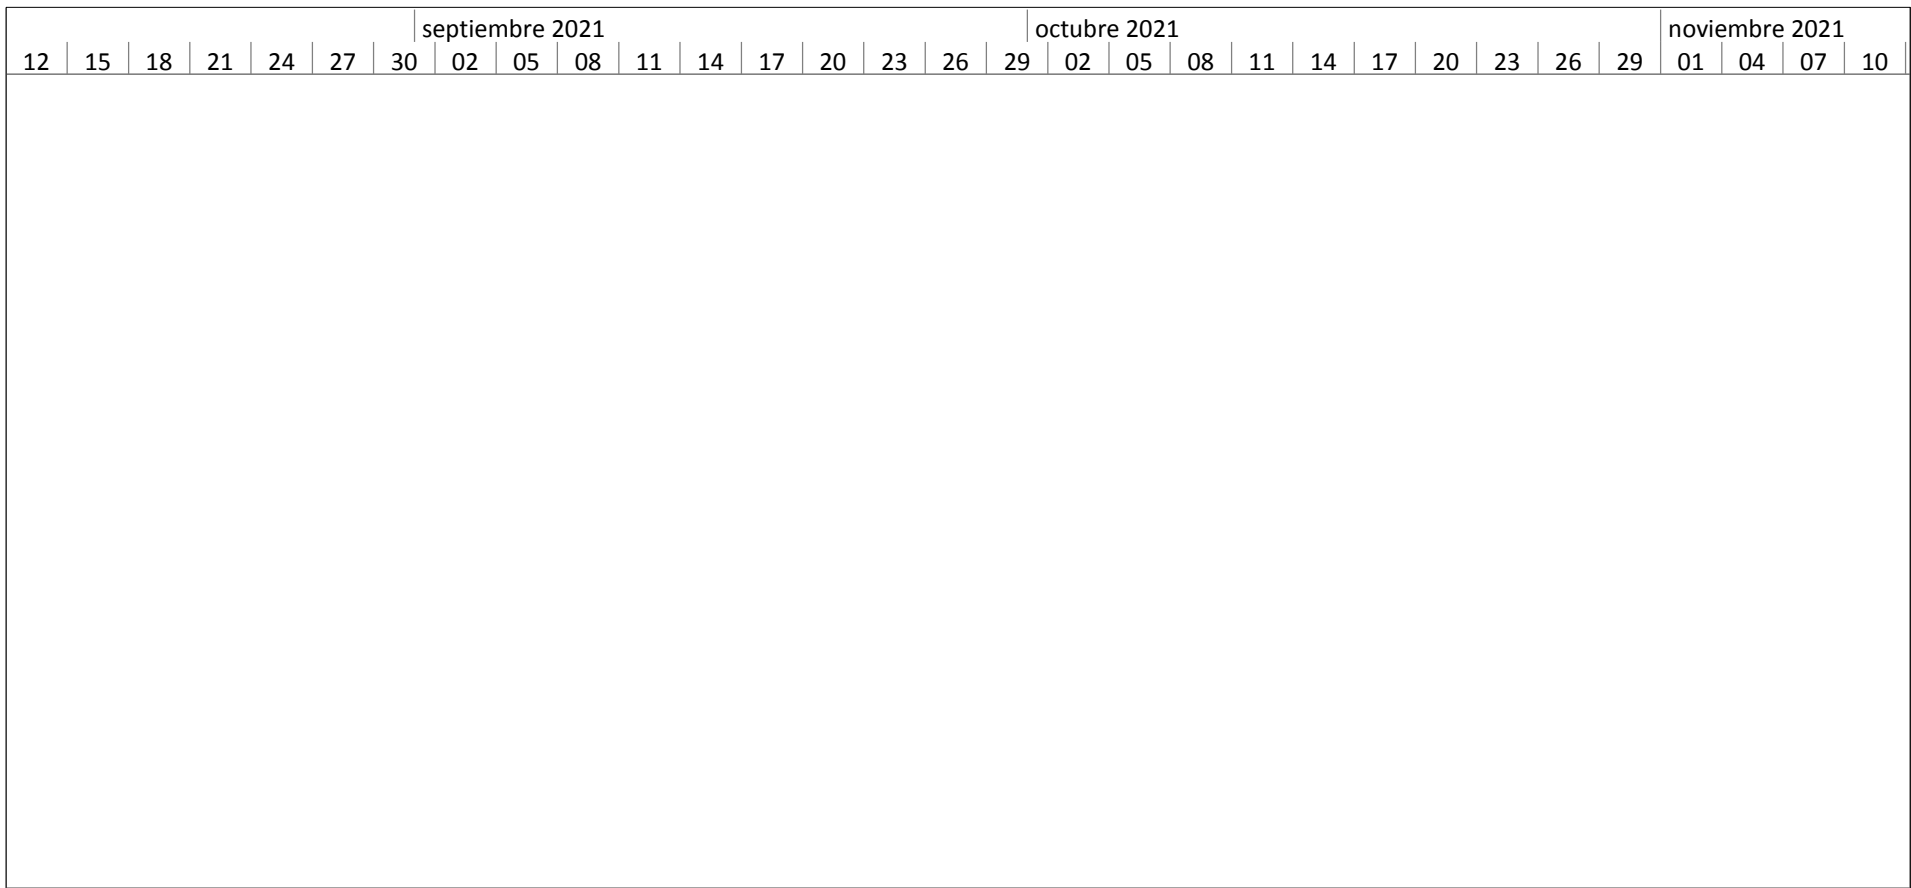


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

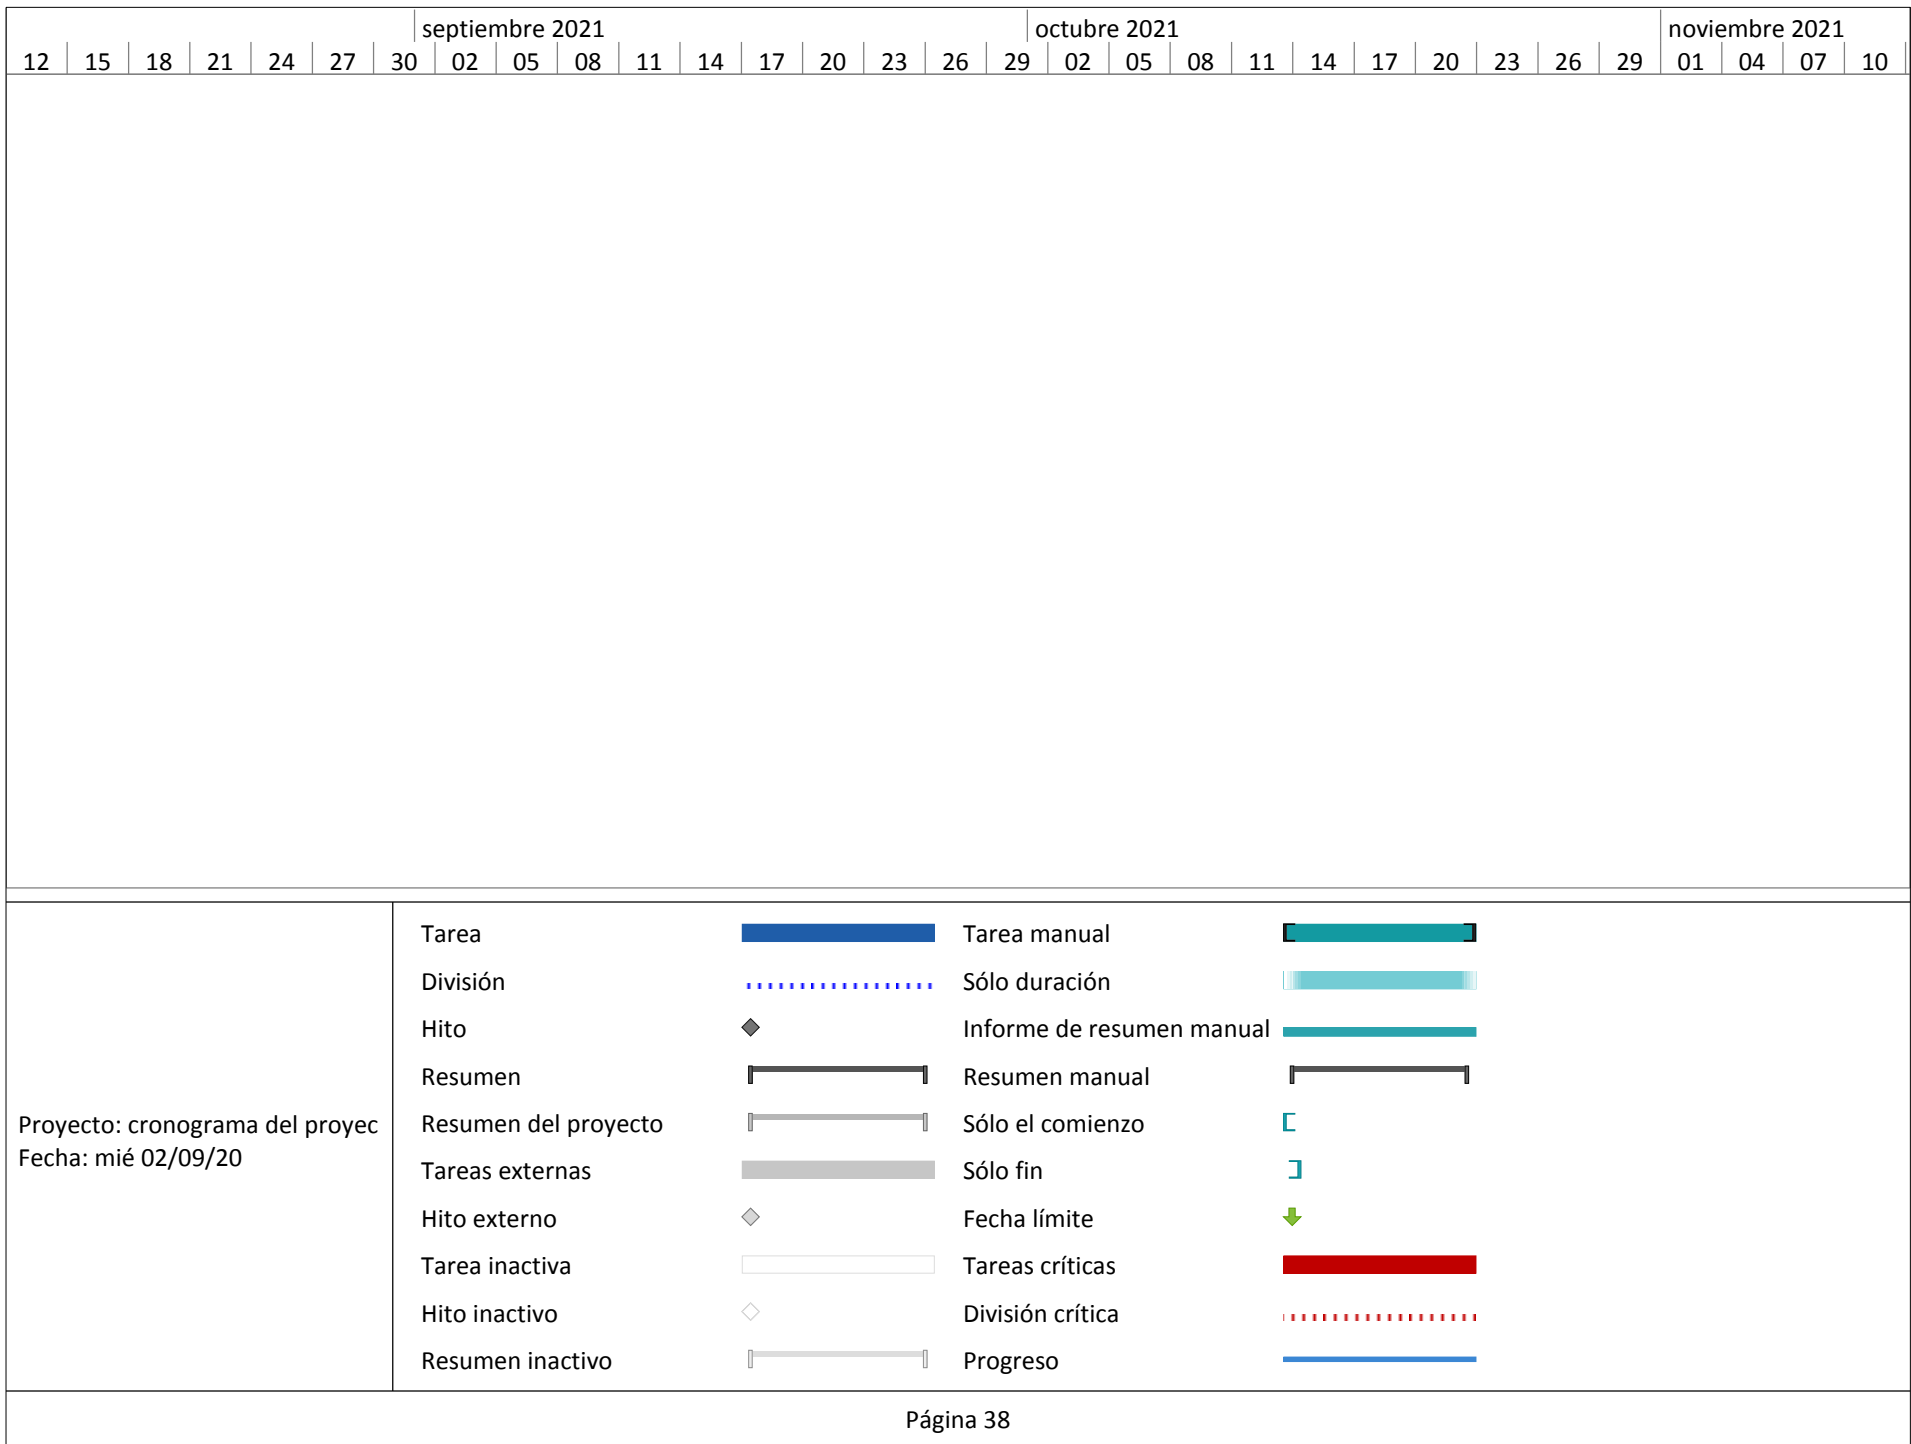

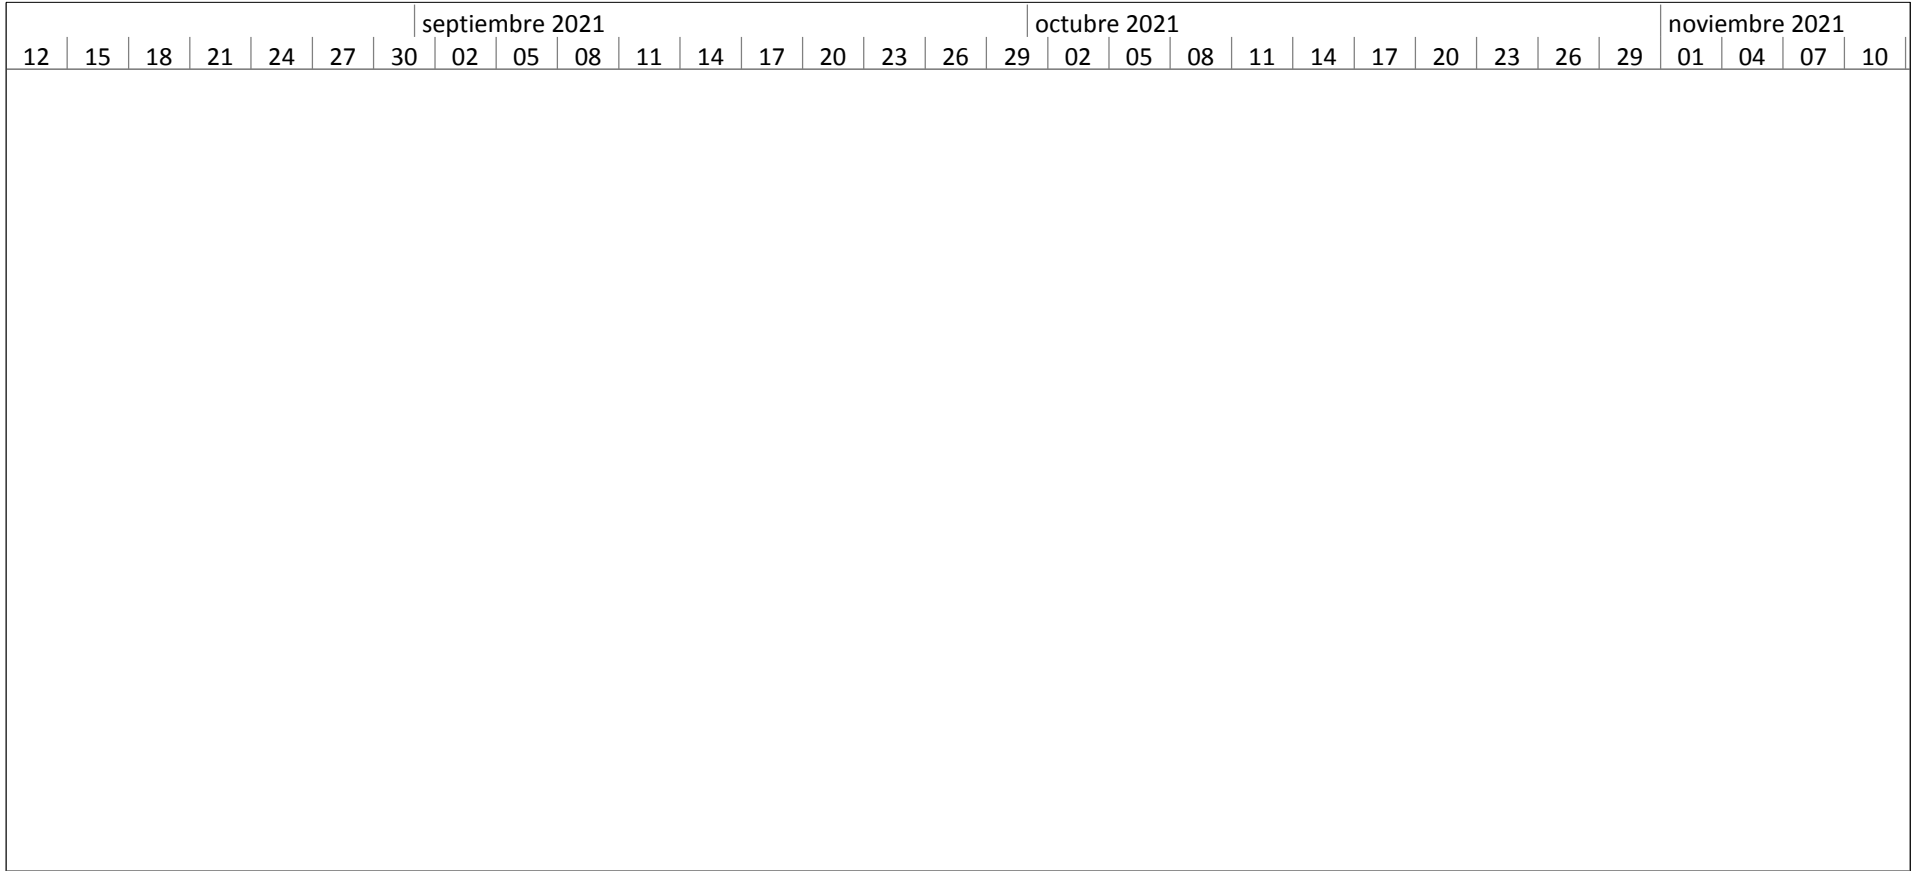


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	


Página 39

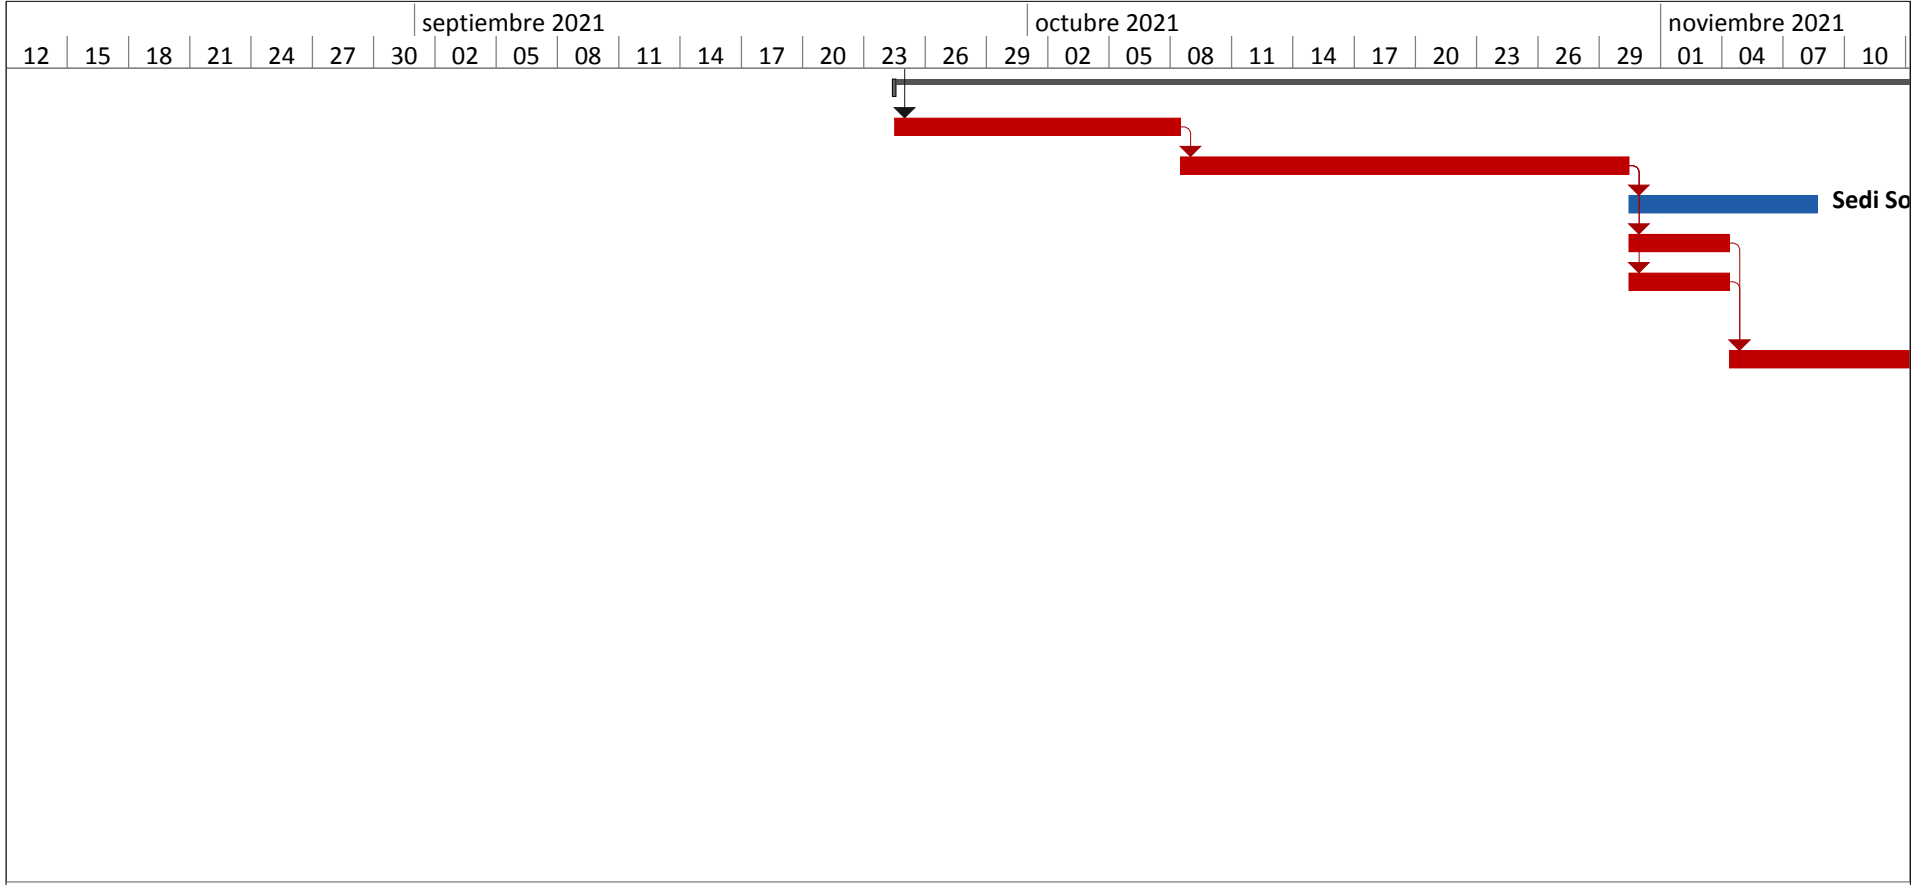


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

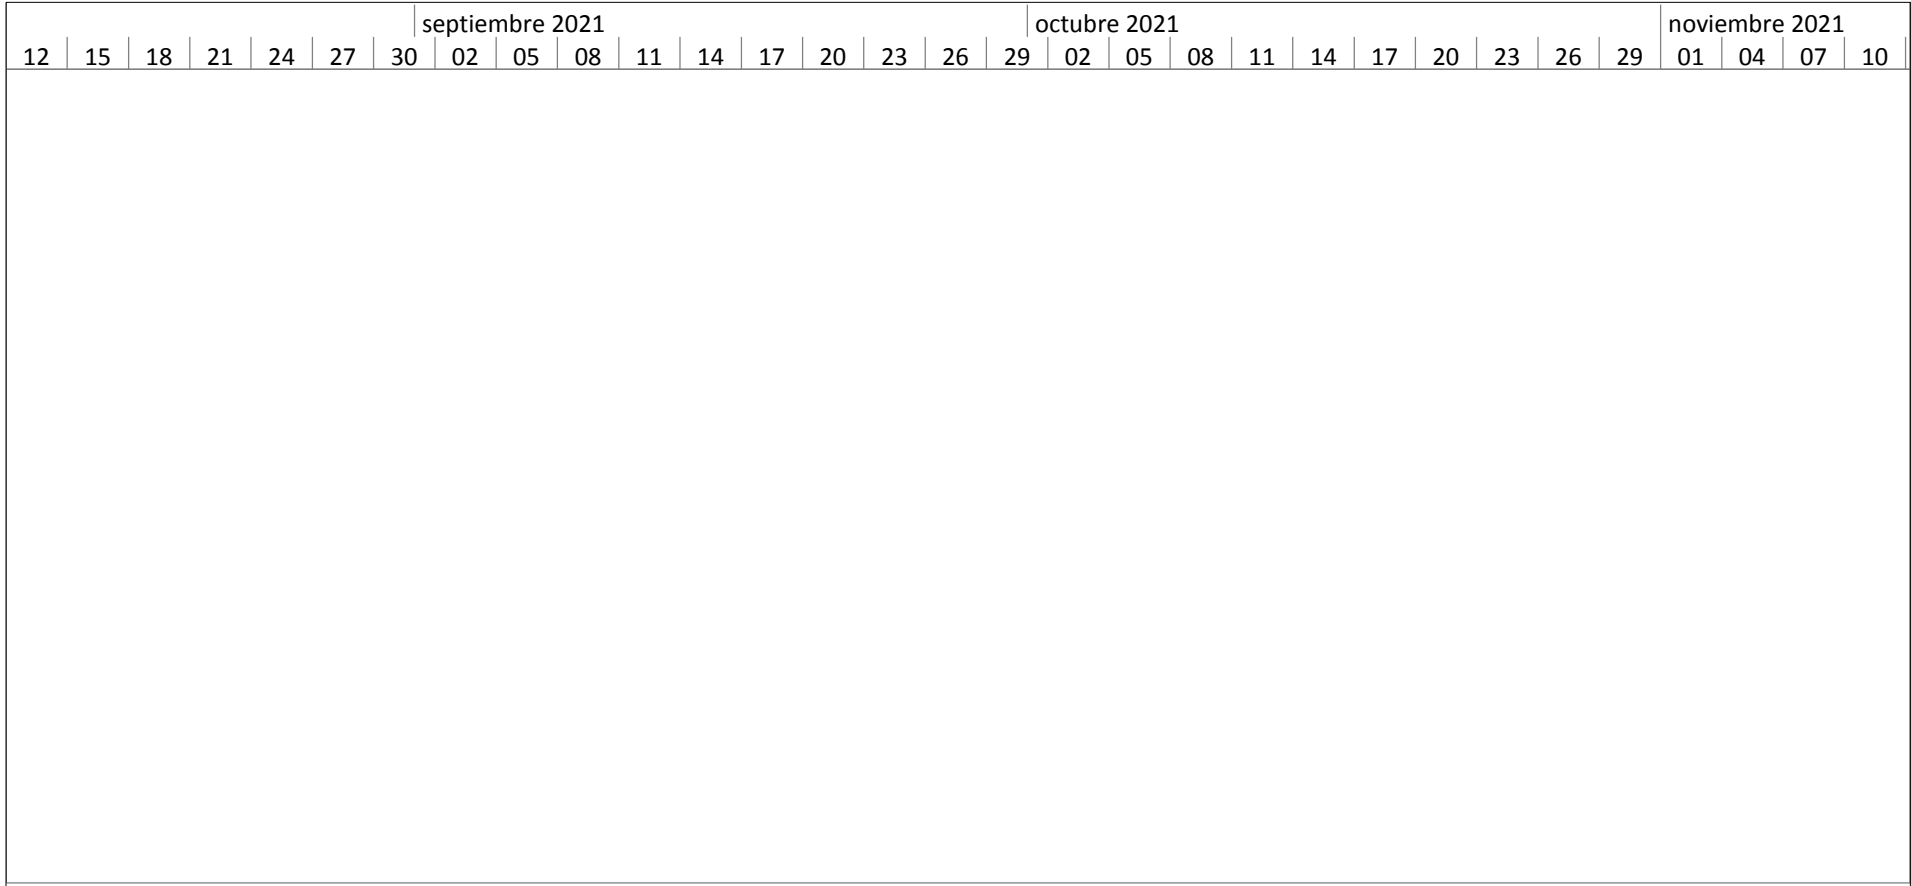


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

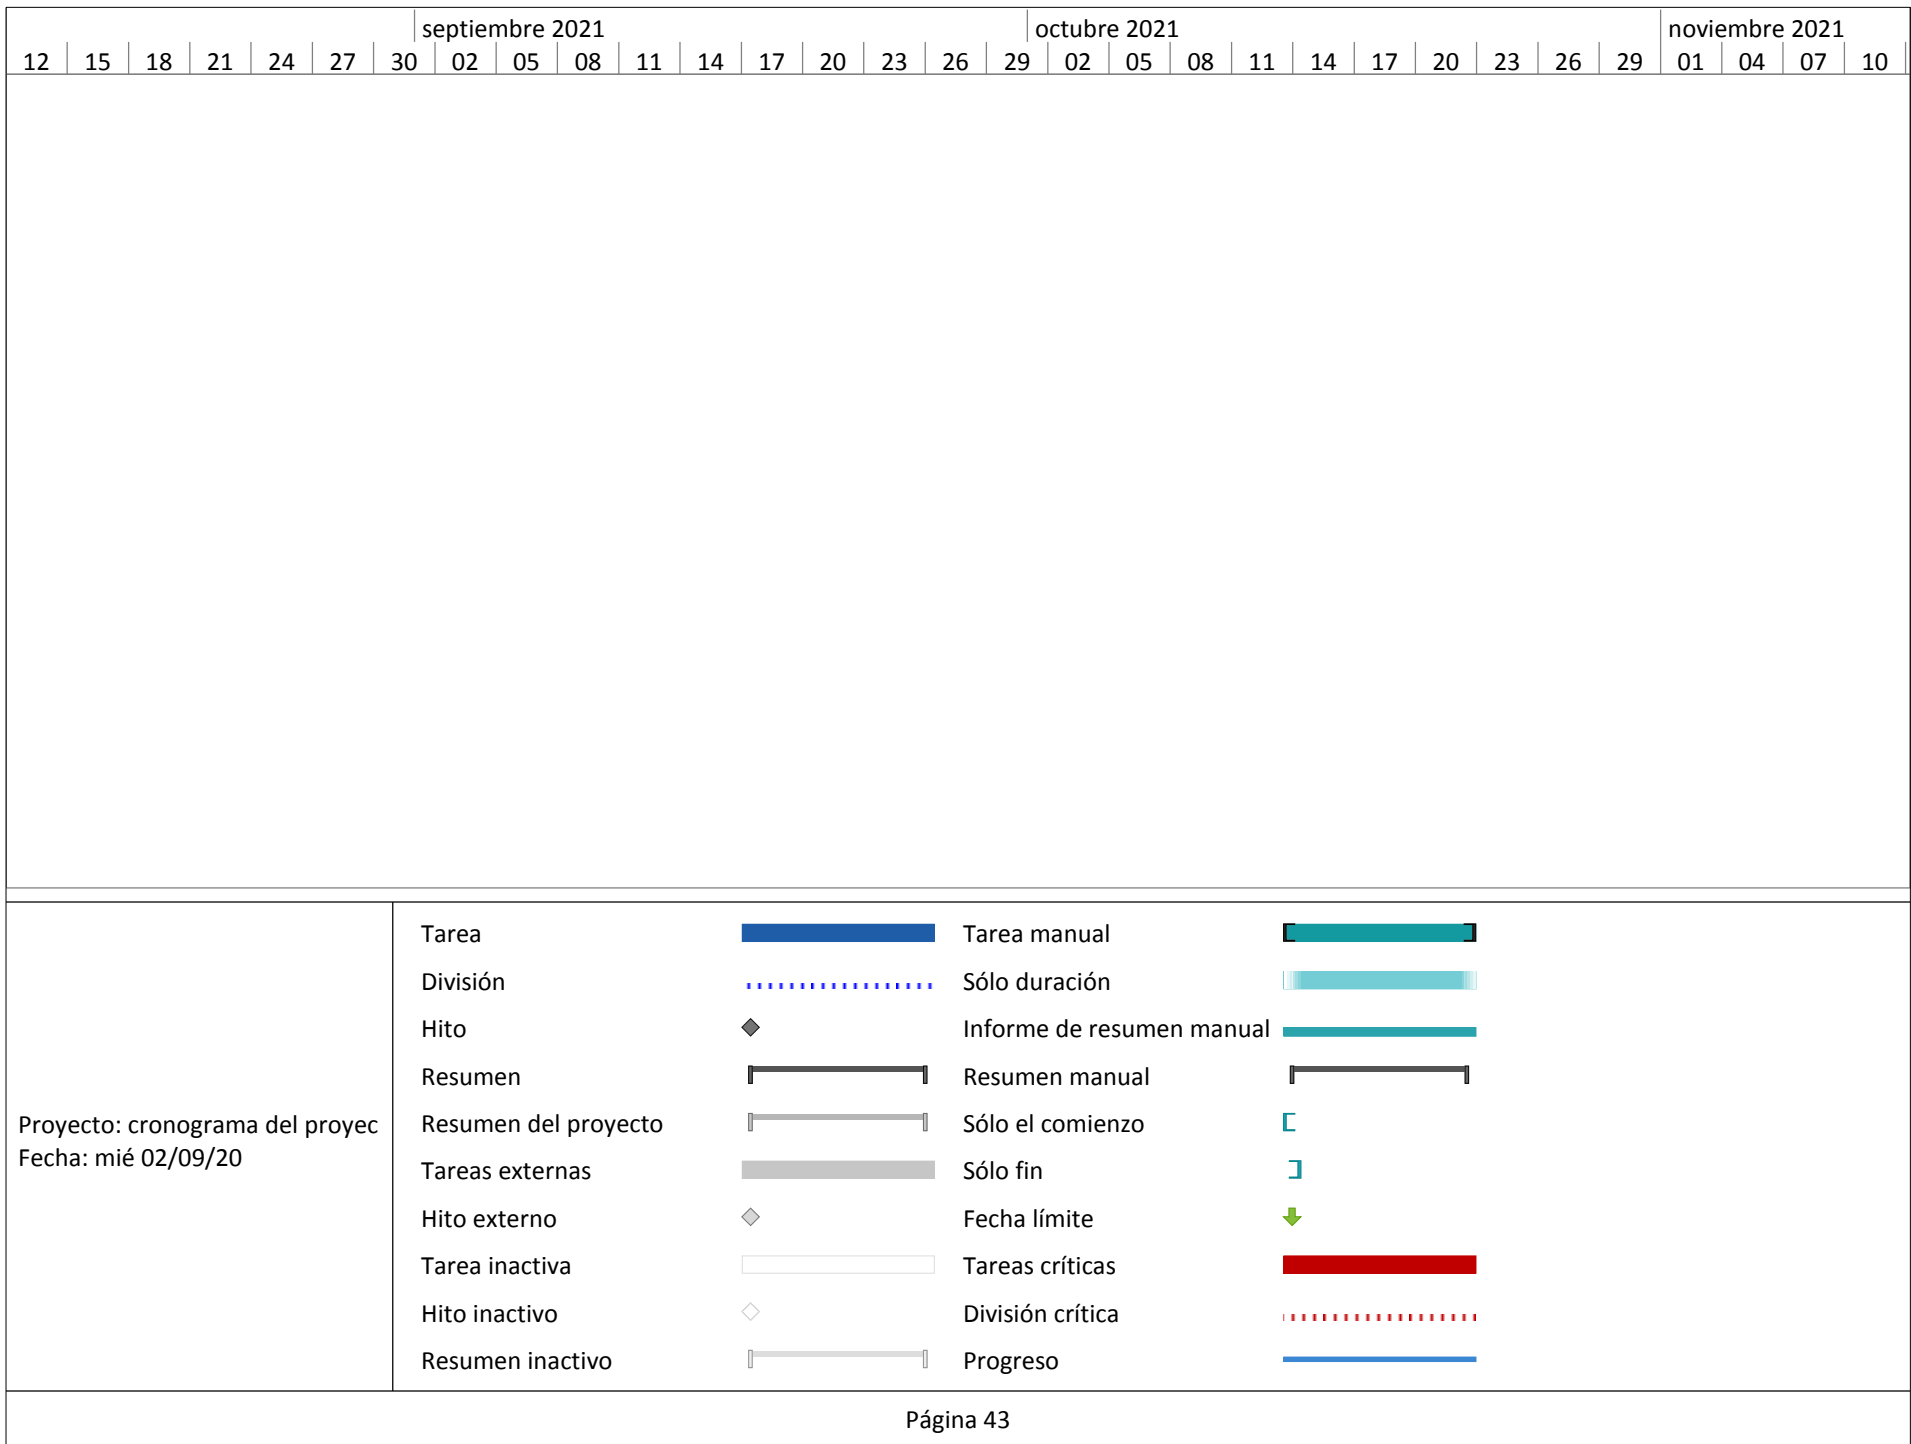

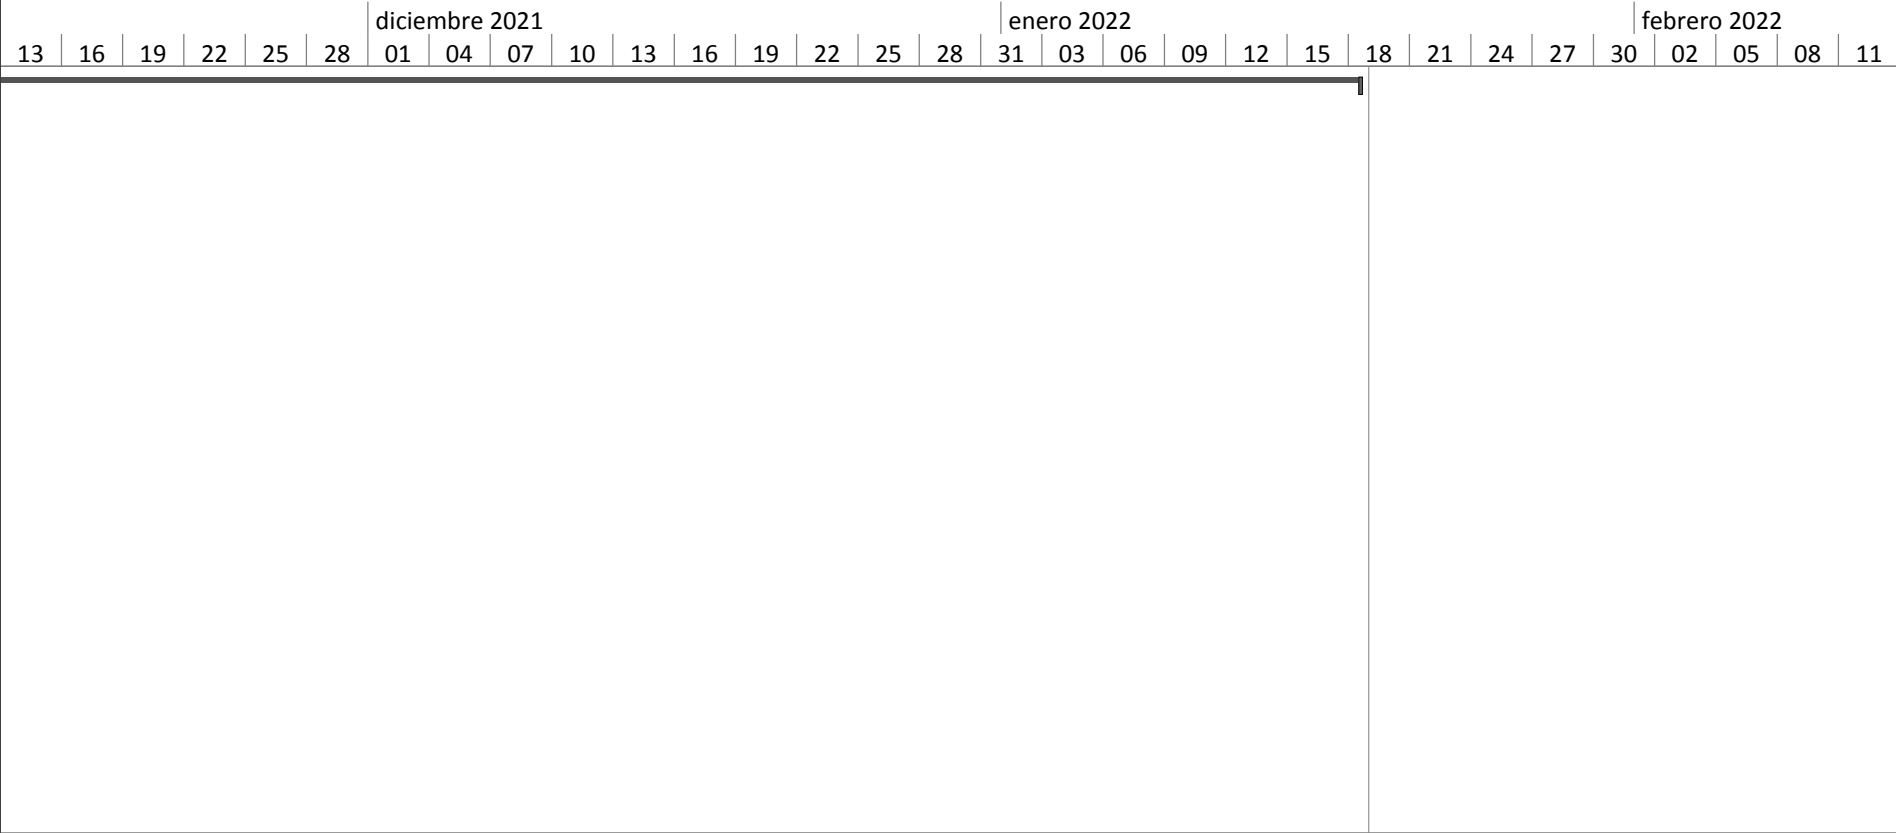


Proyecto: cronograma del proyec
Fecha: mié 02/09/20


Tarea		Tarea manual	
División		Sólo duración	
Hito		Informe de resumen manual	
Resumen		Resumen manual	
Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
Tareas externas		Sólo fin	
Hito externo		Fecha límite	
Tarea inactiva		Tareas críticas	
Hito inactivo		División crítica	
Resumen inactivo		Progreso	

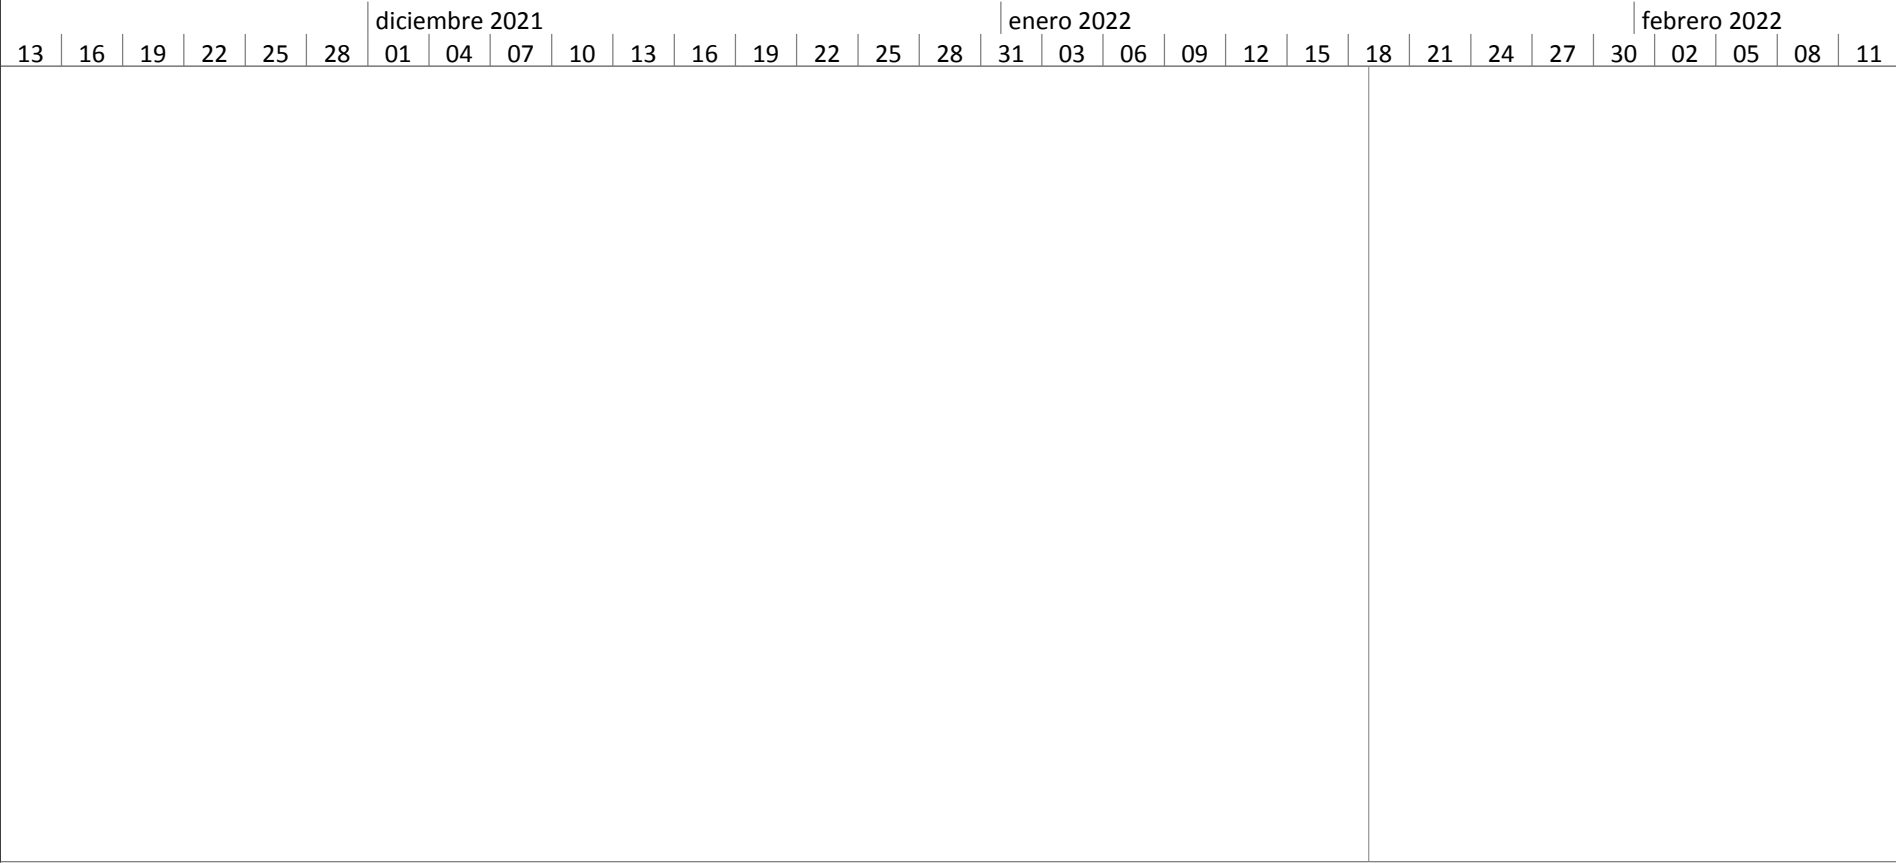


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

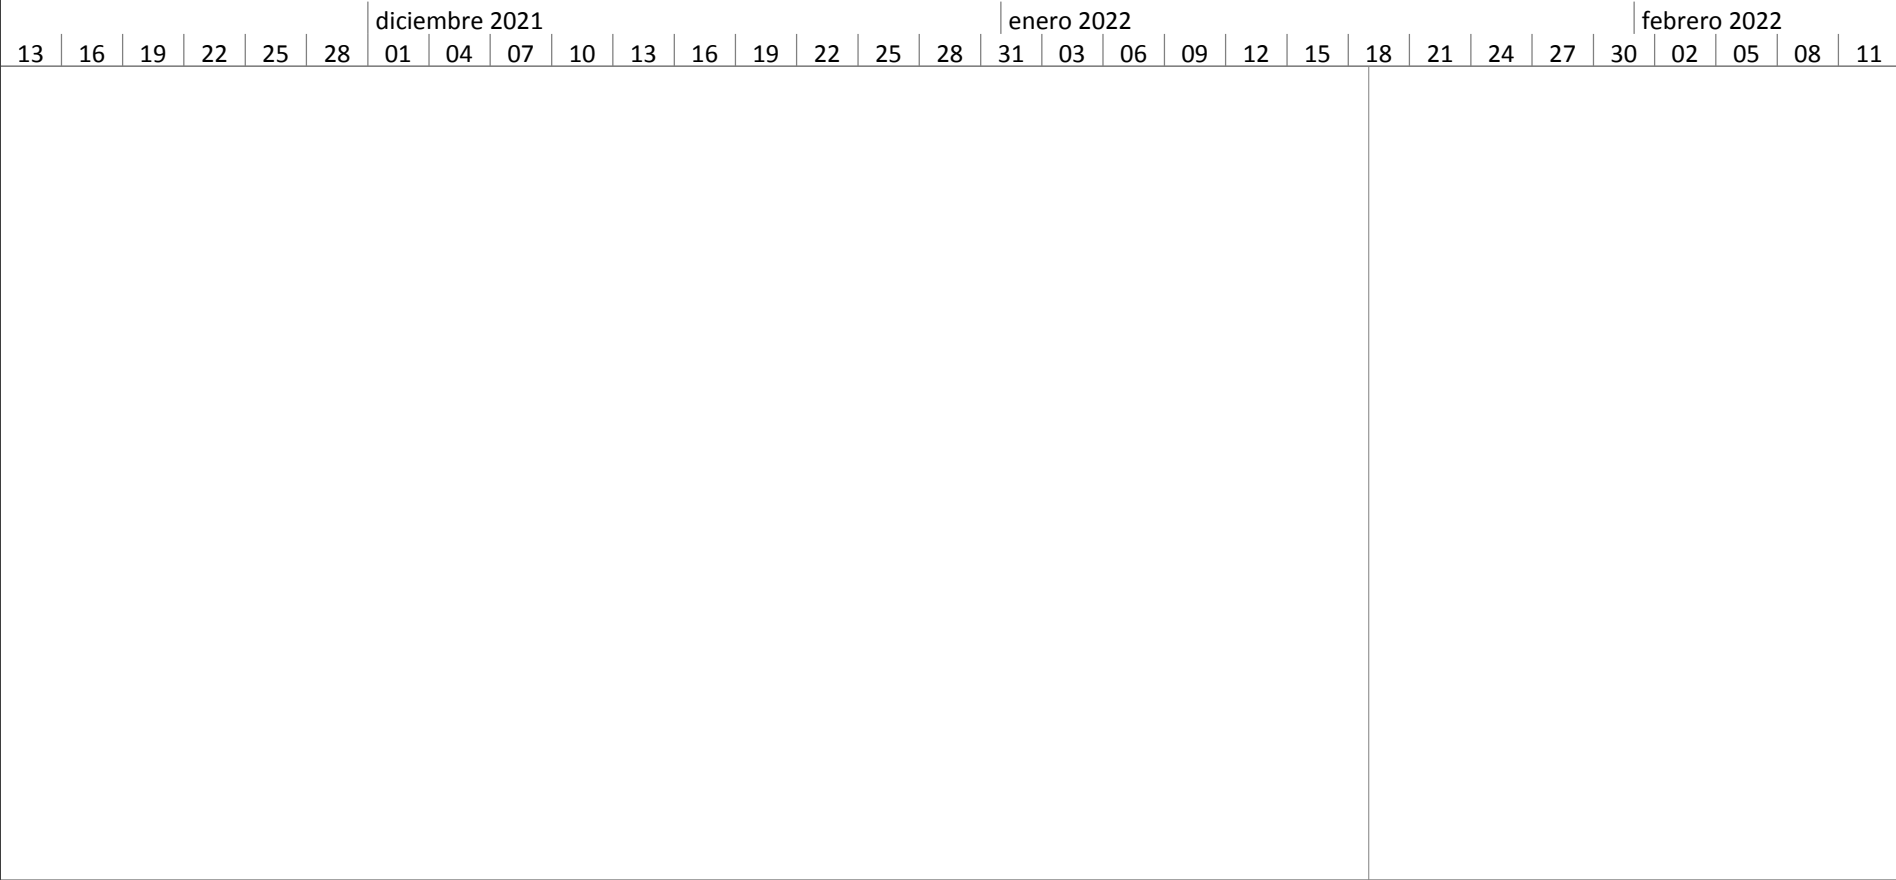


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

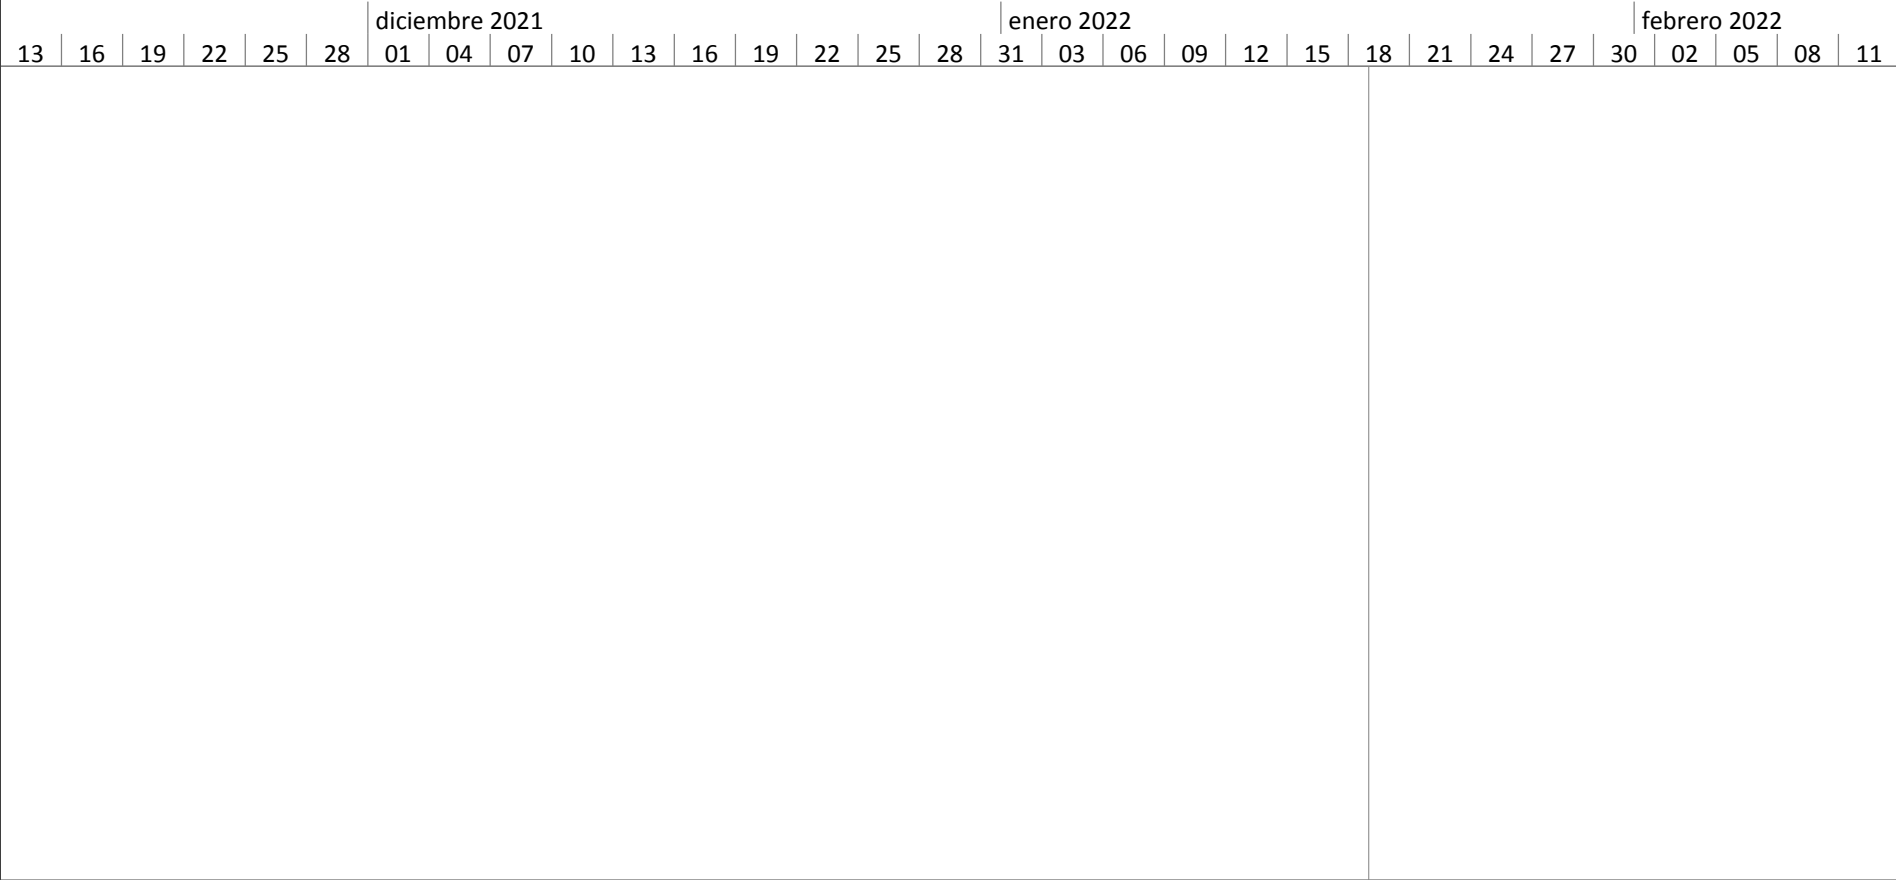


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

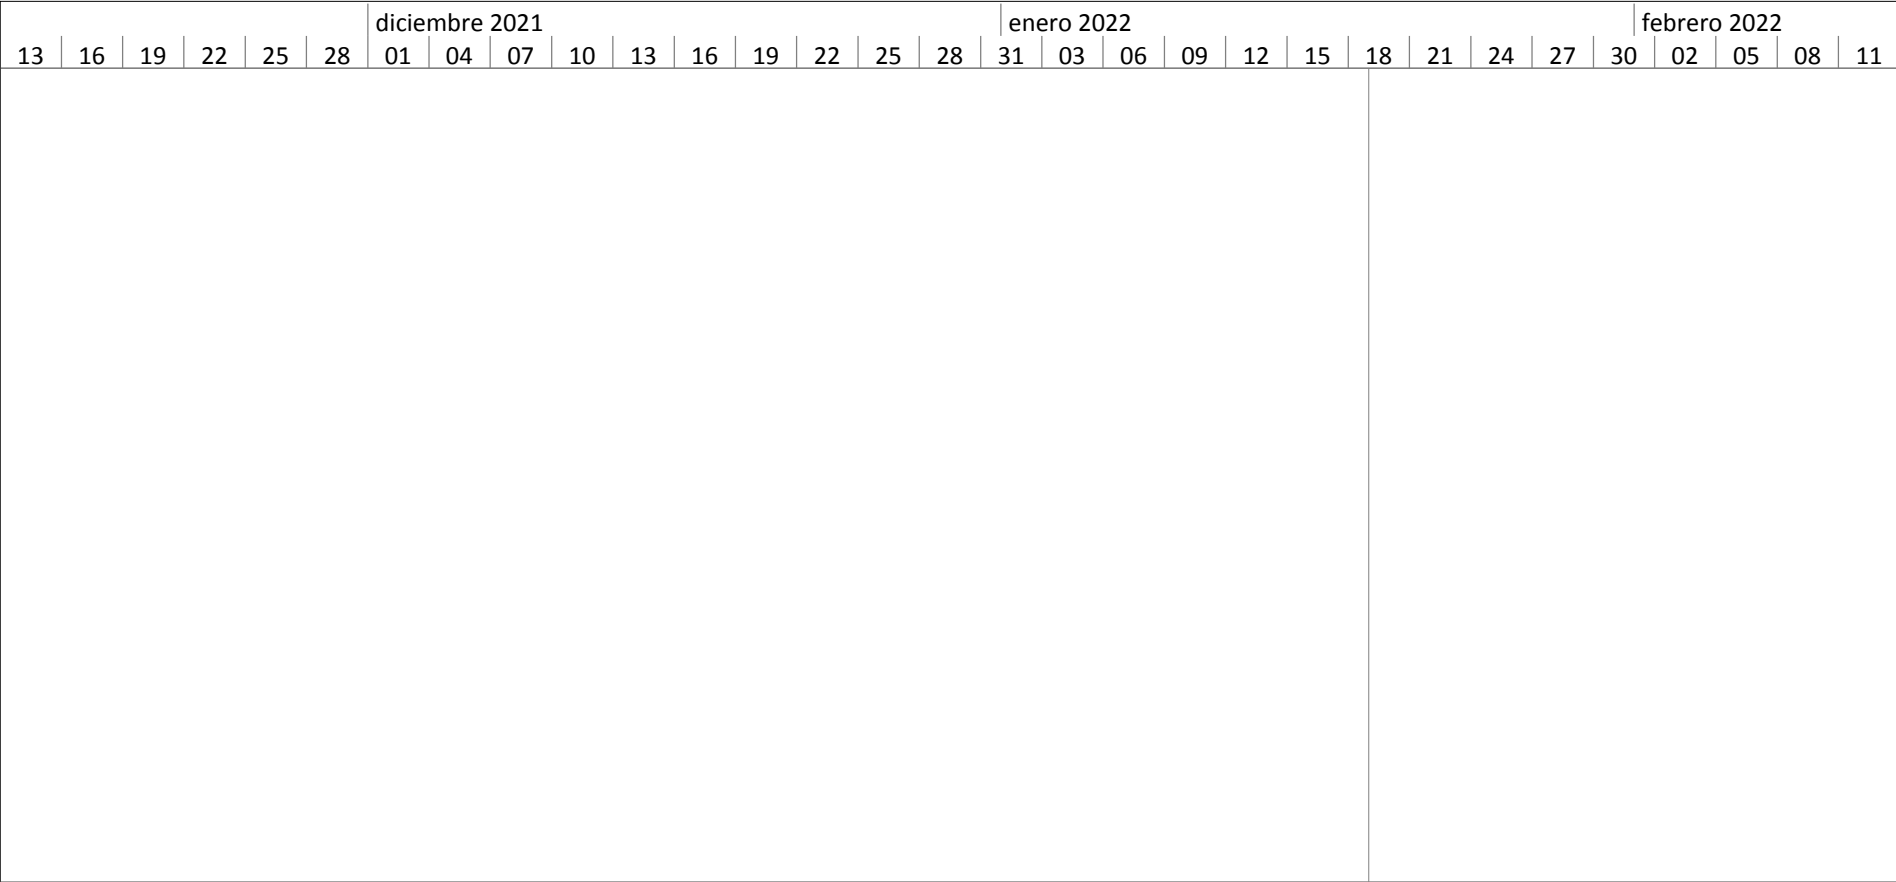


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

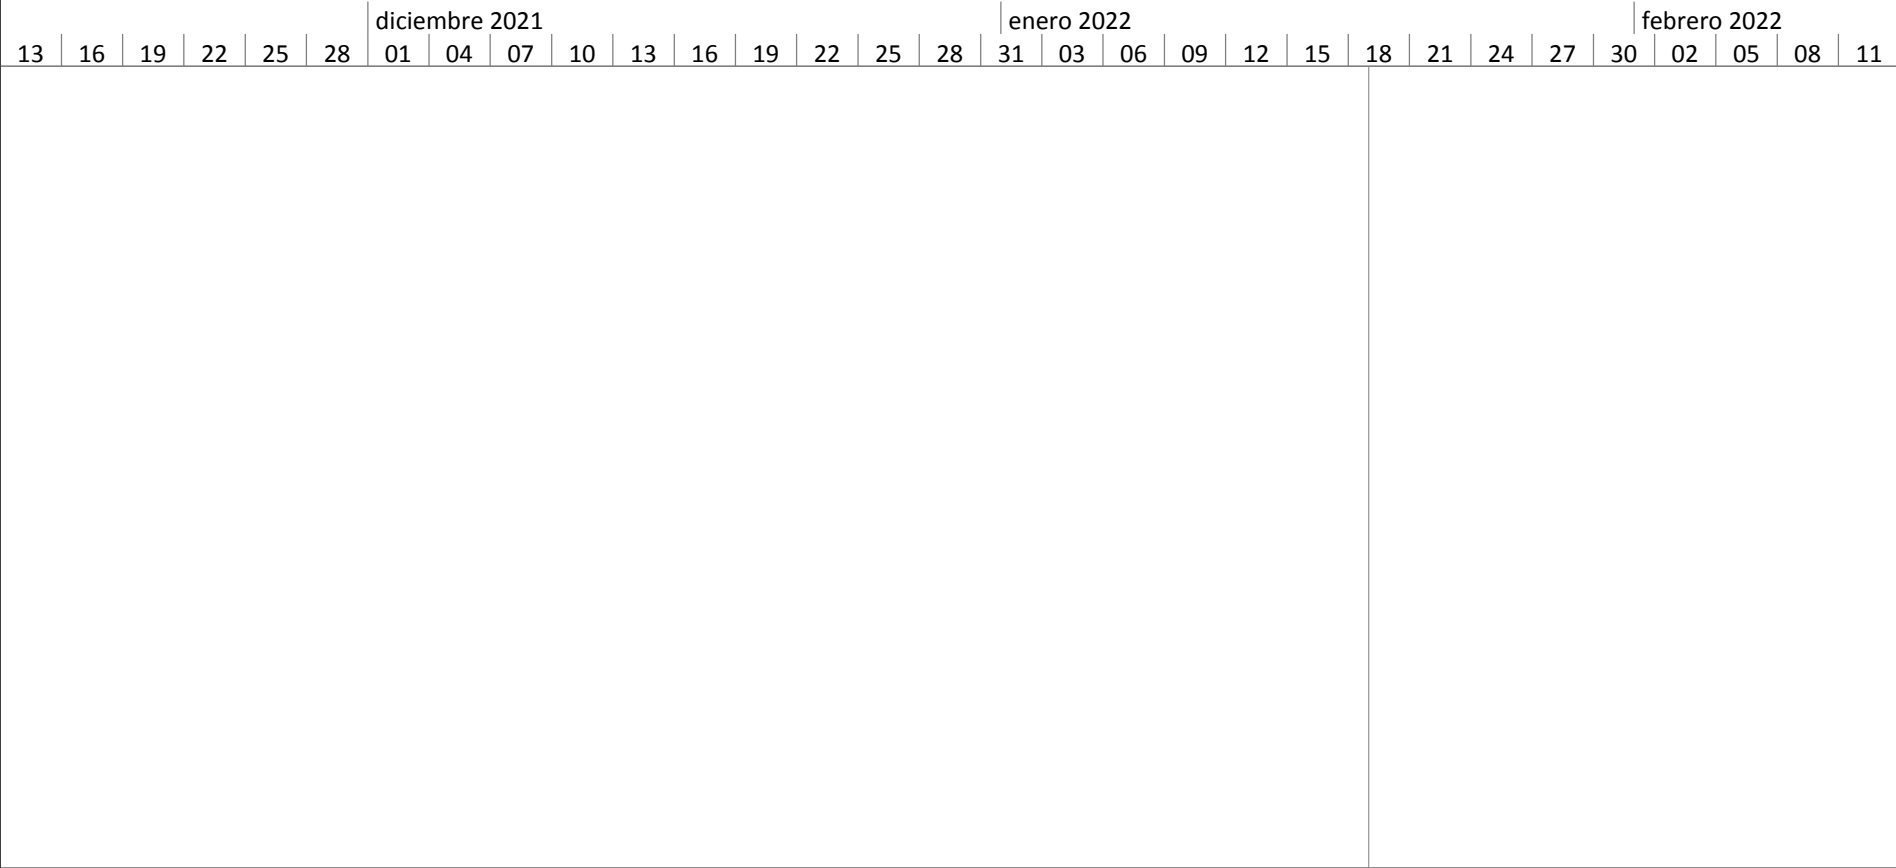


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

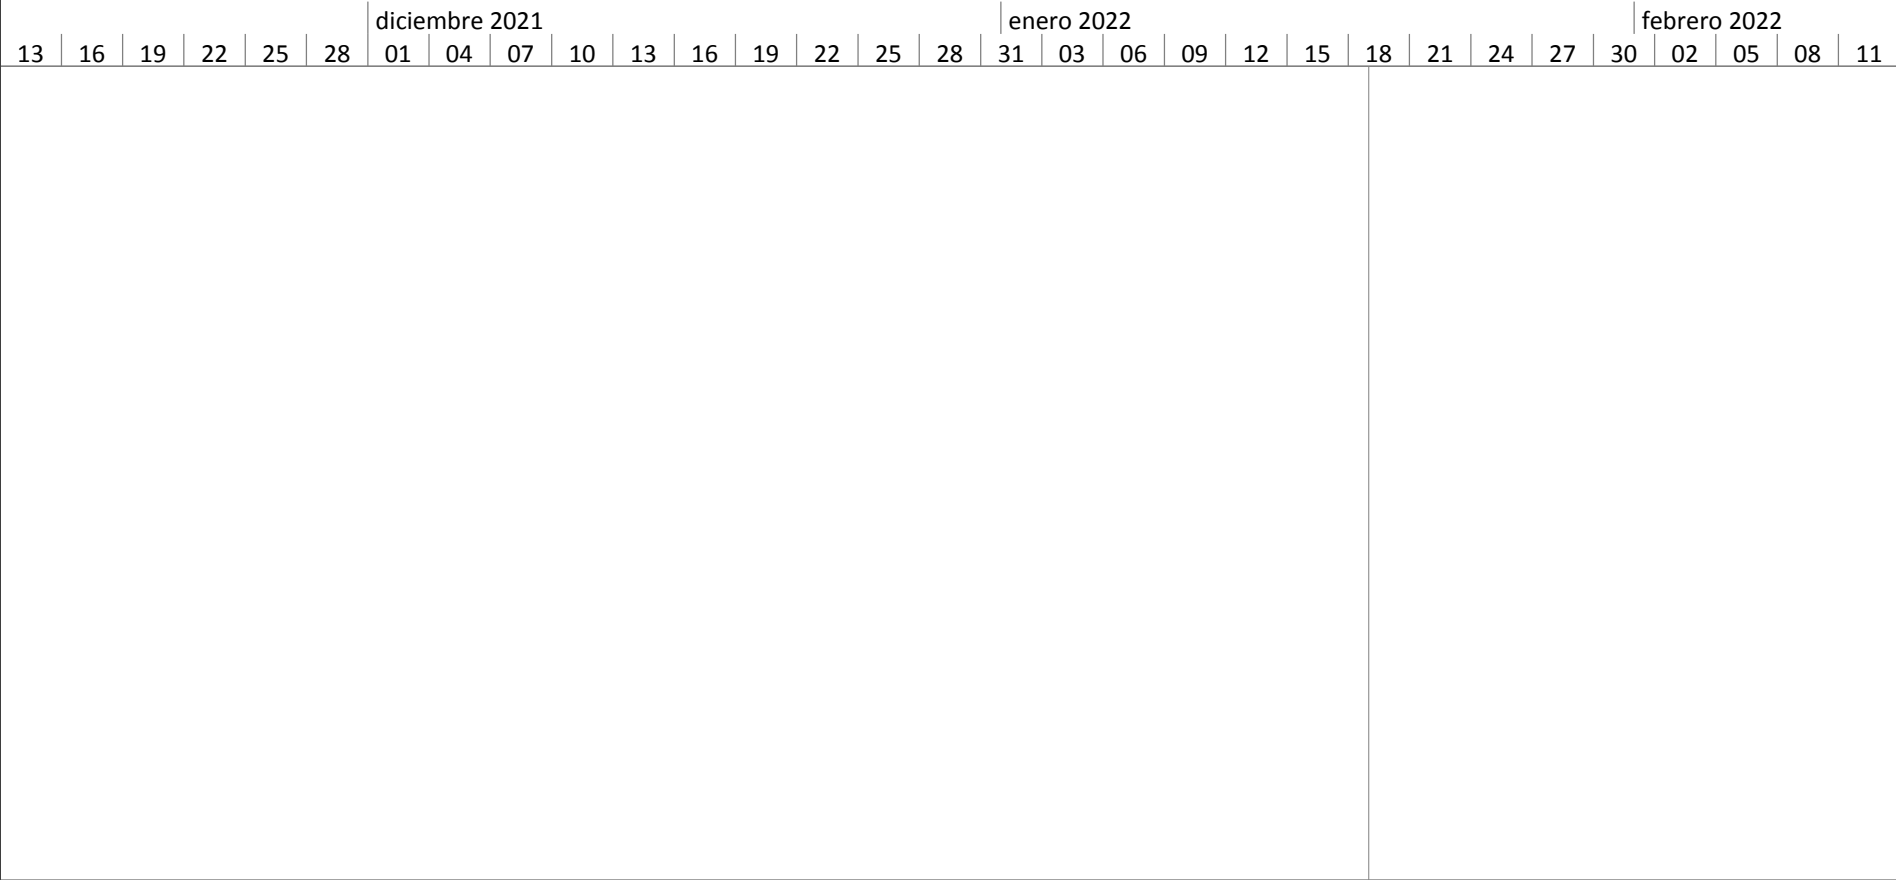


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

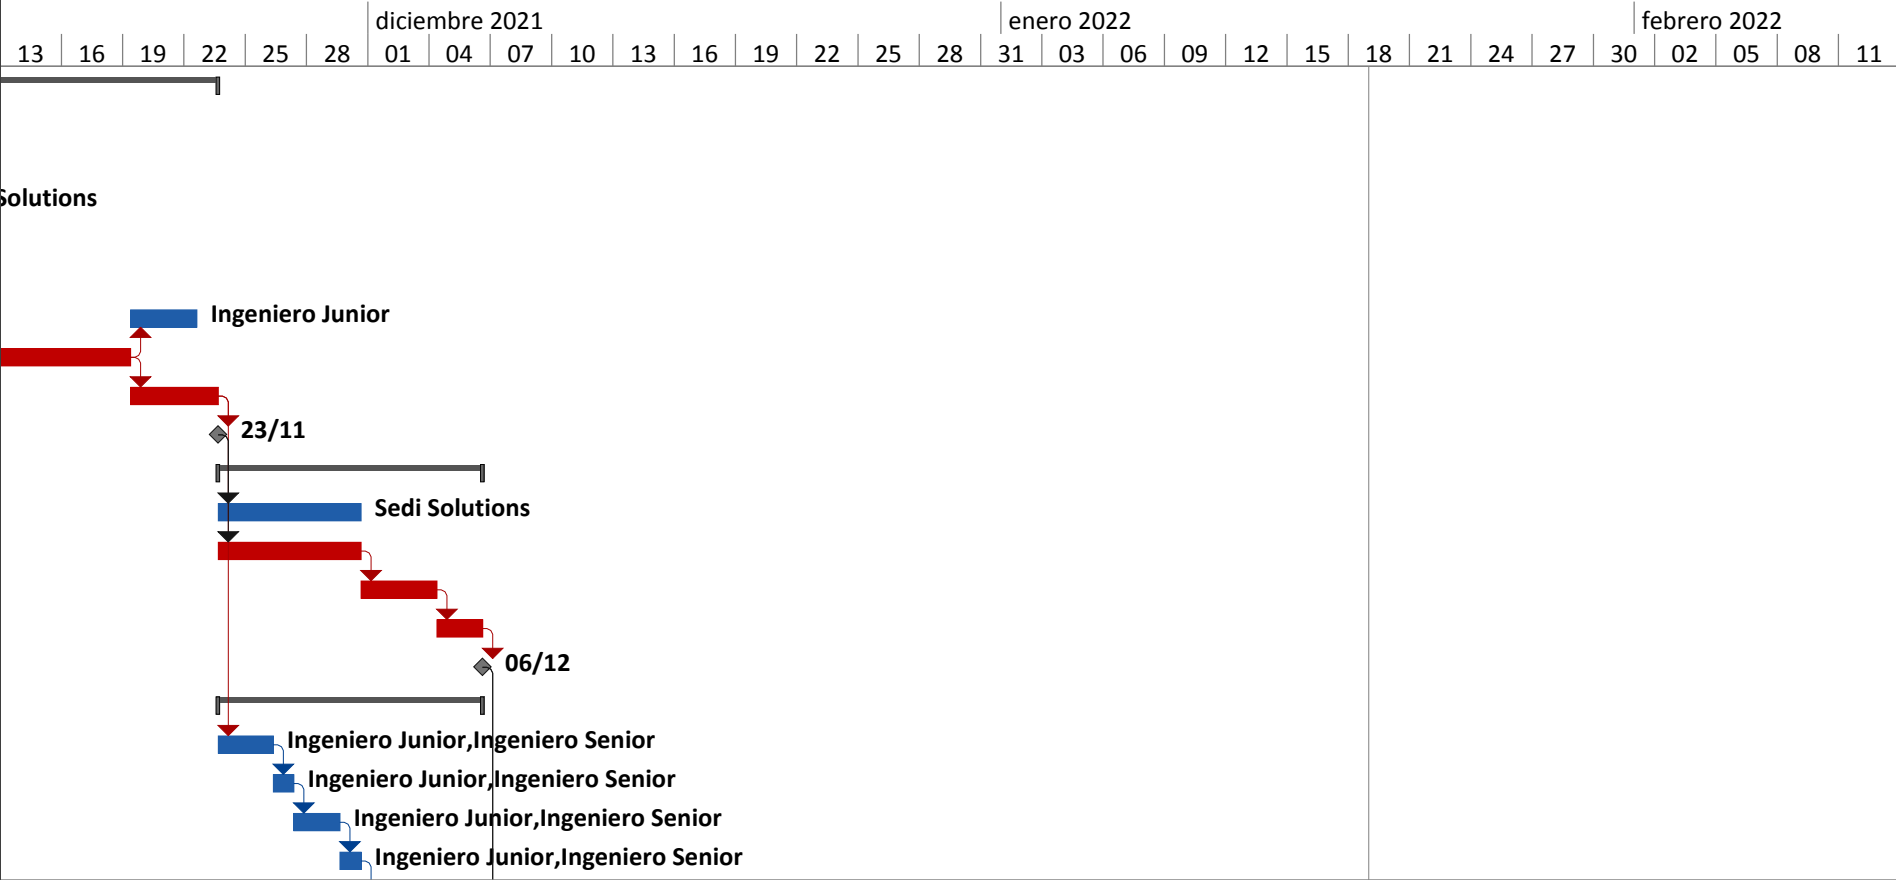


Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

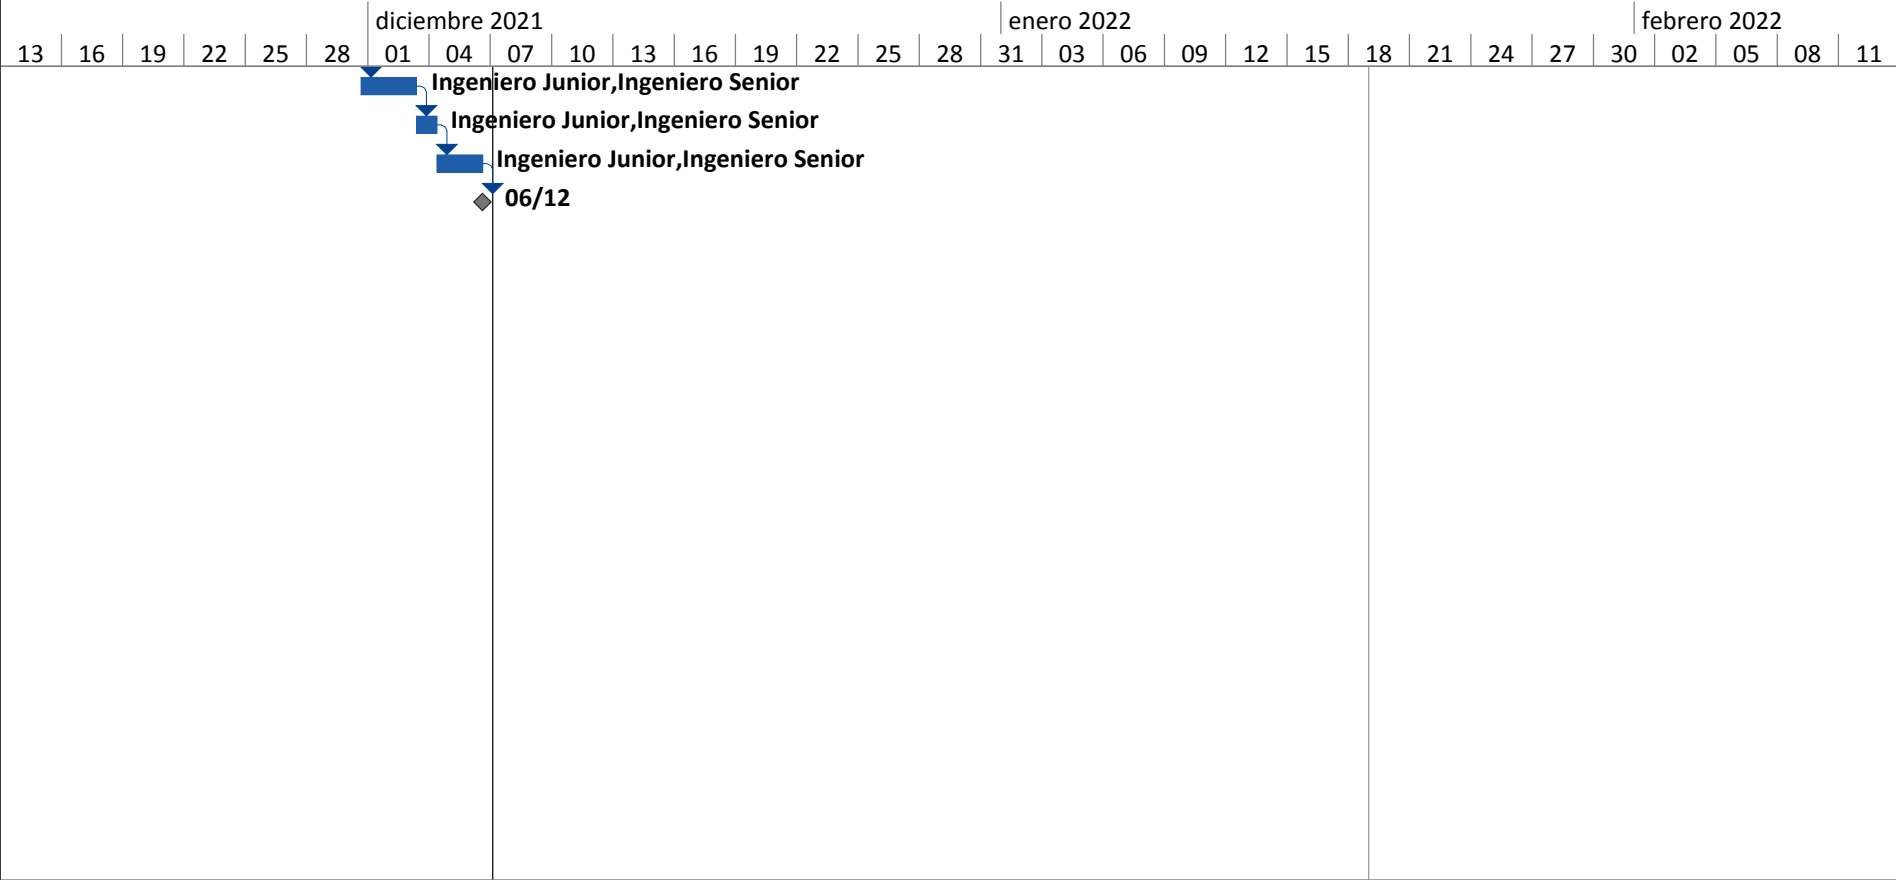

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

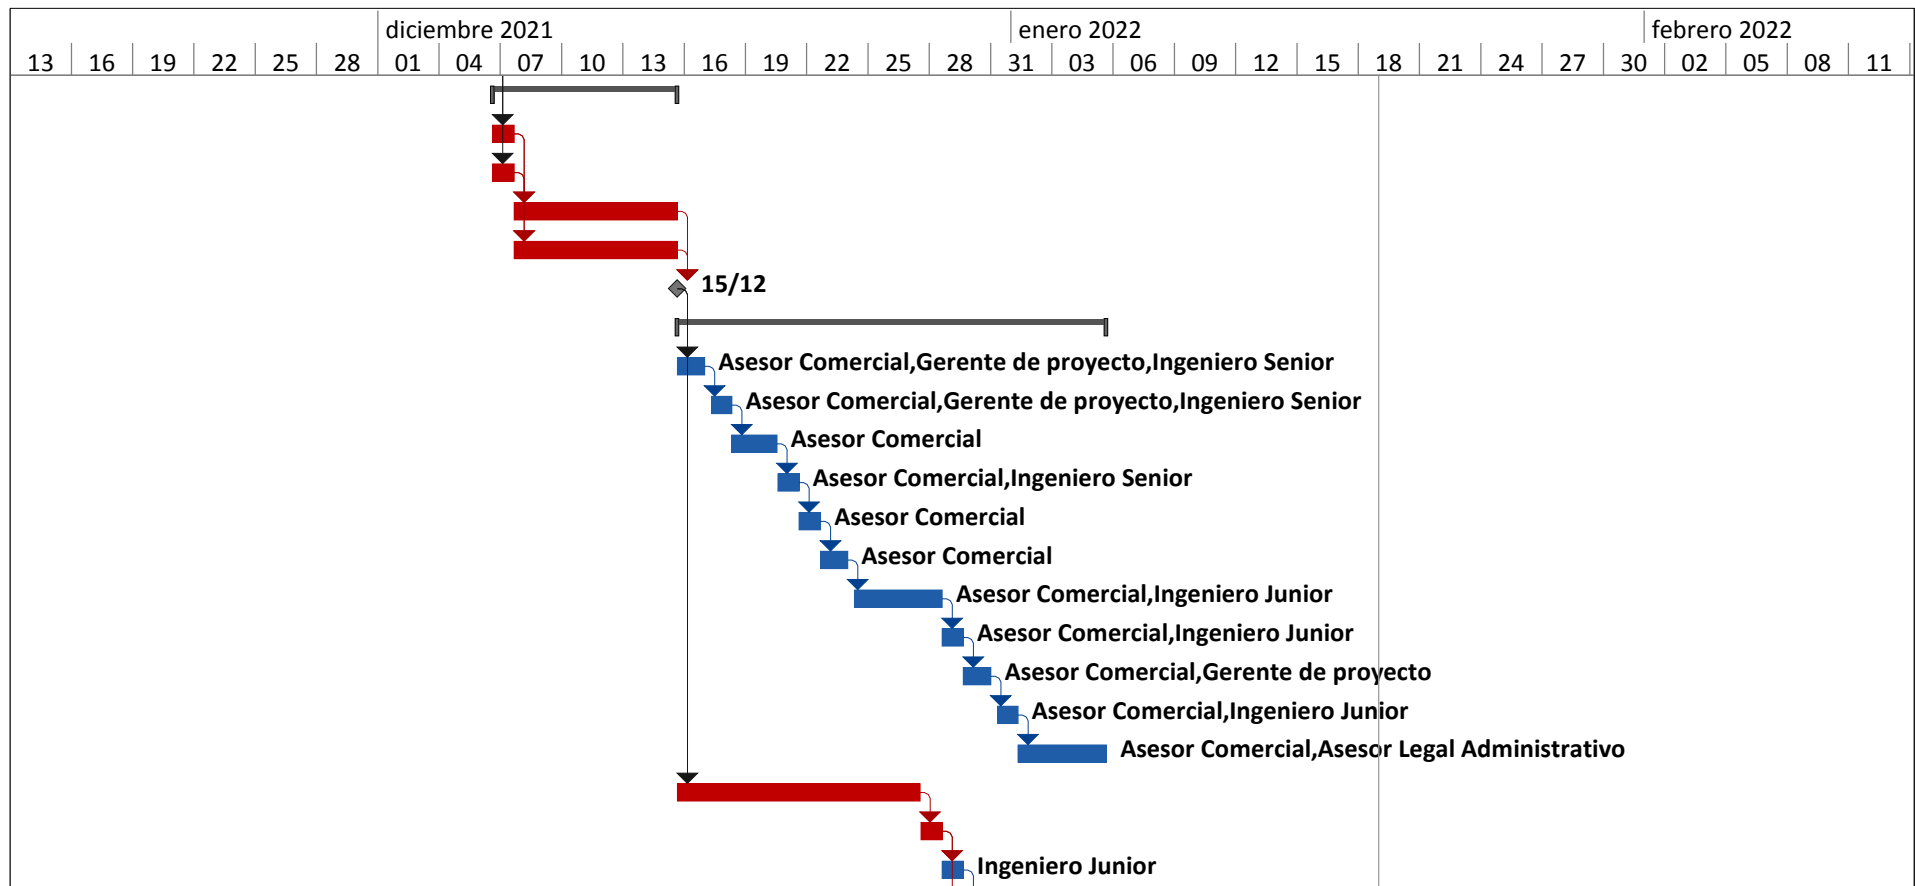

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	

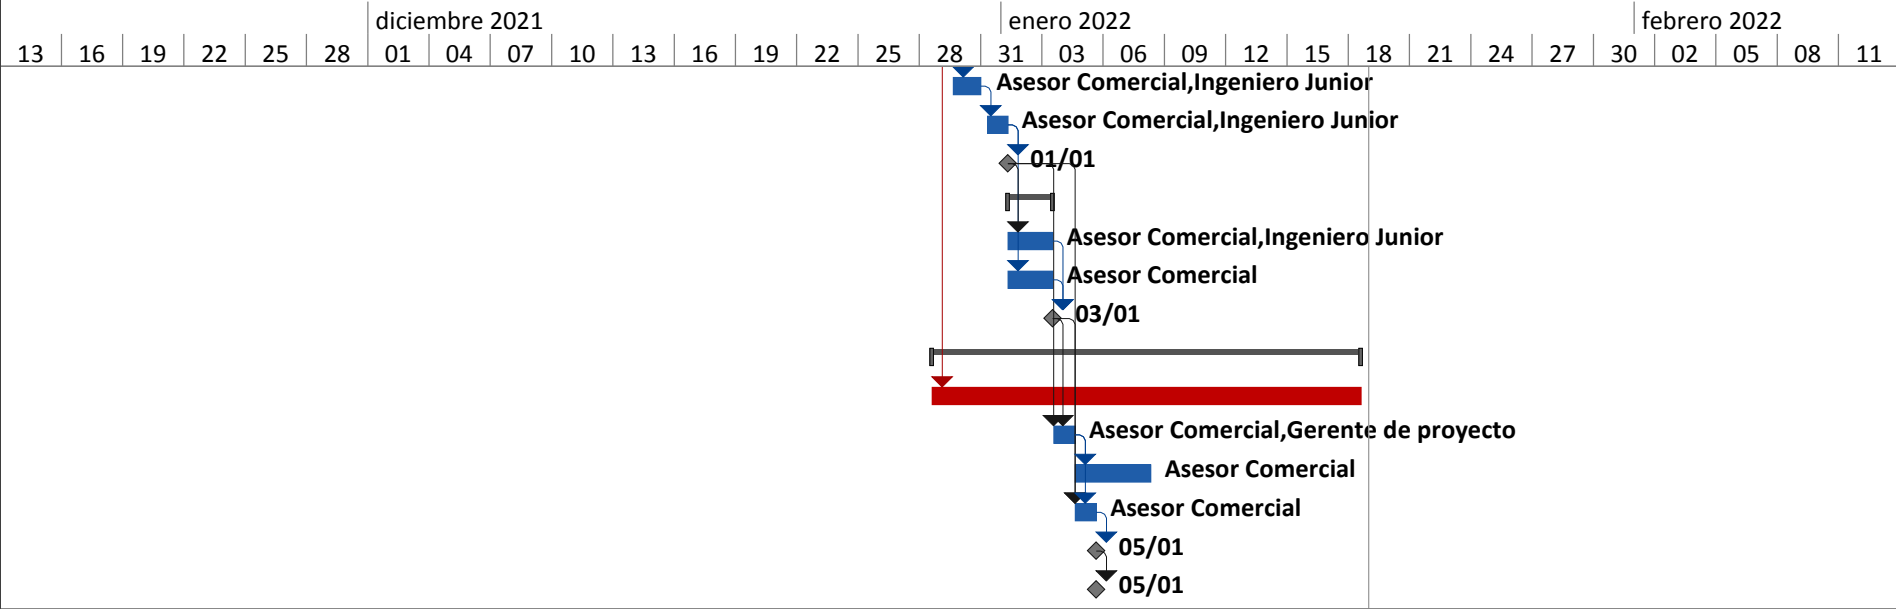

Proyecto: cronograma del proyec Fecha: mié 02/09/20	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito		Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	
	Tareas externas		Sólo fin	
	Hito externo		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Tareas críticas	
	Hito inactivo		División crítica	
	Resumen inactivo		Progreso	
